

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

Contrato  
 Interadministrativo  
 219143 / ANSV 104-2019  
 Pequeñas Grandes Obras



Informe  
 mensual  
 No 15  
 Mayo 2021  
 [Versión 1]

Fecha de generación: 02/07/2021  
 Número de folios: 139

  
**Zoranyi Sierra Díaz**  
 Gerente de Contrato Interadministrativo

  
**Juan Carlos Pinilla Saigado**  
 Supervisor del Contrato Interadministrativo

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla de Contenido:**

1.	Introducción .....	4
2.	Informe administrativo, presupuestal y financiero .....	5
2.1.	Información general contrato.....	5
2.2.	Actas y ayudas de memoria .....	5
2.3.	Correspondencia generada en el marco del contrato .....	6
2.4.	Garantías del contrato .....	7
2.5.	Aspectos presupuestales y financieros .....	7
2.5.1.	Cuota de Gerencia Integral del Proyecto .....	7
2.5.2.	Contratación derivada .....	10
2.5.3.	Informes de ejecución financiera.....	19
3.	Informe técnico .....	21
3.1.	Programación del proyecto .....	21
3.1.1.	Comentarios generales sobre el avance .....	23
3.2.	Área de Seguridad Vial .....	26
3.2.1.	Apropiación de diseños de los puntos PGO II .....	26
3.2.2.	Capacitación Seguridad Vial .....	27
3.3.	Área de Tránsito .....	28
3.3.1.	Ejecución de actividades para evaluación de impactos .....	28
3.3.2.	Contraste de Georreferenciación PGO II y PGO III .....	50
4.	PGO II .....	53
4.1.	Grupo 1.....	53
4.1.1.	Actividades e intervenciones.....	53
4.1.2.	Estado de informes Mensuales .....	54
4.1.3.	Ejecución de presupuestos .....	55
4.1.4.	Registro Fotográfico .....	55
4.1.5.	Conclusiones y logros .....	57
4.2.	Grupo 2.....	58
4.2.1.	Actividades e intervenciones.....	58
4.2.2.	Estado de informes interventoría .....	59
4.2.3.	Ejecución de presupuestos .....	63
4.2.4.	Novedades Contractuales .....	63
4.2.5.	Conclusiones y logros .....	64
4.2.6.	Anexo Grupo 2 .....	64
4.3.	Grupo 3.....	65
4.3.1.	Actividades e intervenciones.....	65
4.3.2.	Estado de informes interventoría .....	66
4.3.3.	Ejecución de presupuestos .....	70
4.3.4.	Conclusiones y logros .....	70
5.	Área de Comunicaciones.....	71
5.1.	Monitoreo de medios y redes sociales .....	71
5.2.	Boletín de prensa .....	76
5.3.	Elaboración de banner .....	77
5.4.	Cápsula de video PGO II.....	78
5.5.	Seguimiento a enlace de comunicaciones de PGOII.....	79
5.6.	Parrillas e información para Consejos Territoriales .....	80
6.	Área de Gestión social.....	81
6.1.	Comités semanales de seguimiento PGO II .....	81
6.2.	Revisión informes semanales y mensuales PGO II .....	82

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

6.3.	Actividades de difusión y socialización PGO II .....	83
6.4.	Lectura Territorial PGO II .....	87
6.5.	Talleres pedagógicos de seguridad vial.....	90
6.6.	Campaña de socialización y comunicaciones para la implementación del “Carril preferencial para motos” en Neiva.....	91
6.7.	Metodología de evaluación de impactos.....	91
7.	Área Ambiental y SST .....	93
7.1.	Control y seguimiento a la entrega oportuna de los productos ambientales y SST a remitir por parte de los contratistas e interventoría. ....	93
7.2.	Revisión, verificación y emisión de conceptos a los productos y comunicados remitidos por interventorías .....	94
7.3.	Seguimiento a obligaciones en seguridad y salud en el trabajo por parte de las interventorías. ....	97
7.3.1.	Exámenes médicos ocupacionales. ....	97
7.3.2.	Afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social Integral. ....	97
7.4.	Seguimiento a la Implementación de medidas de manejo ambiental en el PMA, protocolo de bioseguridad y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), propuestas y ofertadas por los contratistas de obra. ....	98
7.4.1.	Medidas implementadas en seguridad y salud en el trabajo .....	98
7.4.2.	Medidas de manejo ambiental .....	103
7.4.3.	Seguimiento a tramites ambientales .....	105
	Algunas de las especies a podar son Guayacán y Oití.....	106
7.5.	Asistencia y participación en reuniones .....	106
8.	Informe jurídico .....	108
8.1.	Actividades en procesos de selección .....	108
8.1.1.	Programa Pequeñas Grandes Obras II- PGO II .....	108
8.1.2.	Programa Pequeñas Grandes Obras II- PGO II – Interventoría .....	110
8.1.3.	Programa Pequeñas Grandes Obras III - PGO III – Consultoría Diseño.....	113
9.	Conclusiones .....	122
9.1.	En el área de Seguridad Vial.....	122
9.2.	En el área de Tránsito .....	122
9.3.	En el área de supervisión PGO II.....	122
9.3.1.	Grupo 1.....	122
9.3.2.	Grupo 2.....	123
9.3.3.	Grupo 3.....	123
9.4.	En el área de Comunicaciones .....	123
9.5.	En el área de Gestión Social.....	124
9.6.	En el área Ambiental .....	125
9.7.	En el área Jurídica.....	125
	Anexos.....	126

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**INFORME DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 219143 / ANSV 104 2019 PEQUEÑAS  
 GRANDES OBRAS (SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO Y LA AGENCIA NACIONAL DE  
 SEGURIDAD VIAL)**

**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE 05 DE 2021 AL 31 DE 05 DE 2021**

**1. Introducción**

El presente documento, “Informe mensual No 15 – Mayo 2021”, se elabora en el marco de las obligaciones contenidas en el contrato interadministrativo 104-2019 (numeración ANSV) y 219143 (numeración ENTerritorio), cuyo objeto es la **“Gerencia integral de proyecto para el desarrollo de los programas de intervención de medidas para la seguridad vial, en el territorio nacional”**, suscrito el 31 de diciembre de 2019 entre las partes citadas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio. El periodo cubierto por el informe es el comprendido entre el **01 y el 31 de mayo 2021**

De acuerdo con los requerimientos establecidos en el numeral 9.1 del Anexo Técnico del contrato, “Presentación de informes”, el informe está compuesto por tres secciones principales: i) informe administrativo, presupuestal y financiero; ii) informe técnico y iii) informe jurídico, aspectos que se reseñan con una periodicidad mensual, cubriendo los lapsos correspondientes a los meses del calendario.

El **informe administrativo, presupuestal y financiero** sintetiza los hitos y documentos originados por la gestión contractual del contrato interadministrativo, y la correspondencia cruzada en desarrollo de este. También, presenta el avance en la ejecución financiera del contrato, el reporte de los pagos efectivos por fuente de recursos derivados y el estado de las pólizas (en cuanto a su vigencia y actualización).

El **informe técnico** presenta, bajo un enfoque disciplinar -dado por las especialidades temáticas de los profesionales integrantes de la GIP-, el estado de avance de cada uno de los Programas (PGO II y PGO III), proyectos, y los eventuales problemas o dificultades que hayan surgido durante el periodo, así como la ruta de solución adoptada por las partes.

Por su parte, el **informe jurídico** desarrolla los elementos propios de la gestión contractual y aspectos normativos con incidencia sobre la ejecución del contrato.

Según las indicaciones de procedimiento, la formulación del informe mensual tuvo en cuenta la participación de todos los profesionales del equipo mínimo, y el visto bueno por parte del Gerente del Proyecto y el Supervisor del Contrato Interadministrativo.

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

## 2. Informe administrativo, presupuestal y financiero

Tal como se señaló en la introducción, este apartado resume los aspectos de índole administrativa resultantes de la ejecución del contrato Interadministrativo No. 219143 / ANSV 104-2019, así como el detalle asociado al flujo de los recursos para la financiación de las actividades de este.

### 2.1. Información general contrato

Los principales elementos del contrato interadministrativo a la fecha de corte del presente informe, **31 de mayo de 2021** son los siguientes:

**Tabla 1. Información general – Contrato interadministrativo 219143/104-2019 - corte mayo 2021**

Aspecto contractual	Dato o valor
Fecha de suscripción	31 de diciembre de 2019
Fecha acta de inicio	28 de febrero de 2020
Plazo inicial	16 meses
Fecha de vencimiento inicial	27 de junio de 2021
Valor inicial	\$ 48.128.120.220
Fecha de aprobación Otrosí No.1	30 de octubre 2020
Fecha de publicación Otrosí No.1	03 de noviembre de 2020
Fecha de vencimiento actual	27 de junio de 2021
Valor cuota de gerencia	\$ 4.534.500.000
Valor actual	\$ 48.128.120.220
Contratos derivados suscritos personal	Veintitrés (23)
Contratos derivados suscritos PGO II & PGO III	Quince (15)
Valor contratos derivados suscritos	\$ 13.539.349.037

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

Durante este periodo se suscribió un contrato derivado para reforzar el personal de la GIP.

### 2.2. Actas y ayudas de memoria

Se convenio con la ANSV la clasificación de espacios de articulación en Comités Técnicos (CT), Comités Financieros (CF), Reuniones de Seguimiento (RS) y Reuniones Institucionales (RI).

Durante este periodo (mayo de 2021) se llevaron a cabo un CF, un CT y ocho RS, para un total de diez (10) espacios de articulación entre los actores del proyecto, de acuerdo con las temáticas incluidas en la cuyas actas se pueden consultar en el Anexo 01 – Actas del contrato.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla 2. Espacios de articulación del contrato interadministrativo –mayo de 2021**

Reu	No	Fecha	Tema de la reunión
RS	59	5/05/2021	Revisión avance en toma de información línea base medición del impacto
RS	60	13/05/2021	Seguimiento Actividades PGOII, Zona 2 y 5
RS	61	18/05/2021	Seguimiento Actividades PGOII, Zona 3,4 y 6
RS	62	18/05/2021	Seguimiento Actividades PGOII, Zona 1 y 7
RS	63	21/05/2021	Seguimiento Actividades PGOII, Zona 2 y 5
RS	64	24/05/2021	Seguimiento Actividades PGOII, Zona 1 y 7
RS	65	25/05/2021	Avances en toma de información línea base medición de impacto
CF	9	26/05/2021	Comité Financiero 09
RS	66	31/05/2021	Seguimiento Actividades PGOII, Zona 1 y 7
CT	24	31/05/2021	Comité Técnico 24

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021*

### 2.3. Correspondencia generada en el marco del contrato

La interacción entre las partes contractuales durante el periodo del presente informe mensual (Mayo de 2021) arrojó los registros que se presentan en la Tabla 3.

**Tabla 3. Correspondencia generada – corte a 31 de mayo de 2021**

Fecha	Originador	E/S	Tipo	Radicado ENT	Radicado ANSV	Asunto
4/05/2021	ANSV	ENTRADA	oficio	20214300197712	20213000014091	Observaciones Informe mensual No. 13 – marzo 2021 versión 0
7/05/2021	ENT	SALIDA	oficio	20212700083271	20216900008562	Informe mensual 13 de 16 marzo 2021 versión 1.
10/05/2021	ENT	SALIDA	oficio	20212700084451	20216900008612	Remisión Hv Johanna Cruz
13/05/2021	ENT	SALIDA	oficio	20212700089181	20216900008812	Informe mensual 14 de 16 Abril 2021 v0.
13/05/2021	ANSV	ENTRADA	oficio	20214300171482	20213000015711	Aprobación Informe mensual No. 13 – marzo 2021 versión 1.
21/05/2021	ANSV	ENTRADA	oficio	20214300187492	20213000016421	Aprobación Hv Johanna Cruz Gestor social 1
26/05/2021	ANSV	ENTRADA	oficio	20214300187502	20213000016681	Observaciones - Informe mensual No. 14 - abril 2021 versión 0.

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

## 2.4. Garantías del contrato

De acuerdo con lo descrito en los Estudios Previos, en el numeral 4.1.1. "Obligaciones generales del contratista" (numeral 2), ENTerritorio constituyó y allegó a la ANSV las garantías, requisito para la firma del acta de inicio. Así mismo, el 30 de abril de 2020 la GIP remitió a la ANSV las garantías actualizadas, teniendo en cuenta la fecha de suscripción del acta de inicio (28 de febrero de 2020). Desde entonces, no han tenido modificaciones.

## 2.5. Aspectos presupuestales y financieros

En esta sección se presenta el balance, los movimientos y los pagos efectivos por fuente de recursos propios de la ejecución del contrato interadministrativo. A la fecha de corte del informe (31 de mayo de 2021) se registraron, efectivamente, movimientos de recursos según se verá más adelante. De acuerdo con la cláusula novena de la minuta suscrita, "forma de pago", el flujo de recursos del proyecto desde la ANSV hacia ENTerritorio se caracterizará por el movimiento de recursos obedientes a dos conceptos básicos: **i)** la cuota de gerencia integral del proyecto, y **ii)** los desembolsos para ejecutar las contrataciones derivadas.

### 2.5.1. Cuota de Gerencia Integral del Proyecto

Con relación a la remuneración por la Gerencia Integral del Proyecto, los pagos sucederán de acuerdo con el resumen que se presenta en la Tabla 4.

**Tabla 4. Pago de la cuota de Gerencia Integral del Proyecto**

Valor	%	Concepto	Requisito (aprobación ANSV)
\$ 453.450.000	10%	Primer pago	Plan de Trabajo, Manual Operativo Financiero
\$ 3.627.600.000	80%	16 cuota mensuales de gerencia, 5% cada una	Informe mensual, son 16 meses
\$ 453.450.000	10%	Pago por terminación	Planos de diseño y obra, liquidación e informe final
\$ 4.534.500.000	100%	Cuota de Gerencia Integral	Todos los anteriores

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

#### 2.5.1.1. Autorizaciones de desembolso de Cuotas de GIP en Comités Financieros

En el **Comité Financiero 01**, llevado a cabo el 11 de junio de 2020, se autorizaron desembolsos por valor de **\$906.900.000**, correspondientes a los porcentajes de la Gerencia Integral del Proyecto, montos y soportes reseñados en los desembolsos GIP1, GIP2 y GIP3 de la Tabla 5.

En el **Comité Financiero 02**, llevado a cabo el 24 de julio de 2020, se autorizaron desembolsos por valor de **\$226.725.000**, correspondientes a los porcentajes de la Gerencia Integral del Proyecto, montos y soportes reseñados en el desembolso GIP4 de la Tabla 5.

En el **Comité Financiero 03**, llevado a cabo el 27 de agosto de 2020, se autorizaron desembolsos por valor de **\$226.725.000**, correspondientes a los porcentajes de la Gerencia Integral del Proyecto, montos y soportes reseñados en el desembolso GIP5 de la Tabla 5.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

En el **Comité Financiero 04**, llevado a cabo el 26 de octubre de 2020, se autorizaron desembolsos por valor de **\$680.175.000**, correspondientes a los porcentajes de la Gerencia Integral del Proyecto, montos y soportes reseñados en el desembolso GIP6, GIP7, GIP8 de la Tabla 5.

En el **Comité Financiero 05**, llevado a cabo el 30 de noviembre de 2020, se autorizaron desembolsos por valor de **\$226.725.000**, correspondientes a los porcentajes de la Gerencia Integral del Proyecto, montos y soportes reseñados en el desembolso GIP9 de la Tabla 5.

En el **Comité Financiero 06**, llevado a cabo el 21 de diciembre de 2020, “no” se autorizaron desembolsos correspondientes a los porcentajes de la Gerencia Integral del Proyecto.

En el **Comité Financiero 07**, llevado a cabo el 11 de febrero de 2021, se autorizaron desembolsos por valor de **\$453.450.000**, correspondientes a los porcentajes de la Gerencia Integral del Proyecto, montos y soportes reseñados en el desembolso GIP10, GIP11 de la Tabla 5.

En el **Comité Financiero 08**, llevado a cabo el 26 de marzo de 2021, se autorizaron desembolsos por valor de **\$226.725.000**, correspondientes a los porcentajes de la Gerencia Integral del Proyecto, montos y soportes reseñados en el desembolso GIP12 de la Tabla 5.

En el **Comité Financiero 09**, llevado a cabo el 26 de mayo de 2021, se autorizaron desembolsos por valor de **\$453.450.000**, correspondientes a los porcentajes de la Gerencia Integral del Proyecto, montos y soportes reseñados en el desembolso GIP13, GIP14 de la Tabla 5.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla 5. Autorizaciones de desembolso de recursos GIP en Comités Financieros**

Desembolso No.	% del valor de la GIP	Concepto	Se verifica contra	Soporte (Comunicación)	¿Requisito cumplido?	CF en el que se autoriza desembol	Valor desembolso	Valor de cuota de gerencia luego de desembolso
GIP1	10%	Pago Inicial	Aprobación plan de trabajo y Manual operativo y financiero	20200416 - 20201200011751 Aprob. Plan de trabajo v1 rad ENT 20204300139532; 20200610 - 2020120016631 Aprob Manual Operativo Financiero MOF rad ENT 20204300181742	sí	CF 01	\$ 453.450.000	\$ 4.081.050.000
GIP2	5%	Cuota de Gerencia	Informe mensual 1de16 Aprobado	20200520 - 20201200014771 Aprob Info 1de16 - marzo 2020 firmada rad ENT 20204300164262	sí	CF 01	\$ 226.725.000	\$ 3.854.325.000
GIP3	5%	Cuota de Gerencia	Informe mensual 2de16 Aprobado	2020528 - 20204300168882 Aprob Info 2de16 - abril 2020 firmada rad ENT 20201200015201	sí	CF 01	\$ 226.725.000	\$ 3.627.600.000
GIP4	5%	Cuota de Gerencia	Informe mensual 3de16 Aprobado	20200721 - 20201200019251 Aprob Info 3de16 - mayo 2020 firmada rad ENT 20204300221252	sí	CF 02	\$ 226.725.000	\$ 3.400.875.000
GIP5	5%	Cuota de Gerencia	Informe mensual 4de16 Aprobado	20200728 - 20201200020021 Aprob Info 4de16 - junio 2020 firmada rad ENT 20204300231832	sí	CF 03	\$ 226.725.000	\$ 3.174.150.000
GIP6	5%	Cuota de Gerencia	Informe mensual 5de16 Aprobado	20200923 - 20201200025071 Aprob Info 5de16 - julio 2020 firmada rad ENT 20204300297642	sí	CF 04	\$ 226.725.000	\$ 2.947.425.000
GIP7	5%	Cuota de Gerencia	Informe mensual 6de16 Aprobado	20200929 - 20203000025971 Aprob Info 6de16 - agosto 2020 firmada rad ENT 20204300306532	sí	CF 04	\$ 226.725.000	\$ 2.720.700.000
GIP8	5%	Cuota de Gerencia	Informe mensual 7de16 Aprobado	20201021 - 20203000028271 Aprob Info 7de16 septiembre 2020 Rad ENT 20204300334272	sí	CF 04	\$ 226.725.000	\$ 2.493.975.000
GIP9	5%	Cuota de Gerencia	Informe mensual 8de16 Aprobado	20201125 - 20203000032271 Aprob Info 8de16 octubre 2020 Rad ENT 20204300374662	sí	CF 05	\$ 226.725.000	\$ 2.267.250.000
GIP10	5%	Cuota de Gerencia	Informe mensual 9de16 Aprobado	20201223 - 20203000035411 Aprob Info 9de16 noviembre 2020 Rad ENT 20204300413412	sí	CF 07	\$ 226.725.000	\$ 2.040.525.000
GIP11	5%	Cuota de Gerencia	Informe mensual 10de16 Aprobado	20210203 - 20213000002741 Aprob Info 10de16 diciembre 2020 Rad ENT 20214300039392	sí	CF 07	\$ 226.725.000	\$ 1.813.800.000
GIP12	5%	Cuota de Gerencia	Informe mensual 11de16 Aprobado	20210310 - 20213000006821 Aprob Info 11de16 enero 2021 Rad ENT 20214300082682	sí	CF 08	\$ 226.725.000	\$ 1.587.075.000
GIP13	5%	Cuota de Gerencia	Informe mensual 12de16 Aprobado	20210413 - 20213000011161 Aprob Info 12 de16 febrero 2021 Rad ENT 20214300151152	sí	CF 09	\$ 226.725.000	\$ 1.360.350.000
GIP14	5%	Cuota de Gerencia	Informe mensual 13de16 Aprobado	20210513 - 20213000015711 Aprob Info 13 de16 marzo 2021 Rad ENT 20214300171482	sí	CF 09	\$ 226.725.000	\$ 1.133.625.000
<b>Total autorizado</b>							<b>\$ 3.400.875.000</b>	<b>75%</b>

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Los montos de cuotas de GIP solicitados en los Comités Financieros 1 al 9 corresponden a la suma de \$ 3.400.875.000 y representan el 75% de la ejecución, sin embargo, a corte del mes de mayo de 2021 ha ingresado a la cuenta del proyecto como Aportes del Cliente la suma de \$2.947.425.000 dado que se encuentra en trámite el desembolso autorizado en el comité financiero No.9. De acuerdo con lo anterior, el saldo por aprobar en comités financieros es de \$1.133.625.000 que representan el 25% del total de la cuota de gerencia establecida contractualmente.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

### 2.5.2. Contratación derivada

En cuanto a las contrataciones derivadas, se definió que será el Comité Financiero la instancia que determine las necesidades de flujo de caja inherentes a la contratación derivada, de acuerdo con la información que la GIP presente para estudio.

Esta contratación puede incluir, de acuerdo con lo contemplado en el numeral 5.1 (párrafo 2) de los Estudios Previos, la contratación de personal según necesidad, y los contratos de diseños, obra e interventorías asociadas.

Al respecto de la vinculación de personal con cargo a los recursos de contratación derivada, se presenta a continuación una relación de toda la contratación derivada realizada a la fecha, separando los contratos suscritos en periodos anteriores al cubierto en este informe, y los suscritos durante **mayo de 2021**.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla 6 Contratos derivados**

Contratación Derivada Número	Contratista	No. Contrato	Cargo	Estado del Contrato Derivado	Valor Inicial del Contrato	Valor de la prórroga	Valor total contrato	Anticipo	Fecha inicio	Fecha Terminación
1	Lenin Jhonathan Dávila Pardo	2200735	Gestor Social 1	Terminado	\$ 36.777.574	\$ 0	\$ 36.777.574	N/A	29/05/2020	29/08/2020
2	Martha Patricia Pedraza López	2200773	Apoyo en Comunicaciones 1	Terminado	\$ 21.783.209	\$ 15.150.000	\$ 36.933.209	N/A	18/06/2020	18/12/2020
3	Marco Antonio Borda León	2200826	Ingeniero Coordinador de Zona 1	Terminado	\$ 51.832.383	\$ 0	\$ 51.832.383	N/A	3/08/2020	3/02/2021
4	Jenny Natalia Ramírez Esquivel	2200860	Profesional Ambiental	En ejecución prorrogado	\$ 63.191.362	\$ 41.808.333	\$ 104.999.695	N/A	3/08/2020	27/06/2021
5	Guillermo Morales Melo	2200869	Ingeniero Coordinador de Zona 2	En ejecución prorrogado	\$ 61.680.536	\$ 38.583.767	\$ 100.264.303	N/A	6/08/2020	27/06/2021
6	Johana Cruz Bayona	2200904	Apoyo en Gestión Social	En ejecución	\$ 36.483.653	\$ 0	\$ 36.483.653	N/A	15/09/2020	15/03/2021
7	Andrés Leonardo Trujillo Delgado	2200957	Gestor Social 1	Terminado	\$ 59.427.574	\$ 0	\$ 59.427.574	N/A	26/10/2020	26/04/2021
8	Sadith Marulanda Bustos	2200970	Gestor Social 2	En ejecución	\$ 59.427.574	\$ 15.858.333	\$ 75.285.907	N/A	3/11/2020	3/05/2021
9	Diana Mayerli Mahecha Garay	2200973	Profesional Administrativo	En ejecución prorrogado	\$ 22.020.000	\$ 6.483.667	\$ 28.503.667	N/A	5/11/2020	5/05/2021
10	Martha Patricia Pedraza López	2201046	Apoyo en Comunicaciones 1	En ejecución prorrogado	\$ 36.933.209	\$ 0	\$ 36.933.209	N/A	23/12/2020	23/06/2021
11	Luisa Fernanda Yáñez Agudelo	2201045	Gestor Social 3	En ejecución	\$ 48.254.922	\$ 0	\$ 48.254.922	N/A	24/12/2020	24/06/2021
12	Ana Milena Quintero Agamez	2201044	Gestor Social 4	En ejecución	\$ 48.254.922	\$ 0	\$ 48.254.922	N/A	24/12/2020	24/06/2021
13	Diego Armando Chaves Chamarro	2201060	Gestor Social 5	En ejecución	\$ 48.254.922	\$ 0	\$ 48.254.922	N/A	29/12/2020	27/06/2021
14	Diego Ignacio Gualteros Chávez	2201099	Ingeniero Coordinador de Zona 3	En ejecución	\$ 51.832.383	\$ 0	\$ 51.832.383	N/A	29/12/2020	27/06/2021

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

Contratación Derivada Número	Contratista	No. Contrato	Cargo	Estado del Contrato Derivado	Valor Inicial del Contrato	Valor de la prórroga	Valor total contrato	Anticipo	Fecha inicio	Fecha Terminación
15	Álvaro Ernesto Sánchez Rosero	2201091	Ingeniero Coordinador de Zona 5	Terminación Anticipada	\$ 57.232.383	\$ 0	\$ 57.232.383	N/A	30/12/2020	24/05/2021
16	Oscar Javier Rodríguez Martínez	2210026	Coordinador de estudios y diseños área no. 2	Terminación Anticipada	\$ 51.400.447	\$ 0	\$ 51.400.447	N/A	8/02/2021	7/05/2021
17	Diego Andrés Jaramillo Ortiz	2210027	Abogado	En ejecución	\$ 34.250.000	\$ 0	\$ 34.250.000	N/A	8/02/2021	27/06/2021
18	Omar Yesid Adame Cruz	2210052	Ingeniero Apoyo	En ejecución	\$ 27.650.014	\$ 7.600.000	\$ 35.250.014	N/A	17/02/2021	27/06/2021
19	Cristian Yesid Salcedo	2210053	Tecnólogo Siso	En ejecución	\$ 22.972.410	\$ 0	\$ 22.972.410	N/A	17/02/2021	27/06/2021
20	Yeimy Tatiana López Huertas	2210093	Coordinador de estudios y diseños área No. 1	Ejecución	\$ 37.646.131	\$ 0	\$ 37.646.131	N/A	3/03/2021	27/06/2021
21	Ester Lucia Lemos Andrade	2210126	Coordinador de estudios y diseños área No. 3	Ejecución	\$ 30.026.193	\$ 0	\$ 30.026.193	N/A	17/03/2021	27/06/2021
22	Harry Nelson Ramírez Rosero	2210144	Coordinador de estudios y diseños área No. 4	Ejecución	\$ 23.861.193	\$ 0	\$ 23.861.193	N/A	12/04/2021	27/06/2021
<b>SUBTOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS CONTRATACION PROFESIONALES</b>					<b>\$ 931.192.994</b>	<b>\$ 125.484.100</b>	<b>\$ 1.056.677.094</b>			
1	Consortio Señalización Vial Hic - PGO II	2210019	N/A	suspendidos	\$ 1.248.447.500	\$ 0	\$ 1.248.447.500	\$ 124.844.750	9/03/2021	27/06/2021
2	Consortio Señalización Vial Hic - PGO II	2210020	N/A	En ejecución	\$ 1.151.788.500	\$ 0	\$ 1.151.788.500	\$ 115.178.850	10/03/2021	27/06/2021
3	Unión Temporal Señalización Vial - PGO II	2210021	N/A	En ejecución	\$ 1.327.045.500	\$ 0	\$ 1.327.045.500	\$ 132.704.550	11/03/2021	27/06/2021
4	Servicios Especializados de Señalización Limitada PGO II	2210022	N/A	En ejecución	\$ 1.446.664.000	\$ 0	\$ 1.446.664.000	\$ 144.666.400	11/03/2021	27/06/2021

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

Contratación Derivada Número	Contratista	No. Contrato	Cargo	Estado del Contrato Derivado	Valor Inicial del Contrato	Valor de la prórroga	Valor total contrato	Anticipo	Fecha inicio	Fecha Terminación
5	Señalizaciones Y Construcciones S.A.S. - PGO II	2210023	N/A	En ejecución	\$ 1.167.180.000	\$ 0	\$ 1.167.180.000	\$ 116.718.000	10/03/2021	27/06/2021
6	Gestión Vial Integral S.A.S - PGO II	2210024	N/A	En ejecución	\$ 1.241.550.000	\$ 0	\$ 1.241.550.000	\$ 124.155.000	11/03/2021	27/06/2021
7	Corseing Sociedad Por Acciones Simplificada - PGO II	2210025	N/A	Suspendido	\$ 1.452.062.000	\$ 0	\$ 1.452.062.000	N/A	9/03/2021	27/06/2021
8	Consortio Sedic Proyectos - PGO II - Interventoría	2210030	N/A	En ejecución	\$ 546.291.402	\$ 0	\$ 546.291.402	N/A	11/03/2021	27/06/2021
9	Ingeniería Consultoría y Planeación S.A. - Incoplan S.A.- PGO II - Interventoría	2210031	N/A	Suspendido	\$ 408.466.212	\$ 0	\$ 408.466.212	N/A	9/03/2021	27/06/2021
10	Consortio Interventoría Vial I - PGO II - Interventoría	2210032	N/A	En ejecución	\$ 400.433.692	\$ 0	\$ 400.433.692	N/A	10/03/2021	27/06/2021
11	Consortio Sp PGO III - Diseños	2210050	N/A	Suscrito	\$ 504.084.000	\$ 0	\$ 504.084.000	N/A	está pendiente la firma del acta de inicio	está pendiente la firma del acta de inicio
12	Consortio Sp- PGO III - Diseños	2210051	N/A	Suscrito	\$ 492.660.000	\$ 0	\$ 492.660.000	N/A	está pendiente la firma del acta de inicio	está pendiente la firma del acta de inicio
13	Señales LTDA - PGO II	2210156	N/A	Suscrito	\$ 481.236.000	\$ 0	\$ 481.236.000	N/A	está pendiente la firma del acta de inicio	está pendiente la firma del acta de inicio
14	Señales LTDA - PGO II	2210179	N/A	Suscrito	\$ 486.234.000	\$ 0	\$ 486.234.000	N/A	está pendiente la firma del acta de inicio	está pendiente la firma del acta de inicio
15	Subatours S.A.S	2020840	N/A	En ejecución	\$ 115.700.000	\$ 0	\$ 115.700.000	N/A	2/10/2020	2/10/2021
<b>SUBTOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS INTERVENTORIA, OBRA, SEÑALIZACION y TIQUETES</b>					<b>\$ 12.469.842.806</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 12.469.842.806</b>	<b>\$ 758.267.550</b>		

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

Así mismo, **durante el periodo (mayo de 2021)** se suscribieron contratos derivados, para el refuerzo del equipo de la GIP:

**Tabla 7 Contratos Derivados Suscritos en mayo 2021**

Contratación Derivada Número	Contratista	No. Contrato	Cargo	Estado del Contrato Derivado	Valor Inicial del Contrato	Valor de la prórroga	Valor total contrato	Anticipo	Fecha inicio	Fecha Terminación
1	Johanna Cruz Bayona	2210376	Gestor Social 1	Ejecución	\$ 12.829.137	\$ 0	\$ 12.829.137	N/A	19/05/2021	27/06/2021
<b>SUBTOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS CONTRATACION PROFESIONALES</b>					<b>\$ 12.829.137</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 12.829.137</b>			
<b>TOTAL CONTRATACIÓN DERIVADA</b>					<b>\$ 13.413.864.937</b>	<b>\$ 125.484.100</b>	<b>\$ 13.539.349.037</b>	<b>\$ 758.267.550</b>		

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021*

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

### 2.5.2.1. Autorizaciones de desembolso de recursos MAI en Comités Financieros

En el **Comité Financiero 01**, llevado a cabo el 11 de junio de 2020, se autorizaron desembolsos por valor de **\$9.750.000**, correspondientes a los Contratos Derivados, montos y pagos reseñados en el desembolso MAI1 de la Tabla 8.

En el **Comité Financiero 02**, llevado a cabo el 24 de julio de 2020, se autorizaron desembolsos por valor de **\$34.650.000**, correspondientes a los Contratos Derivados, montos y pagos reseñados en los desembolsos MAI2 y MAI3 de la Tabla 8.

En el **Comité Financiero 03**, llevado a cabo el 27 de agosto de 2020, se autorizaron desembolsos por valor de **\$105.749.781**, correspondientes a los Contratos Derivados, montos y pagos reseñados en los desembolsos MAI4, MAI5 y MAI6 de la Tabla 8.

En el **Comité Financiero 04**, llevado a cabo el 26 de octubre de 2020, se autorizaron desembolsos por valor de **\$99.874.500**, correspondientes a los Contratos Derivados, montos y pagos reseñados en los desembolsos MAI7 al MAI11 de la Tabla 8

En el **Comité Financiero 05**, llevado a cabo el 30 de noviembre de 2020, se autorizaron desembolsos por valor de **\$92.472.171**, correspondientes a los Contratos Derivados, montos y pagos reseñados en los desembolsos MAI12 al MAI16 de la Tabla 8

En el **Comité Financiero 06**, llevado a cabo el 21 de diciembre de 2020, se autorizaron desembolsos por valor de **\$969.453.153**, correspondientes a los Contratos Derivados de PGO II, montos y pagos reseñados en los desembolsos MAI17 al MAI29 de la Tabla 8

En el **Comité Financiero 07**, llevado a cabo el 11 de febrero de 2021, se autorizaron desembolsos por valor de **\$1.222.810.488**, correspondientes a los Contratos Derivados de PGO II, montos y pagos reseñados en los desembolsos MAI30 al MAI47 de la Tabla 8.

En el **Comité Financiero 08**, llevado a cabo el 26 de marzo de 2021, se autorizaron desembolsos por valor de **\$305.852.479**, correspondientes a los Contratos Derivados, montos y pagos reseñados en los desembolsos MAI48 al MAI63 de la Tabla 8.

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>F-GG-42</b>
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>2020-10-24</b>

**Tabla 8. Autorizaciones de desembolso de recursos MAI en Comités Financieros**

Desembolso No.	Concepto	Se verifica contra	Soporte	¿Requisito cumplido?	CF en el que se autoriza desembolsos	Valor desembolso	Valor del MAI disponible luego de desembolso
MAI1	Pago 1de3 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Gestor Social 1	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200515 - CDP 4220 - Lenin Dávila; Contrato No. 2200735 suscrito en SECOF	sí	CF01	\$ 9.750.000	\$ 43.583.870.280
MAI2	Pago 2y3de3 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Gestor Social 1	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200515 - CDP 4220 - Lenin Dávila; Contrato No. 2200735 suscrito en SECOF	sí	CF02	\$ 19.500.000	\$ 43.564.370.280
MAI3	Pago 1,2y3de3 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Apoyo comunicaciones	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200611 - CDP 4255 - Patricia Pedraza; Contrato No. 2200773 suscrito en SECOF	sí	CF02	\$ 15.150.000	\$ 43.549.220.280
MAI4	Pago 1,2y3de3 (Honorarios fijos) y Pago de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Ing. Coordinador de zona 1	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200722 - CDP 4361 - Marco Antonio Borda León; Contrato No. 2200826 suscrito en SECOF	sí	CF03	\$ 31.282.383	\$ 43.517.937.897
MAI5	Pago 1,2y3de3 (Honorarios fijos) y Pago de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Profesional Ambiental	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200717 - CDP 4356 - Jeny Natalia Ramírez Esquivel; Contrato No. 2200860 suscrito en SECOF	sí	CF03	\$ 37.241.362	\$ 43.480.696.535
MAI6	Pago 1,2y3de3 (Honorarios fijos) y Pago de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Ing. Coordinador de zona 2	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200730 - CDP 4381 - Guillermo Morales Melo; Contrato No. 2200869 suscrito en SECOF	sí	CF03	\$ 37.226.036	\$ 43.443.470.499
MAI7	Pago 4,5y6de6 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Apoyo comunicaciones	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200910 - CDP 4454 - Patricia Pedraza; Adición y Prórroga al Contrato No. 2200773 suscrito en SECOF	sí	CF04	\$ 15.150.000	\$ 43.428.320.499
MAI8	Pago 1,2y3de6 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Apoyo gestión social	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200902 - CDP 4439 - Luis Gabriel Soto Hernandez; Contrato No. 2200904 suscrito en SECOF	sí	CF04	\$ 13.770.000	\$ 43.414.550.499
MAI9	Pago 4,5y6de6 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Ing. Coordinador de zona 1	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200722 - CDP 4361 - Marco Antonio Borda León; Contrato No. 2200826 suscrito en SECOF	sí	CF04	\$ 20.550.000	\$ 43.394.000.499
MAI10	Pago 4,5y6de6 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Profesional Ambiental	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200717 - CDP 4356 - Jeny Natalia Ramírez Esquivel; Contrato No. 2200860 suscrito en SECOF	sí	CF04	\$ 25.950.000	\$ 43.368.050.499
MAI11	Pago 4,5y6de6 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Ing. Coordinador de zona 2	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200730 - CDP 4381 - Guillermo Morales Melo; Contrato No. 2200869 suscrito en SECOF	sí	CF04	\$ 24.454.500	\$ 43.343.595.999
MAI12	Pago 1,2y3de6 (Honorarios fijos) y Pago de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Gestor Social 1	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200917 - CDP 4463 - Andrés Trujillo; Contrato No. 2200957 suscrito en SECOF	sí	CF05	\$ 33.477.574	\$ 43.310.118.425
MAI13	Pago 1,2y3de6 (Honorarios fijos) y Pago de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Gestor Social 2	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200917 - CDP 4463 - Sadith Marulanda; Contrato No. 2200970 suscrito en SECOF	sí	CF05	\$ 33.477.574	\$ 43.276.640.851
MAI14	Pago 1,2y3de6 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Apoyo Administrativo	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20201027 - CDP 4527 - Diana Mahecha; Contrato No. 2200973 suscrito en SECOF	sí	CF05	\$ 11.010.000	\$ 43.265.630.851
MAI15	Pago 4,5y6de6 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Apoyo gestión social	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200902 - CDP 4439 - Johanna Cruz (Gesión); Contrato No. 2200904 suscrito en SECOF	sí	CF05	\$ 13.770.000	\$ 43.251.860.851
MAI16	Pago (Honorarios variables) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Apoyo comunicaciones	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200611 - CDP 4255 - Patricia Pedraza; Contrato No. 2200773 suscrito en SECOF	sí	CF05	\$ 737.023	\$ 43.251.123.828
MAI17	Pago a título de Anticipo del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Obras PGO II - Grupo 01	CDP, Proceso suscrito en SECOF	20201117 - CDP 4569 - Obras PGO II - Grupo 01; proceso No. CAB-008-2020 suscrito en SECOF	sí	CF06	\$ 124.844.750	\$ 43.126.279.078
MAI18	Pago a título de Anticipo del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Obras PGO II - Grupo 02	CDP, Proceso suscrito en SECOF	20201117 - CDP 4570 - Obras PGO II - Grupo 02; proceso No. CAB-008-2020 suscrito en SECOF	sí	CF06	\$ 115.178.850	\$ 43.011.100.228
MAI19	Pago a título de Anticipo del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Obras PGO II - Grupo 03	CDP, Proceso suscrito en SECOF	20201117 - CDP 4571 - Obras PGO II - Grupo 03; proceso No. CAB-008-2020 suscrito en SECOF	sí	CF06	\$ 132.704.550	\$ 42.878.395.678
MAI20	Pago a título de Anticipo del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Obras PGO II - Grupo 04	CDP, Proceso suscrito en SECOF	20201117 - CDP 4572 - Obras PGO II - Grupo 04; proceso No. CAB-008-2020 suscrito en SECOF	sí	CF06	\$ 144.666.400	\$ 42.733.729.278
MAI21	Pago a título de Anticipo del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Obras PGO II - Grupo 05	CDP, Proceso suscrito en SECOF	20201117 - CDP 4573 - Obras PGO II - Grupo 05; proceso No. CAB-008-2020 suscrito en SECOF	sí	CF06	\$ 116.718.000	\$ 42.617.011.278
MAI22	Pago a título de Anticipo del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Obras PGO II - Grupo 06	CDP, Proceso suscrito en SECOF	20201117 - CDP 4574 - Obras PGO II - Grupo 06; proceso No. CAB-008-2020 suscrito en SECOF	sí	CF06	\$ 124.155.000	\$ 42.492.856.278
MAI23	Pago a título de Anticipo del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Obras PGO II - Grupo 07	CDP, Proceso suscrito en SECOF	20201117 - CDP 4575 - Obras PGO II - Grupo 07; proceso No. CAB-008-2020 suscrito en SECOF	sí	CF06	\$ 145.206.200	\$ 42.347.650.078

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>				<b>CÓDIGO:</b>	<b>F-GG-42</b>
					<b>VERSIÓN:</b>	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>				<b>VIGENCIA:</b>	<b>2020-10-24</b>

MAI24	Pago cuenta de cobro No.1 (Suministro de Tiquetes aéreos) para Coordinadores de Zona 1 y 2	CDP, Cuenta de cobro No.1	20200828 - CDP 4430 - Tiquetes Aéreos; Cuenta de cobro No.1 Factura electronica FE 398 y FE 3251	sí	CF06	\$	1.022.659	\$	42.346.627.419
MAI25	Pago cuenta de cobro No.2 (Suministro de Tiquetes aéreos) para Gestores sociales 1 y 2	CDP, Cuenta de cobro No.2	20200828 - CDP 4430 - Tiquetes Aéreos; Cuenta de cobro No.2 Factura electronica FE 10579 y FE 11106	sí	CF06	\$	1.263.054	\$	42.345.364.365
MAI26	Pago cuenta de cobro No.3 (Suministro de Tiquetes aéreos) para Gestores sociales 1 y 2	CDP, Cuenta de cobro No.3	20200828 - CDP 4430 - Tiquetes Aéreos; Cuenta de cobro No.3 Factura electronica FE 11877 y FE 11882	sí	CF06	\$	783.690	\$	42.344.580.675
MAI27	Pago 4,5y6de6 (Honorarios fijos) Contrato de prestación de servicios profesionales - Gestor Social 1	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200917 - CDP 4464 - Andrés Trujillo; Contrato No. 2200957 suscrito en SECOF	sí	CF06	\$	25.950.000	\$	42.318.630.675
MAI28	Pago 4,5y6de6 (Honorarios fijos) Contrato de prestación de servicios profesionales - Gestor Social 2	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200917-CDP 4463 Sadith Marulanda; Contrato No. 2200970 suscrito en SECOF	sí	CF06	\$	25.950.000	\$	42.292.680.675
MAI29	Pago 4,5y6de6 (Honorarios fijos) Contrato de prestación de servicios profesionales - Apoyo Administrativo	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20201027-CDP 4527 Diana Mahecha; Contrato No. 2200973 suscrito en SECOF	sí	CF06	\$	11.010.000	\$	42.281.670.675
MAI30	Pago 1,2 y 3de6 (Honorarios fijos) y Pago del 50% de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Gestor social 3	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20201207-CDP 4643 Luisa Yañez; Contrato No. 2201045 suscrito en SECOF	sí	CF07	\$	24.127.461,0	\$	42.257.543.214
MAI31	Pago 1,2 y 3de6 (Honorarios fijos) y Pago del 50% de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Gestor social 4	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20201211-CDP 4651 Ana Quintero; Contrato No. 2201044 suscrito en SECOF	sí	CF07	\$	24.127.461,0	\$	42.233.415.753
MAI32	Pago 1,2 y 3de6 (Honorarios fijos) y Pago del 50% de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Gestor social 5	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20201211-CDP 4652 Diego Chaves; Contrato No. 2201060 suscrito en SECOF	sí	CF07	\$	24.127.461,0	\$	42.209.288.292
MAI33	Pago 1,2 y 3de6 (Honorarios fijos) y Pago del 50% de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Coordinador de zona 3	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20201211-CDP 4653 Diego Gualteros; Contrato No. 2201099 suscrito en SECOF	sí	CF07	\$	25.916.191,5	\$	42.183.372.101
MAI34	Pago 1,2 y 3de6 (Honorarios fijos) y Pago del 50% de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Coordinador de zona 5	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20201211-CDP 4648 Alvaro Sanchez; Contrato No. 2201091 suscrito en SECOF	sí	CF07	\$	28.616.191,5	\$	42.154.755.909
MAI35	Pago 1,2 y 3de6 (Honorarios fijos) y Pago de 50% de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Apoyo comunicaciones	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20201207-CDP 4644 Martha Pedraza; Contrato No. 2201046 suscrito en SECOF	sí	CF07	\$	18.466.604,5	\$	42.136.289.305
MAI36	Pago cuenta de cobro No.xx (Suministro de Tiquetes aéreos)	CDP, Cuenta de cobro No.xx	Tiquetes aereos Johanna Cruz FE 24717 y Martha Pedraza FE 24719	sí	CF07	\$	703.060,0	\$	42.135.586.245
MAI37	Pago (Honorarios variables) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Apoyo comunicaciones	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200902 - CDP 4439 Johanna Cruz (Cesión); Contrato No. 2200904 suscrito en SECOF	sí	CF07	\$	496.870,0	\$	42.135.089.375
MAI38	Pago a título de Avance del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Obras PGO II - Grupo 01	CDP, Proceso suscrito en SECOF	20201117 - CDP 3113 - Obras PGO II - Zona 01; proceso No. CAB-008-2020 suscrito en SECOF	sí	CF07	\$	119.985.848,2	\$	42.015.103.526
MAI39	Pago a título de Avance del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Obras PGO II - Grupo 02	CDP, Proceso suscrito en SECOF	20201117 - CDP 3107 - Obras PGO II - Zona 02; proceso No. CAB-008-2020 suscrito en SECOF	sí	CF07	\$	110.805.137,1	\$	41.904.298.389
MAI40	Pago a título de Avance del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Obras PGO II - Grupo 03	CDP, Proceso suscrito en SECOF	20201117 - CDP 3108 - Obras PGO II - Zona 03; proceso No. CAB-008-2020 suscrito en SECOF	sí	CF07	\$	128.192.410,0	\$	41.776.105.979
MAI41	Pago a título de Avance del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Obras PGO II - Grupo 04	CDP, Proceso suscrito en SECOF	20201117 - CDP 3109 - Obras PGO II - Zona 04; proceso No. CAB-008-2020 suscrito en SECOF	sí	CF07	\$	141.525.306,7	\$	41.634.580.673
MAI42	Pago a título de Avance del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Obras PGO II - Grupo 05	CDP, Proceso suscrito en SECOF	20201117 - CDP 3110 - Obras PGO II - Zona 05; proceso No. CAB-008-2020 suscrito en SECOF	sí	CF07	\$	110.925.928,2	\$	41.523.654.744
MAI43	Pago a título de Avance del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Obras PGO II - Grupo 06	CDP, Proceso suscrito en SECOF	20201117 - CDP 3111 - Obras PGO II - Zona 06; proceso No. CAB-008-2020 suscrito en SECOF	sí	CF07	\$	120.958.425,4	\$	41.402.696.319
MAI44	Pago a título de Avance del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Obras PGO II - Grupo 07	CDP, Proceso suscrito en SECOF	20201117 - CDP 3112 - Obras PGO II - Zona 07; proceso No. CAB-008-2020 suscrito en SECOF	sí	CF07	\$	138.675.225,2	\$	41.264.021.094
MAI45	Pago a título de Avance del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Interventorías Obras PGO II - Grupo 01	CDP	20210104 - CDP 3114 Interventoría PGO II - GRUPO 1	sí	CF07	\$	82.702.448,5	\$	41.181.318.645
MAI46	Pago a título de Avance del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Interventorías Obras PGO II - Grupo 02	CDP	20210104 - CDP 3115 Interventoría PGO II - GRUPO 2	sí	CF07	\$	61.837.246,0	\$	41.119.481.399
MAI47	Pago a título de Avance del total del POE destinado al contrato a ejecutarse Interventorías Obras PGO II - Grupo 03	CDP	20210104 - CDP 3116 Interventoría PGO II - GRUPO 3	sí	CF07	\$	60.621.211,7	\$	41.058.860.187
MAI48	Pago 7, 8 y 9 de 11 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Profesional Ambiental	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200717 - CDP 4356 - Jeny Natalia Ramírez Esquivel; Contrato No. 2200860 suscrito en SECOF	sí	CF08	\$	25.950.000	\$	41.032.910.187

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>				CÓDIGO:	F-GG-42
					VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>				VIGENCIA:	2020-10-24



MAI49	Pago 7,8 y 9 de 11 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Ing. Coordinador de zona 2	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20200730 - CDP 4381 - Guillermo Morales Melo; Contrato No. 2200869 suscrito en SECOPI	sí	CF08	\$	24.454.500	\$	41.008.455.687
MAI50	Pago 4,5 y 6 de 6 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Apoyo comunicaciones	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20201207-CDP 4644 Martha Patricia Pedraza López; Contrato No. 2201046 suscrito en SECOPI	sí	CF08	\$	15.150.000,0	\$	40.993.305.687
MAI51	Pago 4,5 y 6 de 6 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Gestor social 4	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20201211-CDP 4651 Ana Milena Quintero Agamez; Contrato No. 2201044 suscrito en SECOPI	sí	CF08	\$	20.550.000,0	\$	40.972.755.687
MAI52	Pago 4,5 y 6 de 6 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Gestor social 3	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20201207-CDP 4643 Luisa Fernanda Yañez Agudelo; Contrato No. 2201045 suscrito en SECOPI	sí	CF08	\$	20.550.000,0	\$	40.952.205.687
MAI53	Pago 4,5 y 6 de 6 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Gestor social 5	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20201211-CDP 4652 Diego Armando Chaves Chamorro; Contrato No. 2201060 suscrito en SECOPI	sí	CF08	\$	20.550.000,0	\$	40.931.655.687
MAI54	Pago 4,5 y 6 de 6 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Coordinador de zona 3	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20201211-CDP 4653 Diego Ignacio Gualteros Chavez; Contrato No. 2201099 suscrito en SECOPI	sí	CF08	\$	20.550.000,0	\$	40.911.105.687
MAI55	Pago 4,5 y 6 de 6 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Coordinador de zona 5	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20201211-CDP 4648 Alvaro Ernesto Sanchez Rosero; Contrato No. 2201091 suscrito en SECOPI	sí	CF08	\$	23.250.000,0	\$	40.887.855.687
MAI56	Pago 1,2 y 3 de 6 (Honorarios fijos) y Pago del 50% de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Coordinador de zona 2	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20210125-CDP3157 Oscar Javier Rodriguez Martinez; Contrato No.2210026 suscrito en SECOPI	sí	CF08	\$	29.775.974,0	\$	40.858.079.713
MAI57	Pago 1,2 y 3 de 6 (Honorarios fijos) - Contrato de prestación de servicios profesionales - Abogado	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20210125-CDP 3155 Diego Andres Jaramillo Ortiz ; Contrato No.2210027 suscrito en SECOPI	sí	CF08	\$	20.550.000,0	\$	40.837.529.713
MAI58	Pago 1,2 y 3 de 6 (Honorarios fijos) y Pago del 50% de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Ingeniero Apoyo	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20210204-CDP 3183 Omar Yesid Adame Cruz Ortiz ; Contrato No.2210052 suscrito en SECOPI	sí	CF08	\$	16.364.957,0	\$	40.821.164.756
MAI59	Pago 1,2 y 3 de 6 (Honorarios fijos) y Pago del 50% de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Tecnólogo SISO	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20210211-CDP 3198 Cristian Yesid Salcedo Ortiz ; Contrato No.2210053 suscrito en SECOPI	sí	CF08	\$	13.923.705,0	\$	40.807.241.051
MAI60	Pago 1,2 y 3 de 6 (Honorarios fijos) y Pago del 50% de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Coordinador de zona 1	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20210125-CDP 3156 Yeimy Tatiana Lopez Huertas ; Contrato No.2210093 suscrito en SECOPI	sí	CF08	\$	26.015.566,0	\$	40.781.225.485
MAI61	Pago 1,2 y 3 de 6 (Honorarios fijos) y Pago del 50% de la totalidad de Honorarios Variables - Contrato de prestación de servicios profesionales - Coordinador de zona 3	CDP, Contrato de prestación de servicios profesionales	20210310-CDP 3259 Ester Lucia Lemus Andrade ; Contrato No.2210126 suscrito en SECOPI	sí	CF08	\$	23.233.097,0	\$	40.757.992.388
MAI62	Pago GMF ejecutado a corte de febrero de 2021	N/A	GMF ejecutado a corte del mes de febrero de 2021, de acuerdo a los informes de ejecución financiera remitidos por el grupo de contabilidad de ENTerritorio.	sí	CF08	\$	1.341.165,5	\$	40.756.651.223
MAI63	Pago facturas FE 26336, 26338, 26339, 26341 y FE 30089, 30088, 30093 y 30094 (Suministro de Tiquetes aéreos)	CDP, Facturas Tiquetes	20200828 - CDP 4430 - Tiquetes Aéreos; Contratistas Ana Milena Quintero, Diego Chavez, Guillermo Morales y Omar Cruz	sí	CF08	\$	3.643.515,0	\$	40.753.007.708
Total autorizado						\$	2.840.612.572		6,52%

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Los montos correspondientes a pagos con cargo al MAI solicitado en los Comités Financieros 1 al 8 por valor de **\$ 2.840.612.572**, ingresaron a la cuenta del proyecto como “Aportes del Cliente” a corte del mes de abril de 2021 y representan una ejecución de 6.52%. De acuerdo con lo anterior, el saldo por aprobar en comités financieros es de **\$40.753.007.708** y representan el 93,48% del total de recursos para inversión establecidos contractualmente.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

### Ilustración 1. Avance Presupuestal

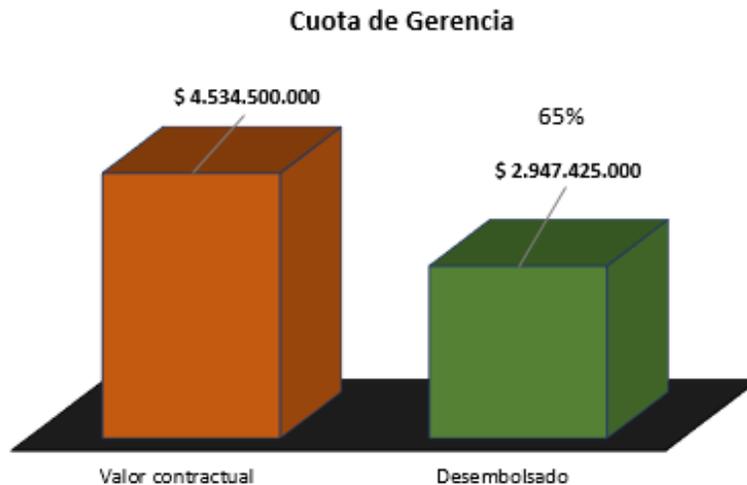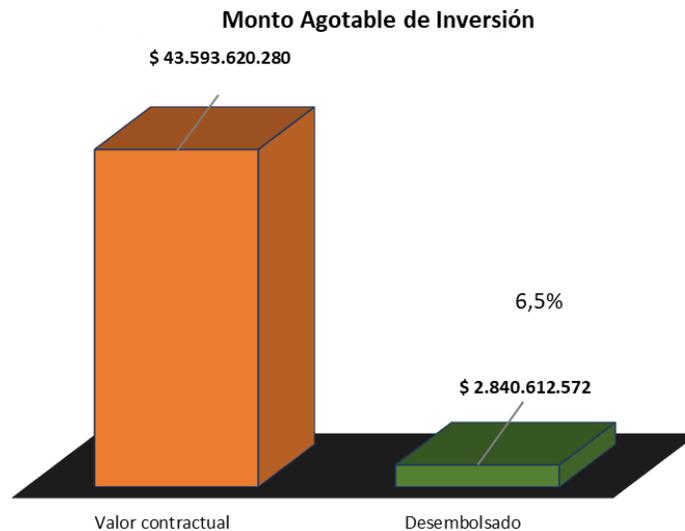

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP,2021.

### 2.5.3. Informes de ejecución financiera

Dando cumplimiento a la obligación contractual de acuerdo con la “CLAUSULA CUARTA, 2. *En cuanto a la administración de Recursos, numeral 5.*” Reportar por medio de un informe financiero mensual, los balances, movimientos y pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del contrato.” se adjunta Anexo 02- Informe Ejecución Financiera convenio 219143, con reporte a abril de 2021.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla 9 Estado ejecución financiera con corte a abril 2021**

Ítem	Concepto	Valor
1	Ingresos del cliente	\$ 5.788.037.571,00
2	Ejecución acumulada a marzo de 2021	\$ 3.165.322.798,94
3	Ejecución informe mes de abril 2021	\$ 341.821.453,95
4	Total, Ejecutado a abril 2021	\$ 3.507.144.252,89
5	Saldo por Ejecutar (1-4)	\$ 2.280.893.318,11

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP,2021.*

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

### 3. Informe técnico

Según se comenta en la introducción del informe, esta sección presenta el estado de avance logrado durante el periodo para cada uno de los Programas (PGO II y PGO III), teniendo en cuenta los proyectos específicos, así como las eventuales dificultades que hayan surgido, y el tratamiento integral adoptado por las partes.

Por facilidad, la sección se construye bajo una aproximación temática, basada en las especialidades de los profesionales integrantes de la GIP, a su vez, determinantes de las áreas del conocimiento principales del proyecto.

Durante el mes (mayo de 2021), las actividades técnicas del proyecto giraron en torno, fundamentalmente, a dar continuidad a la inclusión de insumos para PGO III, continuar reuniones institucionales con los entes territoriales, teniendo en cuenta los aspectos de ingeniería, gestión social e institucional. Adicionalmente, se continuó la realización de actividades orientadas a la gestión contractual en cuanto a los procesos de selección para las obras de PGO II y los diseños de PGO III. Adicionalmente, se produjeron piezas audiovisuales y boletines informativos de avance, continuaron las gestiones para el proyecto y se revisaron los mecanismos de control financiero para el seguimiento a la ejecución de los recursos. Las actividades se asignan al área temática responsable de su coordinación; implicando el trabajo transversal entre las áreas de la GIP.

A continuación, se incluye un apartado de revisión y comentarios sobre de la programación del proyecto a la luz de los avances alcanzados, y las siguientes secciones desarrollan las actividades ejecutadas en el periodo.


#### 3.1. Programación del proyecto

A efectos de monitorear el desarrollo de las actividades programadas, se presenta en seguida la programación vigente del proyecto.

A efectos de monitorear el desarrollo de las actividades programadas, se presenta en seguida la programación vigente del proyecto, junto con la segunda reprogramación planteada a la ANSV en el mes de enero del 2021.

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

Figura 1. Cronograma del proyecto vigente

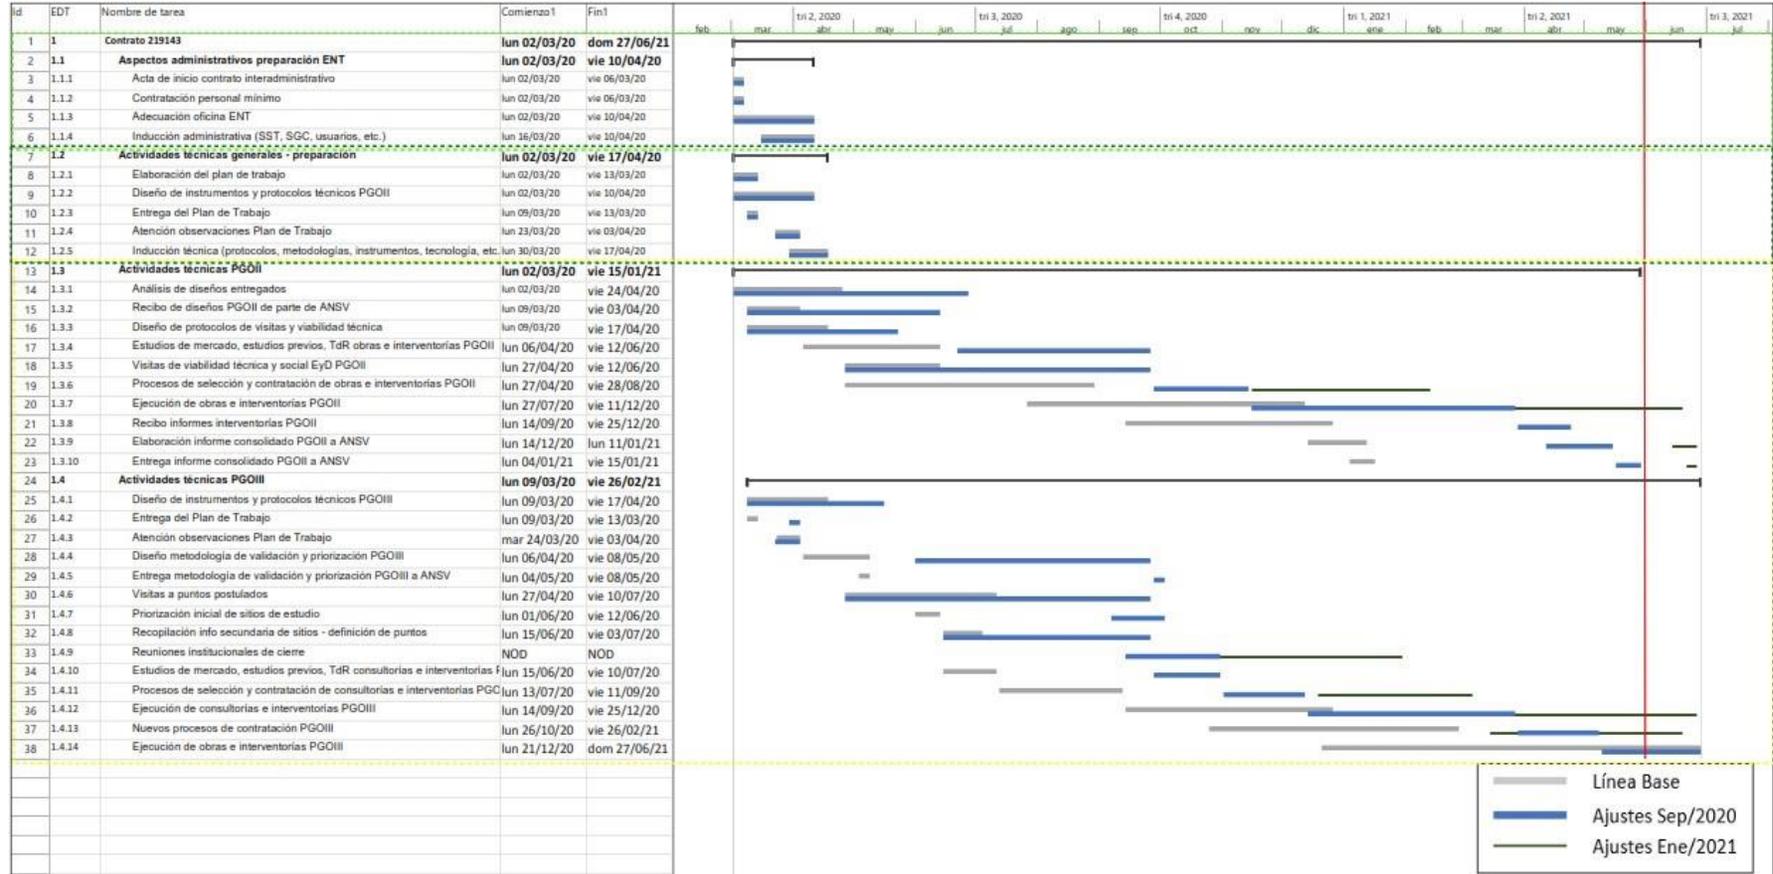

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

\*Las actividades en azul claro corresponden a las actividades programadas y aprobadas y las barras en azul oscuro a la propuesta de reprogramación. La programación del proyecto se divide en cuatro (4) grandes bloques de actividades: 1) Aspectos administrativos iniciales (terminado, línea punteada verde); 2) Preparación técnica (terminada, línea punteada verde); 3) Actividades de PGO II, y 4) Actividades de PGO III. Las secciones siguientes se concentrarán en las actividades de los numerales (3) y (4) de la presente programación (ver actividades del recuadro en línea punteada amarilla), presentando comentarios relativos a su avance.

### 3.1.1. Comentarios generales sobre el avance

El cronograma con respecto al Plan de Trabajo aprobado se ha retroalimentado y conciliado con la ANSV, en dos oportunidades, el día 3 de septiembre de 2020 en reunión de seguimiento RS-23, y el 28 de enero de 2021 en reunión de seguimiento RS-45, esta última retroalimentación se muestra en la Figura 1, y se modificó desde las actividades de proceso de selección de PGO II y PGO III, en adelante.

Las principales consideraciones sobre el avance en las actividades técnicas de PGO II (Actividades del bloque 3 de la programación) son:

- El análisis de diseños PGO II (3.1) se extendió durante todo mayo de 2020, y se terminó en junio de 2020, exceptuando los tres diseños de PGOII para la ciudad de Bogotá. Se desarrolló en simultánea con las visitas virtuales (3.5), que demandaron tiempo mayor al previsto, dada la necesidad de formular los protocolos, probarlos, estabilizar su implementación con las entidades territoriales y realizar los análisis del material recaudado en formatos de visita técnica. Así mismo, se experimentaron consumos de tiempo importantes en la respuesta de las entidades territoriales, tarea que demandó la formulación y envío de comunicaciones de refuerzo de segunda y tercera ronda, y la programación de espacios de capacitación (adicional a los protocolos) dirigidos a los delegados técnicos de las entidades territoriales encargados de apoyar las visitas virtuales.
- Los mayores consumos de tiempo en las actividades anteriores (3.1, y 3.5) causaron desviaciones en tiempo para la actividad 3.4 “Estudios de mercado, estudios previos, TdR obras e interventorías PGOII”, que inicialmente se estimaba iniciar en abril e inició en mayo de 2020. Para esta actividad se logró obtener la respuesta a la invitación a cotización para el estudio de precios de mercado, el 14 de agosto de 2020.
- Los protocolos técnicos (3.3) requeridos como respuesta a la coyuntura de salud pública (que inició en marzo de 2020) permitieron el inicio de visitas de viabilidad técnica y social (3.5) en mayo de 2020, como estaba previsto, visitas que finalizaron en los primeros días del mes de octubre de 2020; se esperaban mejores rendimientos, sin embargo, los tiempos de respuesta de las entidades territoriales, y la calidad de información que éstas remitían al equipo de trabajo extendido de la ANSV y ENTerritorio, hicieron necesario replantear la forma como se estaban realizando las visitas, debido al alto consumo de tiempo experimentado. En cada Comité Técnico se hizo seguimiento al progreso de las visitas, en los componentes de Ingeniería y Gestión Social.
- Las situaciones descritas impactaron en el inicio de los procesos de selección y contratación de obras de PGO II (3.6), inicialmente previsto para junio de 2020. Esta actividad inició en el mes de septiembre de 2020, con la mesa de trabajo, de los Estudios Previos para la “Implementación de las medidas de seguridad vial diseñadas con el Programa Pequeñas Grandes Obras PGO II”, la cual se llevó a cabo el día 29 de septiembre de 2020; el día 9 de octubre de 2020, se radicaron los estudios previos, al interior de ENTerritorio; luego se publicaron oficialmente las reglas de participación por parte de ENTerritorio, el día 26 de noviembre. El día 14 de diciembre los oferentes presentaron ofertas a ENTerritorio. El día 20 de enero de 2021 se publicó el acta de

selección de oferentes. En el mes de febrero de 2021 los oferentes seleccionados suscribieron los contratos y realizaron los aportes de garantías. En el mes de marzo de 2021, los contratistas de las siete zonas firmaron las actas de inicio y los contratos entraron en estado “en ejecución” por cuatro meses y medio. En cuanto a la Interventoría de PGO II, el día 5 de octubre de 2020, se llevó a cabo la mesa de trabajo, de los Estudios Previos para “Interventoría para implementación de las medidas de seguridad vial diseñadas con el programa pequeñas grandes obras PGO II”, y el día 23 de octubre de 2020, se radicaron los estudios previos, al interior de ENTerritorio, a los cuales, en el mes de noviembre, se les continuó la revisión. El día 15 de diciembre se publicaron oficialmente las reglas de participación por parte de ENTerritorio; el 24 de diciembre de 2020 los oferentes presentaron las ofertas. El 25 de enero de 2021 se publicó el acta de selección de oferentes. En el mes de febrero de 2021 se adelantó desde el área de Procesos de Selección la elaboración a través de la plataforma SECOP II de los contratos del programa PGO II Obra e Interventoría, los cuales quedaron debidamente perfeccionados y con la respectiva aprobación de las garantías requeridas para la ejecución. En el mes de marzo de 2021, las tres interventorías firmaron actas de inicio y los contratos entraron en estado “en ejecución” por cuatro meses y medio.

- Dado lo anterior, en el mes de marzo de 2021 se dio inicio la actividad 3.7 “Ejecución de obras e interventorías PGOII”.

En cuanto a las actividades técnicas de PGO III (Actividades del bloque 4 de la programación):

- Por cuenta de las restricciones y el manejo de la crisis asociada al COVID-19, el “Diseño de instrumentos y protocolos técnicos PGOIII” (4.1) se prolongó durante todo mayo de 2020, y demanda permanente retroalimentación, en función de los resultados y rendimientos que se van obteniendo. Por ejemplo, durante el mes de julio de 2020 fue necesario introducir hitos de control adicionales en las comunicaciones de la ANSV y ENTerritorio con las entidades territoriales, los cuales fueron implementados durante el mes de agosto de 2020.
- En el mes de septiembre de 2020, se concluyó la “metodología de validación y priorización PGOIII” (4.4), la cual de acuerdo con las mesas de trabajo realizadas entre ENTerritorio y la ANSV, se retroalimentó de los hallazgos puntuales en puntos postulados PGOIII, y se nutrió de las diversas experiencias con las entidades territoriales postulantes.
- Las visitas a los puntos postulados PGO III (4.6) iniciaron en mayo -como en PGO II-. Teniendo en cuenta la demora en tiempos de respuesta, de algunos entes territoriales, se complementaron las visitas virtuales que se estaban haciendo, con el inicio de visitas de manera presencial, esto teniendo en cuenta la apertura de movilización permitida por el Gobierno Nacional, en los lugares en donde el modelo virtual no pudo ser implementado. Sin embargo, similarmente a lo que ocurrió en PGO II, los rendimientos logrados - que absorbían los tiempos de respuesta de las entidades territoriales- vislumbraban que las visitas terminarían en el mes de diciembre de 2020, no obstante, por factores externos como el mal estado del tiempo, no se pudieron realizar visitas a los entes territoriales de San Andrés y Chocó, en el año 2020. En el mes de febrero de 2021, se pudieron realizar las visitas a los mencionados entes territoriales, finalizando la totalidad de visitas para los puntos de PGO III.
- Las situaciones descritas impactaron en el inicio de los procesos de selección y contratación de diseños de PGO III (4.9). Aunque, de acuerdo con la retroalimentación que se realizó al cronograma, mencionada al inicio de este numeral, esta actividad se realizó acorde, en el mes octubre de 2020, e inició con la solicitud de la mesa de trabajo y la radicación del borrador de los Estudios Previos para la “Contratación de la elaboración de los diseños de las medidas de seguridad vial para los puntos priorizados dentro del Programa Pequeñas Grandes Obras PGO III, en tres zonas del país.”, el día 30 de octubre de 2020. Después de las revisiones conjuntas realizadas y de atender las observaciones, se decidió subdividir el país en cuatro (4) zonas para la contratación de diseños de PGO III, y se radicaron en el área de Planeación Contractual los estudios previos definitivos, el día

26 de noviembre de 2020. El día 31 de diciembre de 2020 se publicaron oficialmente las reglas de participación de ENTerritorio. El día 13 de enero de 2021, los oferentes presentaron ofertas a ENTerritorio. El 4 de febrero de 2021 se publicó el acta de selección para las zonas 1 y 2; y declaratoria de fallido para las zonas 3 y 4. Para las zonas 1 y 2, en el mes de febrero de 2021 se perfeccionaron los contratos y se aprobaron las garantías requeridas. Para las zonas 3 y 4 se procedió a presentar de nuevo los documentos de caracterización ante las áreas de Planeación Contractual, y Procesos de Selección de ENTerritorio, para así publicar en página web de la entidad el día 25 de febrero de 2021, los documentos para el proceso de selección; en el mes de marzo de 2021 los oferentes presentaron propuestas para continuar con el proceso de selección para las zonas 3 y 4; para estas dos zonas el día 15 de abril de 2021 se expidió el acta de selección de oferentes seleccionados, los cuales firmaron contrato el día 21 de abril de 2021. En cuanto a la "Interventoría de la contratación de la elaboración de los diseños de las medidas de seguridad vial para los puntos priorizados dentro del Programa Pequeñas Grandes Obras PGO III", después de las revisiones conjuntas realizadas, se decidió dejar una (1) sola zona de Interventoría para todo el país, y se realizó la solicitud de la mesa de trabajo y la radicación del borrador de los estudios previos, al interior de ENTerritorio el día 30 de noviembre de 2020; el día 9 de diciembre de 2020 se radicaron los estudios previos al área de Planeación Contractual y el día 23 de diciembre de 2020 se radicaron los estudios previos definitivos al área de Procesos de Selección. El día 20 de enero de 2021, se presentó ofertas a ENTerritorio. El día 29 de enero de 2021, se publicó informe de recomendación de declaratoria de fallido. El 1 de febrero de 2021, se publicó el acta de declaratoria de fallida para la Interventoría, por lo que se procedió a presentar de nuevo los documentos de caracterización ante las áreas de Planeación Contractual, y Procesos de Selección de ENTerritorio, para así publicar en página web de la entidad el día 26 de febrero de 2021, los documentos para el proceso de selección. En el mes de marzo de 2021, los oferentes presentaron propuestas para la Interventoría de PGO III diseños; después de ser observadas por ENTerritorio, los oferentes no subsanaron y por medio de la publicación de acta del día 7 de abril de 2021 se declaró fallido el proceso, a lo que se procedió a presentar los documentos de caracterización ante el área de Planeación Contractual - Procesos de Selección; el día 4 de mayo de 2021 se publicó el proceso en Secop II; el día 14 de mayo de 2021 ocho oferentes presentaron propuestas, las cuales fueron observadas y se publicó el informe preliminar el día 31 de mayo de 2021, dando como resultado que los ocho oferentes debían subsanar debido a que tuvieron observaciones en los documentos presentados. De acuerdo con el cronograma de procesos, se espera que en el mes de junio de 2021 se publique el acta de selección con el oferente seleccionado.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

### 3.2. Área de Seguridad Vial

En el mes quince (**mayo de 2021**) se continuó con la apropiación de diseños de PGO II, etapa en la cual ENTerritorio cuenta un papel importante al realizar la revisión posterior a la aprobación de la Interventoría, verificando que se haya atendido lo registrado en el Anexo 2A (documento contractual que fue entregado al inicio de la contratación de obra PGO II, en el cual se hacían recomendaciones a tener en cuenta a los diseños de la etapa de PGO I) y garantizando que se cumpliera con los estándares que garanticen la seguridad vial.

También se realizó capacitación de refuerzo de seguridad vial para el personal de los contratistas e interventorías del programa PGO II.

A continuación, se amplía la información:

#### 3.2.1. Apropiación de diseños de los puntos PGO II

Se realizó la revisión de apropiación de los diseños de PGO II, con la verificación de ajustes de los planos de acuerdo a lo plasmado en el anexo 2A, así como los cambios en las condiciones actuales de las vías a intervenir, verificando que los diseños sean vigentes, idóneos y garanticen la seguridad vial, el producto de los diseños con estos ajustes y con los complementos necesarios del proceso de apropiación se lleva a presentación a las administraciones de las entidades territoriales en compañía de los contratistas, interventoría, la ANSV y ENTerritorio para concertar los ajustes en los planos. Las reuniones de apropiación han sido en los siguientes municipios:

**Tabla 10 Reuniones de apropiación adelantadas para los puntos de PGO II**

Interventoría	Zona	Contrato		Municipio	Fecha de Reunión de Apropiación	Punto por municipio
Grupo Centro 1	Z03	2210021	Central	Tunja	28/04/2021	2
				Duitama	6/05/2021	3
				Sogamoso	19/05/2021 - 20/05/21	5
	Z04	2210022	Santanderes 1	Bucaramanga	16/04/2021	4
	Z06	2210024	Santanderes 2	Barrancabermeja	20/04/2021	6
Grupo 2 Sur	Z07	2210025		Acacias	4/05/2021	2
Grupo 3 Norte	Z02	2210020	Caribe	Valledupar	23/04/21 - 26/04/21 - 27/05/21 - 28/05/21	6
	Z05	2210023	Eje Cafetero y Antioquia	Medellín	27/04/2021	5

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

En estas reuniones se da aval por parte de ANSV y visto bueno de por parte de la Entidad Territorial y ENTerritorio a los diseños apropiados por el contratista, los cuales ya estaban aprobados por la Interventoría, y se aprueba con ello el inicio de las obras correspondientes, una vez surtidos los demás requisitos contractuales, a fecha de corte de este informe se adelantaron reuniones con 8 municipios y 33 diseños apropiados (sin embargo uno del municipio de Acacias requiere de un ajuste del planteamiento en el plano y uno de Sogamoso que está pendiente realizarse visita conjunta al punto para evaluar el comportamiento el 4 de junio de 2021).

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

### 3.2.2. Capacitación Seguridad Vial

Teniendo en cuenta el objetivo principal del programa pequeñas grandes obras, el cual hace referencia a un proyecto de seguridad vial que busca mitigar el riesgo de siniestralidad vial en puntos críticos postulados por los diferentes ente territoriales, desde la Gerencia Integral del Proyecto se realizó una capacitación en seguridad Vial para todo el personal de los contratistas e interventores del programa PGO II, en donde se incluyeron las diferentes áreas que hacen parte del programa: social, ambiental, SST, tránsito y seguridad vial, entre otros. A esta capacitación asistieron más de 50 personas de todos los grupos 1, 2 y 3 (interventorías) para las siete zonas del programa PGO II.

Dentro de la capacitación se reforzó y recordó el objetivo principal del programa el cual no es llevar señalización a los municipios, sino mitigar y reducir las problemáticas de riesgo de siniestralidad vial, para prevenir así la pérdida de vidas en incidentes viales.

Así mismo se tocaron temas relacionados con las funciones específicas de los diferentes profesionales en el diseño, presentación e implementación de los diferentes planes de manejo de tránsito, así como la correcta implementación de los dispositivos que sean aprobados por los diferentes entes territoriales.

De igual forma se recordó la importancia de los Planes estratégicos de seguridad vial para cada una de las empresas presentes, los contenidos mínimos, los pilares en los que se deben desarrollar y sus diferentes objetivos.

En el enfoque específico de la capacitación se dio una apertura a la visión cero y la ética profesional desde la cual se debe abarcar partiendo de la primicia en la cual ninguna muerte en el tránsito es aceptable, TODAS son evitables. Allí se explicaron los cuatro aspectos desde los cuales se aborda la visión cero: ética, Responsabilidad, Seguridad y Mecanismos para cambio. Se mencionaron aspectos generales del trabajo de la seguridad vial, cómo se trabajaban desde el enfoque tradicional y cómo se enfocan ahora desde la visión cero.

Por otro lado, se trabajó una dinámica con la cual se busca que las personas presentes dimensionen la problemática de la inseguridad vial a nivel mundial y a nivel nacional, presentando las estadísticas mundiales y nacionales de muertes por siniestros viales y la distribución de los diferentes actores viales, contrastando los porcentajes mundiales y nacionales.

Con estas primicias se explican entonces, las principales herramientas que desde el programa se tienen, para mitigar los riesgos, lesiones y muertes por siniestros viales. Allí se menciona la importancia de la infraestructura y la señalización para brindar un sistema seguro a los diferentes actores viales partiendo de las principales causas desde la infraestructura, que afectan la siniestralidad. De esta forma se brindan las diferentes fuentes de información que se pueden consultar para el diseño de infraestructura segura, partiendo del hecho que la gestión de la velocidad es la principal herramienta para disminuir el riesgo de muertes y lesiones en los tramos viales y puntos críticos, de esta forma se dan ejemplos de diferentes opciones de diseño desde la perspectiva de diez principios para los desplazamientos seguros.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

### 3.3. Área de Tránsito

#### 3.3.1. Ejecución de actividades para evaluación de impactos

Teniendo en cuenta la necesidad de caracterizar la línea base para la evaluación de impactos en los puntos PGO II seleccionados como representativos, los cuales fueron enunciados en el informe del mes pasado, se realizó por parte del equipo técnico de la GIP la toma de información desde el componente técnico que posteriormente permita a través del procesamiento, la definición de la línea base requerida para determinar los impactos que se generan en la comunidad una vez implementadas las medidas de seguridad vial diseñadas.

Entre el 19 y el 30 de abril de 2021 se tomó información para catorce puntos en los municipios de Neiva, Medellín, Bucaramanga y Barrancabermeja los cuales ya fueron enunciados en el informe pasado.

Para el presente informe, entre el 03 y el 06 de mayo de 2021 se tomó la información primaria en el municipio de Pasto conforme el contenido de la Tabla 11.

**Tabla 11 Puntos de muestra de evaluación de impactos municipio de Pasto**

ID DEL PUNTO	DIRECCIÓN	TOMA INFORMACIÓN CÁMARA				TOMA INFORMACIÓN DE VELOCIDADES					
		PUNTO	FECHA	HORARIO	CANT. HORAS REALES	CANTIDAD DE HORAS INICIALES PROPUESTAS	PUNTO	FECHA	HORARIO	CANT. HORAS REALES	CANT. HORAS PROPUESTAS INICIALES
52001-001	Calle 17 con Carrera 11	Carrera 11 entre calle 17 y 18	5/05/2021	6:20 - 17:00	10,6	12	<a href="#">Carrera 11 calle 16a y calle 18</a>	5/05/2021	6:50 - 10:50	4	2
		Carrera 11 con calle 16a		06:30 - 17:00	10,5						
52001-002	Calle 12 entre Carrera 4 y Carrera 14	Calle 12 - IE La Libertad	6/05/2021	8:50 - 18:10	9,3	10	<a href="#">Calle 12</a>	6/05/2021	9:00 - 12:00	8	4
		Calle 12 con carrera 6 San Juan de Pasto		8:30 - 18:20	9,8				12:00 14:00 / 15:00 - 18:00		
52001-003	Carrera 24 con Calle 22	Carrera 24 con calle 22	3/05/2021	6:15 - 18:20	12	28	<a href="#">Carrera 24 entre calle 22a y calle 2</a>	3/05/2021	6:00 - 9:00	5	2
		Carrera 24 con calle 22a		6:20 - 18:30	12,15				14:00 - 18:00		
52001-004	Calle 21 con Carrera 3B	Calle 21 con carrera 3b	4/05/2021	9:00 - 18:15	9,25	12	<a href="#">Calle 21 con carrera 3b</a>	4/05/2021	7:30 - 9:30	4	2
		Calle 21 con carrera 3		6:20 - 17:00	10,6				16:10 - 18:10		

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

A continuación, se presenta un extracto de las actividades desarrolladas en cada uno de los dieciocho (18) puntos a los cuales a la fecha se les ha tomado evaluación de impactos.

#### 3.3.1.1. Actividades desarrolladas en el Municipio de Neiva


Para el municipio de Neiva se tomó información en dos puntos:

- 41001-001 Avenida Max Duque Gómez entre glorieta Unicentro y Bosques de San Luis
- 41001-002 Avenida Inés García de Durán entre Glorieta Madre Tierra y Glorieta Terminal

Para los dos puntos se hicieron tomas de velocidades en períodos pico y valle, las velocidades serán procesadas y su análisis mostrado en el próximo período de informe mensual.

Los videos para análisis de conflictos solo se tomaron en Para el primer punto Avenida Max Duque, se tomó información de videos sobre tres puntos del corredor, en cada punto se tomaron videos de mínimo 10 horas. Además de ello, se tomaron velocidades en hora pico y hora valle sobre el corredor, los cuales están siendo objeto del correspondiente análisis.

**Ilustración 2 Punto 41001-001 corredor Avenida Max Duque con Carrera 25.**

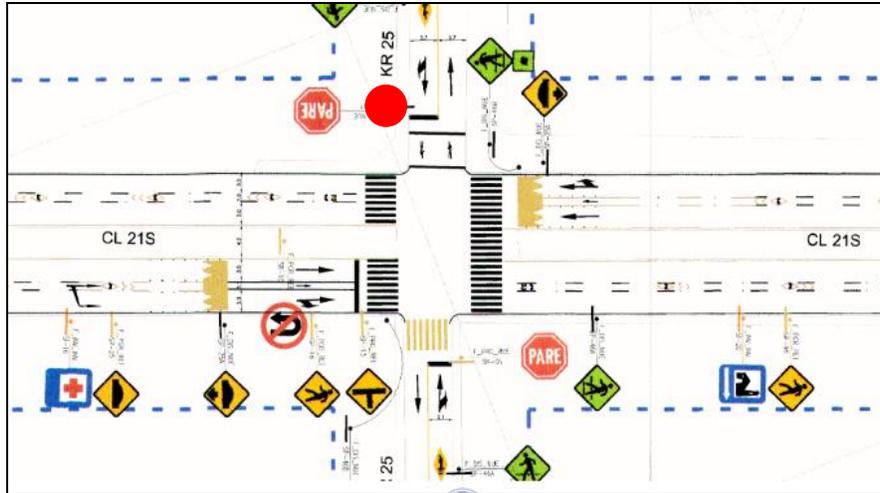

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Sobre este punto se ubicó la cámara para la toma de información en el costado Noroccidental de la intersección de la Carrera 25. Se observó que el punto presenta hitos importantes como la IPS Comfamiliar UIS del sur, y la plaza comercial Oasis Plaza.

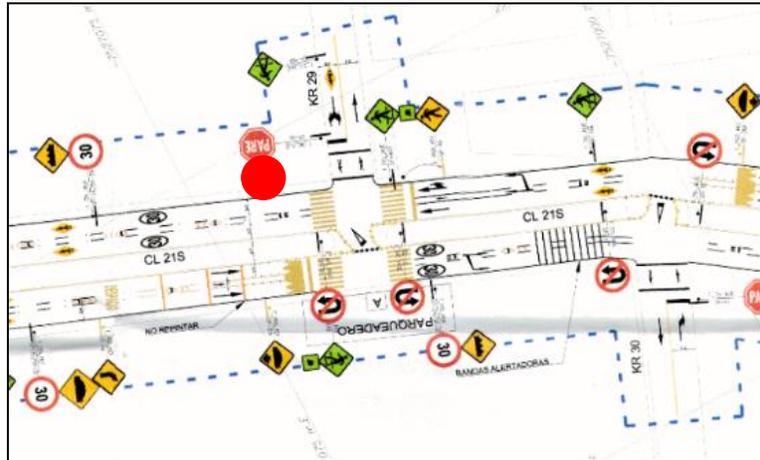
Dada la presencia de los sitios de aglomeración de público nombrados en el párrafo anterior, se presenta en este sitio presencia importante de moto taxis, situación que será revisada en el análisis de conflictos de este punto conforme a la metodología aprobada.

**Ilustración 3 Visual cámara Punto 41001-001 Avenida Max Duque con Carrera 25.**



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

La ubicación de la cámara permitió el registro de la totalidad de los movimientos en la intersección; en una revisión inicial de los videos se observa un volumen importante de motocicletas, la cantidad de movimientos permitidos en la intersección y la distribución geométrica de esta, hacen que se presenten movimientos inseguros desde el punto de vista seguridad vial, tales como contravía de las motos para realizar los giros izquierdos o para recoger usuarios del servicio de mototaxi.

**Ilustración 4 Punto 41001-001 corredor Avenida Max Duque con Carrera 29.**

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Este punto tiene una condición geométrica que no permite la visual total de la intersección desde ningún ángulo, por lo cual se ubicó la cámara en tres puntos diferentes por espacio de media jornada en cada uno de ellos. Así las cosas, se pudo apreciar la totalidad de los movimientos y conflictos en la intersección.

Esta intersección fue seleccionada para la toma de información ya que con la medida de seguridad vial a implementar se pretende restringir el movimiento Occidente – Norte, Occidente –Occidente y Oriente - Oriente. Así las cosas, se pretende evidenciar la mejora en la movilidad y conflictos en el punto una vez implementada la medida.

**Ilustración 5 Visual cámara Punto 41001-001 Avenida Max Duque con Carrera 29.**

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Uno de los principales inconvenientes que se presentan en el punto es la presencia de varios locales de frutas y verduras, droguería y restaurantes en el costado sur de la intersección, esto genera que, por el acceso o salida de estos puntos, se realicen maniobras peligrosas en la intersección como contravía sobre la Avenida Max Duque, también por el uso de estos locales comerciales, se realiza estacionamiento de vehículos sobre la Av Max Duque, generando disminución en la visibilidad en el punto.






**Ilustración 9 Visual cámara Punto 05001-003 Calle 30 con Carrera 52.**



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

En simultánea con la toma de información en este punto se registró la información del punto Calle 77 entre carrera 53 y carrera 64 donde se registraron volúmenes altos, en el sector. En el costado norte del punto se encuentran talleres de reparaciones y se realizan movimientos occidente norte en contravía tomando el retorno y la Calle 77 en contravía sobre la calzada norte, los usuarios han dañado la esquina norte del retorno para poder realizar las maniobras de contravía de manera más fácil.

**Ilustración 10 Punto 05001-006 Calle 77 entre carrera 53 y carrera 64**

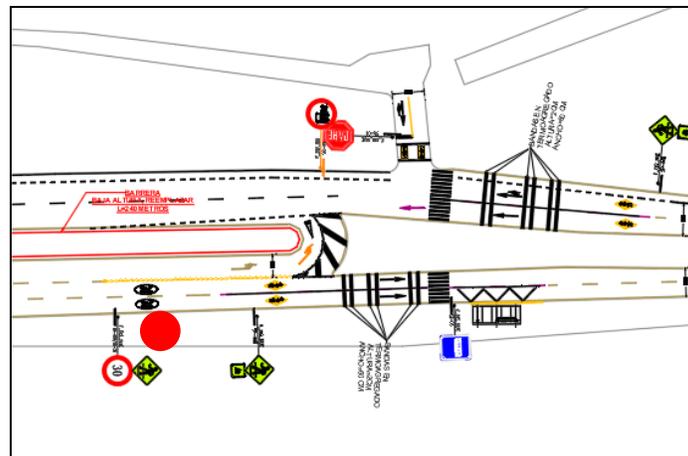

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Durante el desarrollo de estas actividades se evidenció también que las defensas metálicas están deterioradas y con una altura que no ejerce ninguna función de contención vehicular.

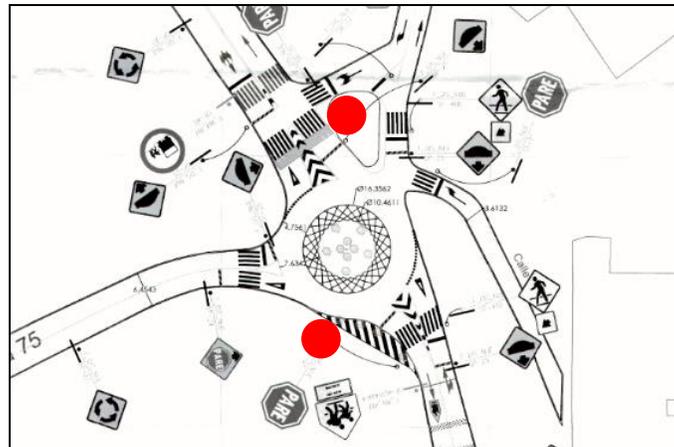
Dada la ubicación proporcionada a la cámara instalada, se recopilaron todos los movimientos en el sector y los conflictos relacionados con las contravía sobre la Calle 77.

**Ilustración 11 Visual cámara Punto 05001-006 Calle 77 entre carrera 53 y carrera 64**

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

En horas de la tarde se tomó información en la intersección de la Calle 65 con carrera 75, en este punto se pretende implementar una mini glorieta, dada la geometría que existe en este punto y los movimientos que se presentan ahí.

Dada la futura solución a implementar, se propuso la toma de información con dos cámaras para captar la totalidad de los movimientos en el punto.

**Ilustración 12 Punto 05001-005 Calle 65 con carrera 75**

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

En el sector se detectaron obras de intervención y demarcación existente que debe ser borrada antes de dar paso a la nueva implementación.

**Ilustración 13 Visual cámara Punto 05001-005 Calle 65 con carrera 75**

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.


**3.3.1.3. Actividades desarrolladas en el Municipio de Bucaramanga**

Para el municipio de Bucaramanga se seleccionaron dado el impacto previsto en la comunidad una vez terminadas las intervenciones, los siguientes puntos:

- 68001-002 Av. Metropolitana entre carrera 2A y carrera 14
- 68001-003 Diagonal 15 entre calle 55 y calle 45
- 68001-004 Calle 34 16-19. Institución Educativa Las Américas

Para cada uno de estos puntos se tomaron informaciones de velocidad en el corredor y videos para revisión de conflictos, los cuales funcionarán para aplicar la línea base de la metodología aprobada para ello.

Las actividades se iniciaron por el punto Av. Metropolitana entre carrera 2A y carrera 14 donde se pretende verificar el comportamiento de la medida propuesta, para este punto se pretende establecer la línea base para las defensas metálicas que se implementarán en el punto.

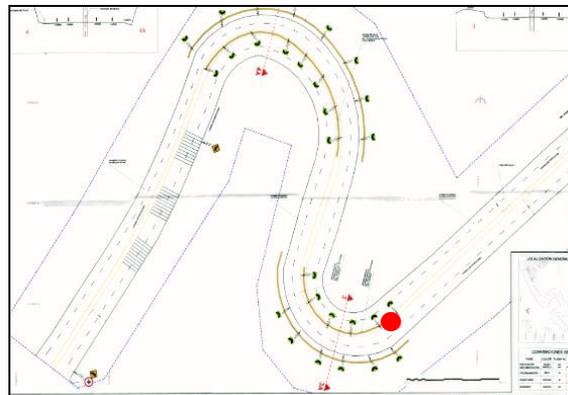**Ilustración 14 Punto 68001-002 Av. Metropolitana entre carrera 2A y carrera 14**


Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Este punto tiene la característica importante de contar con una curva horizontal y pendiente al tiempo en el punto, se están desarrollando obras en el sector para estabilización de taludes lo que genera desprendimiento de material granular fino que ocasiona accidentes como resbalones en las motocicletas.

**Ilustración 15 Visual cámara Punto 68001-002 Av. Metropolitana entre carrera 2A y carrera 14**

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

En este punto se presenta una alta presencia de motociclistas y transporte público. Se desarrollan altas velocidades especialmente en el sentido norte sur por ser la pendiente descendente. No se presenta presencia importante de peatones en el sector.

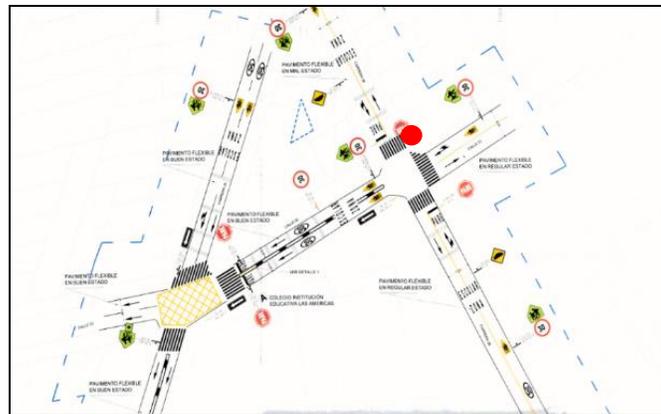**Ilustración 16 Punto 68001-004 Calle 34 16-19. Institución Educativa Las Américas**

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

En este punto existe además de la institución educativa, una biblioteca por lo que la cantidad de peatones es importante.

**Ilustración 17 Visual cámara Punto 68001-004 Calle 34 16-19. Institución Educativa Las Américas**




Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

En este punto no se desarrollan velocidades importantes debido a la presencia de un pompeyano en la esquina nororiental de la institución educativa y una intersección semaforizada en el costado sur oriental de la institución educativa en la esquina de la carrera 38 con calle 34.

Sobre este punto se realizaron tomas de video para análisis de impactos y tomas de velocidades, las cuales están siendo analizadas por parte del equipo técnico de la GIP.

El tercer punto analizado en la ciudad de Bucaramanga es el punto de la Diagonal 15 entre calle 55 y calle 45.

**Ilustración 18 68001-003 Diagonal 15 entre calle 55 y calle 45**

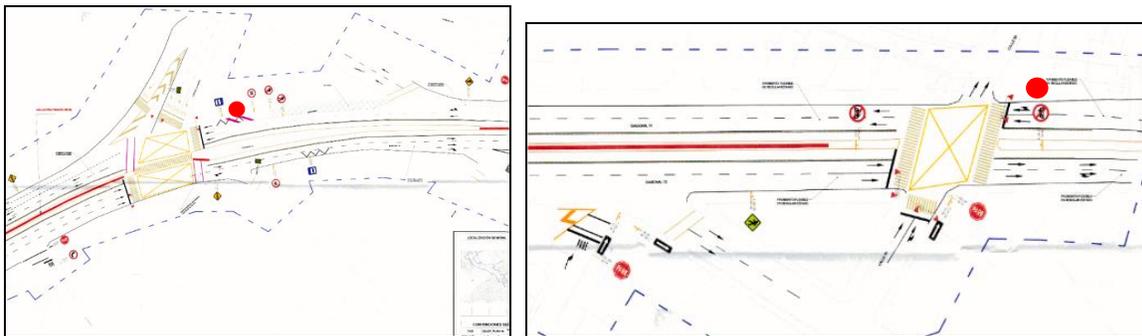

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Para este punto se ubicaron dos cámaras dada la longitud del corredor y los cambios de uso que se presentan a lo largo de este.

La primera cámara se ubicó en la Diagonal 15 en la intersección con la Avenida la Rosita, en este punto existe un importante cambio de uso de suelo entre la Calle 45 y la Avenida la Rosita se presenta una baja afluencia peatonal con presencia de pocos locales comerciales, a partir de la Avenida la Rosita hasta la Calle 55, se presentan talleres de motos, dos centros comerciales una parroquia y algunos otros hitos importantes que hacen que se genere una presencia importante de peatones en el sector.

**Ilustración 19 Visual cámara Punto 003 Diagonal 15 con Avenida la Rosita**

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Además de lo expuesto en el párrafo anterior, es importante mencionar que entre la Calle 45 y Av la Rosita, el volumen vehicular es menor, ya que el corredor con mayor volumen vehicular en el sector es la Avenida la Rosita, es decir que entre la Calle 55 y la Avenida la Rosita el volumen es superior con respecto al existente en la otra parte del corredor. Ya que por la Avenida la Rosita ingresan y salen la mayoría de los vehículos que se desplazan por la Diagonal 15.

**Ilustración 20 Visual cámara Punto 003 Diagonal 15 con Calle 55**

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

En este punto se concentra un grupo de moto-taxistas, quienes realizan maniobras altamente peligrosas ya que la Calle 55 es en un solo sentido de circulación y ellos se desplazan en contravía para desplazarse al sur de la ciudad. En el costado occidental de la intersección, se tiene la presencia de un centro comercial por lo que sobre la calle 55 se presenta un sitio no regulado de taxistas para recoger a los usuarios que salen del centro comercial, restringiendo la capacidad de la vía en el acceso de la intersección.

Sobre este corredor también se tomaron velocidades en horas pico y valle, las cuales se encuentran siendo procesadas por el equipo técnico de la GIP.

### 3.3.1.4. Actividades desarrolladas en el Municipio de Barrancabermeja

Para el municipio de Barrancabermeja se seleccionaron los siguientes puntos.


68081-004 Carrera 52, entre calles 31 y 27, Comuna 4, Colegio Real De Mares Y Colegio El Castillo.

68081-005 Diagonal 56 con calle 57 entre carreras 16A y 12 Comuna 2, Colegio Liceo Nueva Generación, Colegio Castillo Del Rey, Colegio Antonia Santos, Colegio José Antonio Galán.

68081-006 Carrera 28 entre calles 52 y 67, Comuna dos. Instituto Técnico Superior De Comercio, Universidad Industrial De Santander, Biblioteca Galvis Galvis.

En las tomas de información para estos puntos se determinó ubicar dos cámaras en cada uno de ellos dada la geometría de cada uno de ellos y los movimientos que se presentan.

#### Ilustración 21 Punto 68081-004 Colegio real de Mares

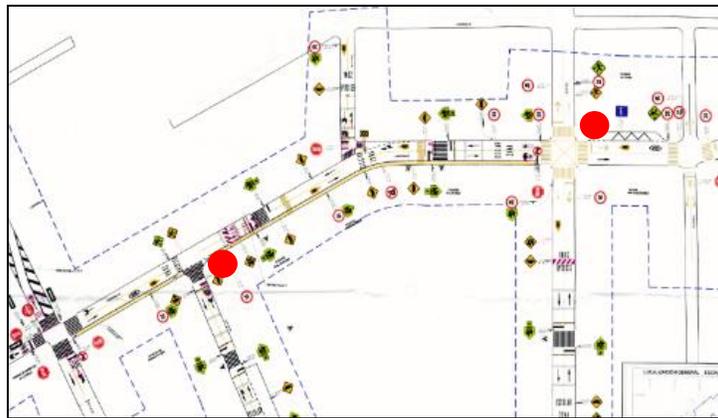

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

En el colegio real de mares se observó que en la esquina de la calle 30 existe una intersección semaforizada la cual no funciona desde el mes de enero de este año, esta situación genera accidentes ya que el volumen es alto y no hay prioridad definida para este punto.

#### Ilustración 22 Visual cámara Calle 30 Colegio real de Mares



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

En la ubicación de la carrera 52 con calle 28 se observa la futura ubicación del paso peatonal ampliado sobre la carrera 52, en la actualidad el espacio peatonal no es adecuado y la gente circula por la acera debido a la falta de continuidad y obstáculos sobre el andén.


### Ilustración 23 Visual cámara Calle 28 Colegio real de Mares



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Sobre el punto del colegio Nueva Generación se ubicaron dos cámaras, ambas sobre la diagonal 56, la primera en la bifurcación que existe en la Parroquia Divino salvador y la segunda en la carrera 15 B donde se implementará un cambio de sentido frente a la clínica Reina Lucía.

### Ilustración 24 Punto 68081-005 Liceo Nueva Generación

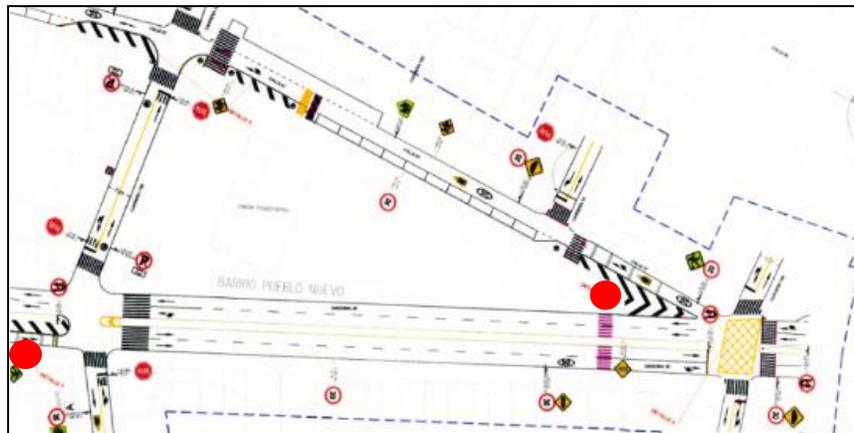

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

En el punto de la parroquia Divino Salvador, se ubicó la cámara para analizar los movimientos peatonales en la intersección.

**Ilustración 25 Visual cámara Diagonal 56 Parroquia Divino Salvador**

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

La segunda cámara sobre la Carrera 15 B se ubicó para analizar el flujo vehicular que hace el giro izquierdo de la diagonal 56 sobre la Carrera 15 B y el comportamiento del flujo vehicular sobre la Carrera 15B una vez implementado el cambio de sentido vial.


**Ilustración 26 Visual cámara Diagonal 56 sobre la Carrera 15B**

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

En este punto se observó que el volumen de vehículos que hacen el giro izquierdo de la Diagonal 56 sobre la Carrera 15 B es bajo, y solo lo hacen vehículos particulares, por lo que se considera que la modificación planteada funcionará de forma correcta.


Las actividades del tercer día se realizaron sobre el punto 68081-006 Carrera 28, en este punto se ubicaron también dos cámaras, la primera en la Carrera 28 con Calle 54. Vía sobre la cual se implementará cambio de sentido vial conforme a la solicitud del Ente Territorial; la segunda cámara se implementó en frente al hospital de Ecopetrol, ya que se implementará un achurado para restringir el ancho de apertura sobre el separador central y permitir los giros de forma exclusiva para las ambulancias.

**Ilustración 27 Punto 68081-006 Carrera 28 Calle 54**

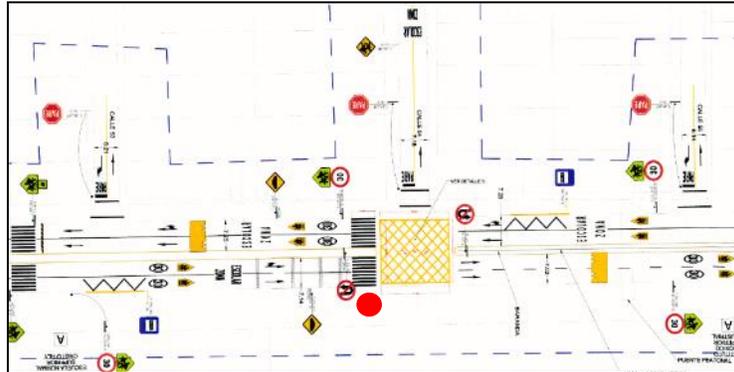

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

**Ilustración 28 Punto 68081-006 Carrera 28 Calle 56**

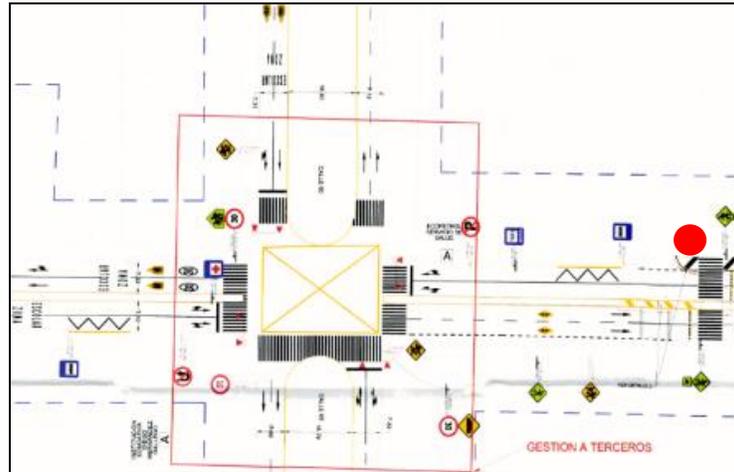

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Sobre el punto de la Carrera 28 con Calle 54 no se observa algún impacto relevante a tener en cuenta.

**Ilustración 29 Visual cámara Carrera 28 con Calle 54**



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Sobre el punto del acceso al hospital de Ecopetrol se observó que existen vehículos que son más grandes que los tipos ambulancia, los cuales deben hacer el giro izquierdo desde el sur para acceder al hospital, por esta razón, se hace necesario realizar un ajuste en la modelación del radio de giro para los vehículos de suministros del hospital.

**Ilustración 30 Visual cámara Carrera 28 frente al hospital de Ecopetrol**



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

**3.3.1.5. Actividades desarrolladas en el Municipio de Valledupar**


En el municipio de Valledupar, las actividades se desarrollaron en los siguientes puntos

- 20001-001 Calle 44 entre carreras 23 y 24 Institución Educativa Milciades Cantillo Costa
- 20001-003 Calle 26 con carrera 20 - IED Rafael Valle Meza
- 20001-005 Glorieta calle 21 con carrera 7A

En estos puntos también se realizó toma de información de velocidad en el corredor y videos para revisión de conflictos, los cuales funcionarán para aplicar la línea base de la metodología aprobada para ello, se instalaron las cámaras como se muestra a continuación.

Para el punto 20001-001 Institución Educativa Milciades Cantillo Costa se ubicó una cámara de tal manera que se abarcaron la totalidad de los movimientos en el punto y el comportamiento peatonal.

**Ilustración 31 Punto 20001-001 Institución Educativa Milciades Cantillo Costa**

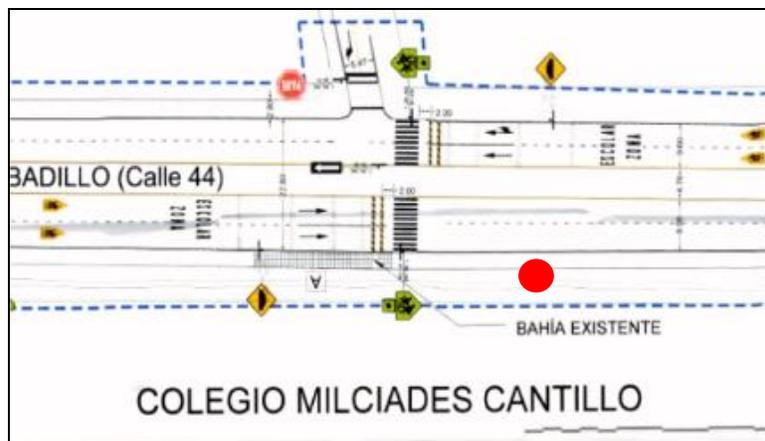

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Es un tramo sobre el cual se tiene un exceso de velocidad y la alta presencia de vehículos de transporte de carga; donde las brechas no son las más idóneas para realizar el cruce de peatones sobre todo por la presencia del Colegio, se puede inferir que, en unas condiciones típicas el conflicto entre actores se incrementará, lo cual lo hace más sensible a la ocurrencia de un siniestro vial.

### Ilustración 32 Visual cámara Colegio Milciades Cantillo



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

El segundo punto analizado es el de la IED Rafael Valle Meza; para esta IED se ubicaron dos cámaras de tal forma que se registren los movimientos peatonales en el sector para compararlos posteriormente.

### Ilustración 33 Punto 20001-003 Calle 26 con carrera 20 - IED Rafael Valle Meza



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Se pudo observar que este es un tramo sobre el cual se tiene el desarrollo de zona escolar con un uso de suelo principalmente de uso residencial, donde el volumen vehicular es bajo, se evidencia el exceso de velocidad sobre la carrera 20 y 19.


**Ilustración 34 Visual cámara IED Rafael valle Meza**



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Como último punto en el municipio de Valledupar se visitó el punto Glorieta calle 21 con carrera 7A, sobre este punto se ubicaron dos cámaras buscando capturar la totalidad de la información de los accesos y salidas de la glorieta.

**Ilustración 35 Punto 20001-005 Glorieta calle 21 con carrera 7A**

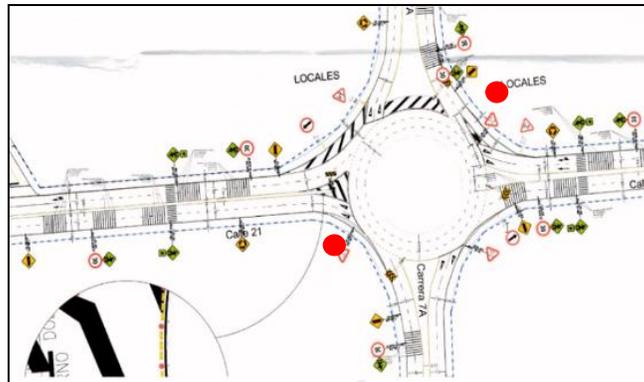

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

esta es una intersección sobre la cual se tiene un volumen considerable de vehículos, en donde se accede con una velocidad importante en sus diferentes ramales, este comportamiento está dado principalmente por las motocicletas. Adicionalmente, los vehículos que realizan el movimiento E-N es alto y se realizan comportamientos peligrosos, como maniobras de contravía por parte de las motos para realizar los movimientos en retorno.

**Ilustración 36 Visual cámara Glorieta Calle 21**



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

### 3.3.1.6. Actividades desarrolladas en el Municipio de Pasto


El municipio más reciente registrado en la toma de información para establecimiento de línea base de impactos, fue el municipio de Pasto.

En este municipio se tomó información de los siguientes puntos:

- 52001-001 Calle 17 con Carrera 11
- 52001-002 Calle 12 entre Carrera 4 y Carrera 14
- 52001-003 Carrera 24 con Calle 22
- 52001-004 Calle 21 con Carrera 3B

Para el punto de la Calle 17 con carrera 11, se estableció la implementación de dos cámaras, la primera en la Carrera 11 entre calle 17 y 18, la cual pretende establecer el comportamiento peatonal.

#### Ilustración 37 Punto 52001-001 Calle 17 con Carrera 11

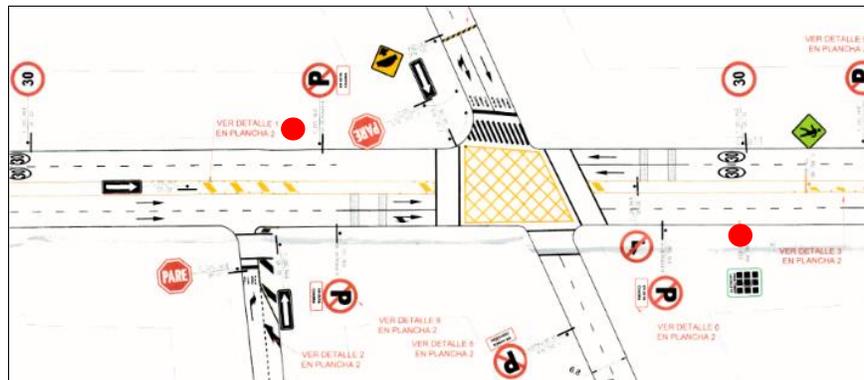

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

La segunda cámara ubicada en la Carrera 11 con Calle 16A pretende evidenciar el comportamiento de los vehículos que circulan por la calle 16A y pretenden tomar la Carrera 11 al occidente ya que este giro izquierdo será suprimido con la implementación de la medida.

#### Ilustración 38 Visual cámaras Carrera 11 con Calle 17




Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

En el sector se presenta una presencia importante de estacionamiento en vía lo que dificulta las maniobras sobre el tramo además de generar condiciones inseguras por la falta de visibilidad.

El segundo punto visitado fue el de la Calle 12 entre Carrera 4 y Carrera 14, sector categorizado como zonas escolares, con presencia de la IE La libertad con 1500 alumnos en dos jornadas con un acceso y salida de estudiantes. En otro sector del corredor se encuentra sobre la Calle 12 con Carrera 6 el IEM Centro de integración Popular.

Dado lo anterior, sobre este corredor se instalaron dos cámaras para registrar la información correspondiente.

### Ilustración 39 Punto 52001-002 Calle 12 IEM Libertad

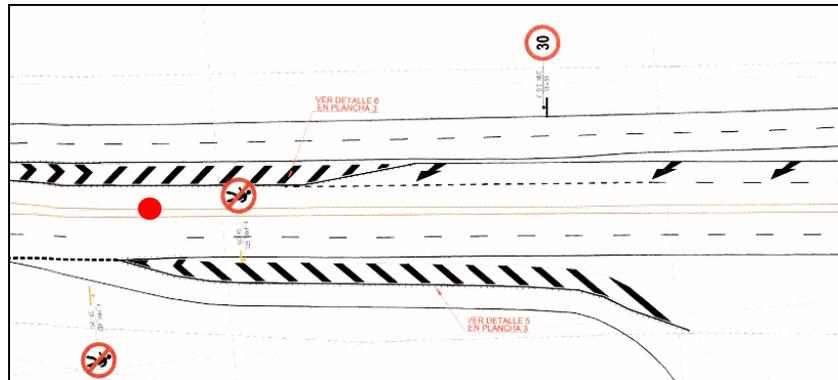

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Sobre este punto no existe un paso peatonal seguro para el cruce de los estudiantes sobre la Calle 12, justo frente a la salida de los estudiantes, existe un deprimido para conectar la Calle 9 con la Calle 12, por lo cual los estudiantes y peatones en general deben cruzar a riesgo sobre la Calle 12.


### Ilustración 40 Visual cámara Calle 12 IEM Libertad



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

La cámara 2 se ubicó con vista sobre la Carrera 6 con el fin de evidenciar el punto correcto para implementación del paso peatonal propuesto para peatones y estudiantes de la IE.

**Ilustración 41 Punto 52001-002 Calle 12 Carrera 6**

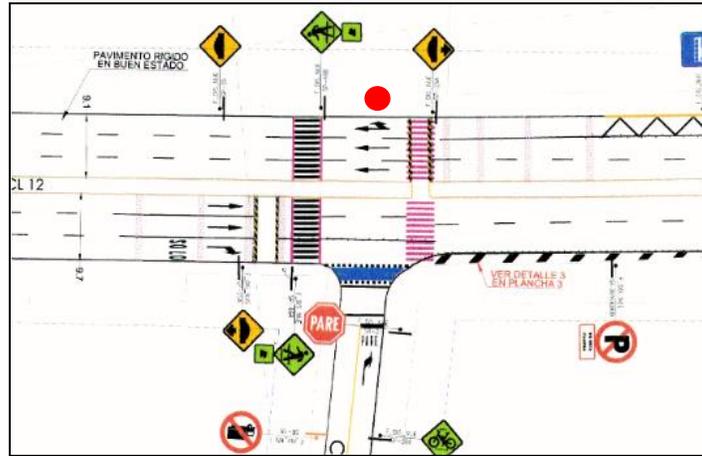

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Sobre el vado construido al norte de la Carrera 6, se propone el borrado del paso peatonal y la construcción de un nuevo paso peatonal en el costado sur de este punto. El análisis del comportamiento de peatones en este punto se analizará en el siguiente informe. Se observa que el vado construido es usado por un volumen importante de motocicletas poniendo en peligro a los peatones que usan el espacio.

**Ilustración 42 Visual cámara Calle 12 Carrera 6**



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

El tercer punto sobre el cual se tomó información es el punto de la Carrera 24 con Calle 22, conocido por la comunidad como el mercado de los dos puentes.

Dada la configuración geométrica del punto se decidió implementar dos cámaras para revisar el comportamiento de vehículos y peatones en el sector.



**Ilustración 45 Punto 52001-004 Calle 21 con Carrera 3B**



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Sobre este punto se observaron volúmenes peatonales y vehiculares bajos, se observa que los peatones no usan los andenes dada la pendiente que ellos tienen y la falta de continuidad para su uso.

**Ilustración 46 Visual cámaras Calle 21 con carrera 3B**



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

**3.3.2. Contraste de Georreferenciación PGO II y PGO III**

En este informe se presentan mapas temáticos de acuerdo con la información que se tiene por punto en PGO II suministrada por la interventoría de la zona. Para la presentación de este informe se cuenta con reportes de avance, pero el avance ha sido pausado en algunos puntos debido a la afectación por lluvias en los puntos de intervención.

Como se mencionó en el Informe 14, se plantean dos tipos de mapas, pero de acuerdo con el reporte de información en cuanto al avance de las obras, se evidencia un avance mínimo por lo cual a la fecha se generan únicamente mapas en los que se refleja el avance de una semana a la otra a través de histogramas evidencia.


En las ilustraciones 2 y 3 se evidencia el avance del punto 15001-002 desde la semana 1 que corresponde del 18 de mayo al 23 de mayo hasta la semana 2 que corresponde del 24 de mayo al 30 de mayo.

En la Ilustración 47 se evidencia el avance del punto 15001-002 desde la semana 1 que corresponde del 18 de mayo al 23 de mayo hasta la semana 2 que corresponde del 24 de mayo al 30 de mayo.

En la Ilustración 48 se evidencia el avance del punto 15001-003 desde la semana 1 que corresponde del 18 de mayo al 23 de mayo hasta la semana 2 que corresponde del 24 de mayo al 30 de mayo.


En la Ilustración 49 se evidencia el avance del punto 68001-001 desde la semana 1 que corresponde del 18 de mayo al 23 de mayo hasta la semana 2 que corresponde del 24 de mayo al 30 de mayo.

**Ilustración 47 Avance Obra 15001-002**

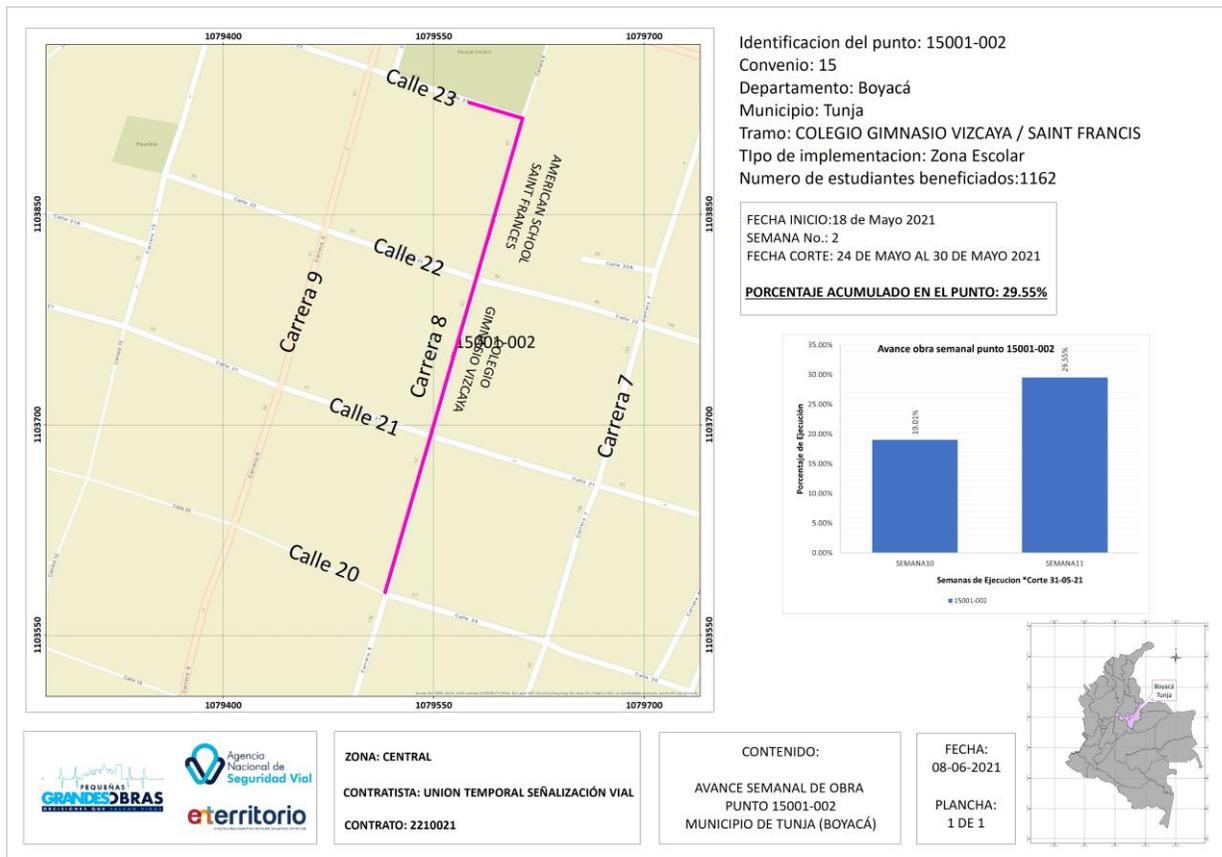


Fuente: Elaboración propia ENTerritorio-GIP, 2021

**Ilustración 48 Avance Obra punto 15001-003**

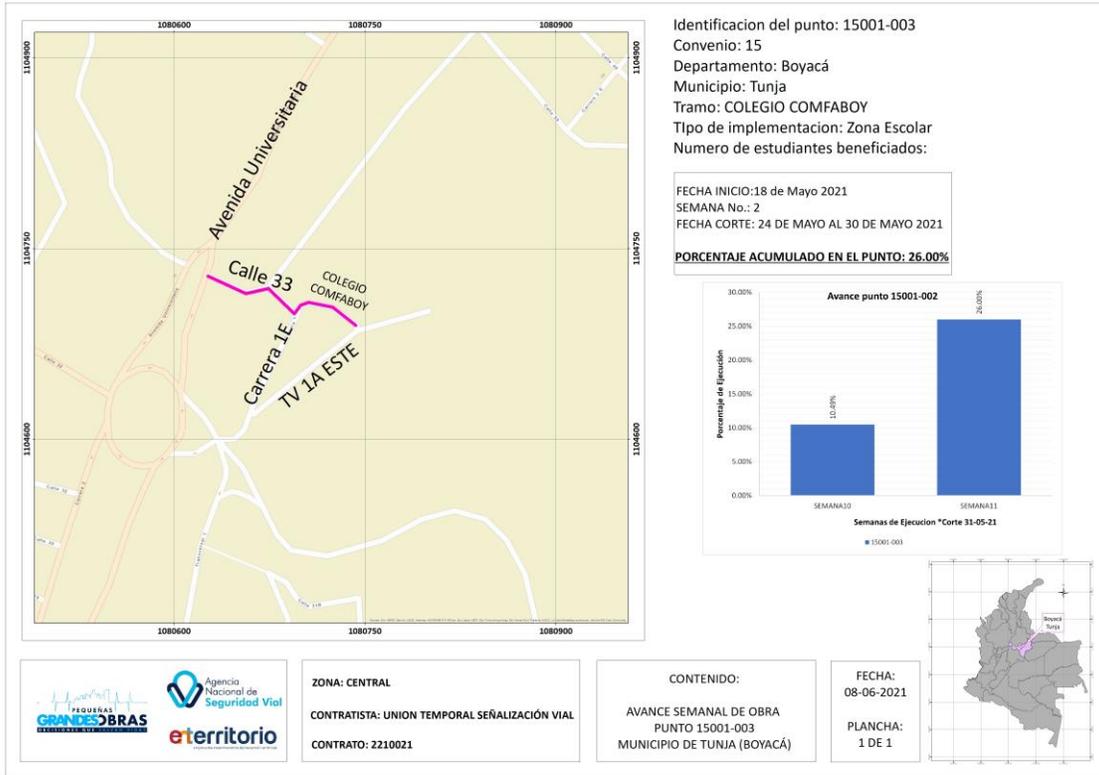

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021

**Ilustración 49 Avance Obra punto 68001-001**

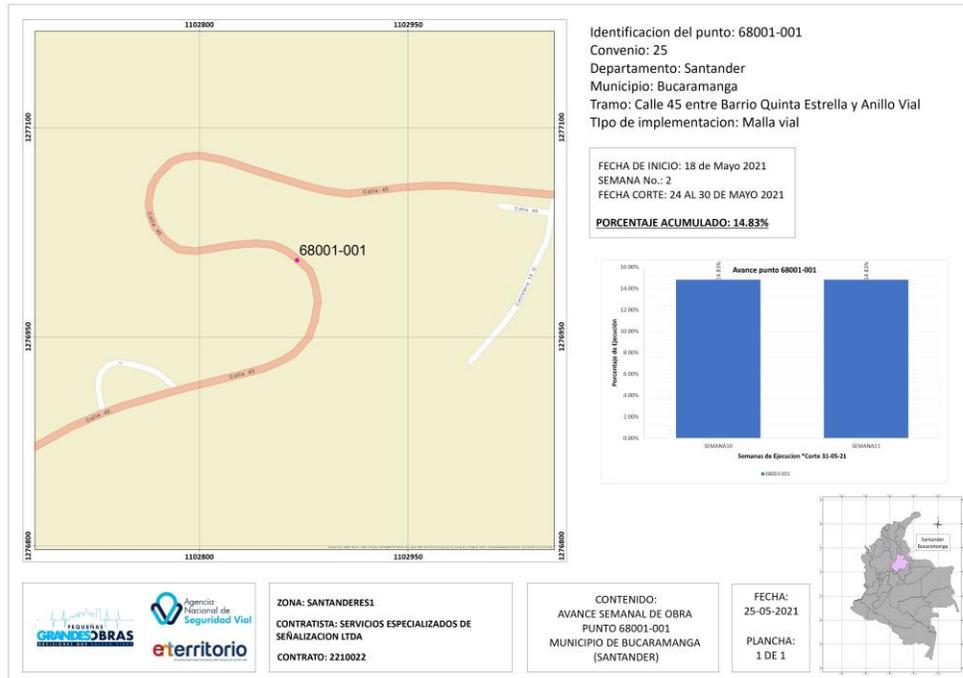

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

#### 4. PGO II

Durante el periodo del presente informe en el marco del contrato, para cada uno de los grupos se desarrollaron las siguientes actividades:

##### 4.1. Grupo 1

##### 4.1.1. Actividades e intervenciones

Durante el periodo del presente informe, se desarrollaron las siguientes actividades e intervenciones:

- **Apropiación y ejecución de diseños**

Previo a iniciar las actividades propias de implementación, es necesario realizar la apropiación de los diseños, esta apropiación consistirá en tomar los diseños aprobados en la fase PGO I para cada punto a intervenir y realizar el ajuste de los planos tomando como base el inventario actualizado existente en terreno y las características físicas que hayan sufrido cambios y/o modificaciones desde el momento de su aprobación, a continuación, se presenta el estado de este proceso:

**Tabla 12 Estado de apropiación y ejecución de diseños grupo 1**

Zona	Contrato	Municipio	Punto de Diseño	Estado de Apropiación	% Intervención
Z03	2210021	Tunja	15001-002	Aprobado	29,55%
			15001-003	Aprobado	26,00%
		Duitama	15238_001	Aprobado	0
			15238_002	Aprobado	0
			15238_003	Aprobado	0
		Sogamoso	15759_001	Aprobado	0
			15759_002	Observado por ente territorial	0
			15759_003	Aprobado	0
			15759_004	Aprobado	0
			15759_005	Aprobado	0
Z04	2210022	Bucaramanga	68001_001	Aprobado	14,83%
			68001_002	Aprobado	17,81%
			68001_003	Aprobado	1,14%
			68001_004	Aprobado	0
		Floridablanca	68276_002	Aprobado por interventoría	0
		Girón	68307_001	A espera de firma de convenio con ANSV para entrega de diseños a contratista.	0
			68307_002		0
			68307_003		0
Z06	2210024	Barrancabermeja	68081_001	Aprobado	0
			68081_002	Aprobado	18,50%
			68081_003	Aprobado	0
			68081_004	Aprobado	20,50%
			68081_005	Aprobado	0
			68081_006	Aprobado	1,2%

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

- **Recorridos e inspecciones realizadas**

No se realizaron recorridos durante el presente periodo.

- **Comités, reuniones y/o mesas de trabajo**

Como parte de los compromisos establecidos durante la ejecución del proyecto, se continuó con el desarrollo de los comités técnicos de obra semanales, los cuales son citados por la interventoría para el control de la ejecución del proyecto, el cual incluye el avance en este momento de los entregables y los compromisos asociados a la documentación previa al inicio de la implementación en campo:

**Tabla 13 Desarrollo de comités semanales PGO II – Grupo 1**

Grupo	Zona	Comité Semanal 7	Comité Semanal 8	Comité Semanal 9	Comité Semanal 10
1	3	06/05/2021	13/05/2021	20/05/2021	27/05/2021
	4	07/05/2021	14/05/2021	21/05/2021	28/05/2021
	6	07/05/2021	14/05/2021	21/05/2021	28/05/2021

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

- **Análisis de precios unitarios**

Durante el período reportado, no se han presentado para los contratos correspondientes a PGO II grupo 1; ítems no previstos, para revisar, aprobar o desaprobar los respectivos Análisis de Precios Unitarios – APU.

- **Comparación y fijación de precios no previstos**

A la fecha no se ha presentado actividades no previstas para realizar comparación y fijación de precios, en los para los contratos correspondientes a PGO II grupo 1.

#### 4.1.2. Estado de informes Mensuales

Contratista e interventoría realizaron presentación del 2 informe mensual, la relación y estado de los mismos se presenta a continuación:

**Tabla 14 Estado de informes mensuales de interventoría PGO II – Grupo 1**

Grupo	Zona	Contrato	Informe Mensual No	Periodo	Fecha de entrega	Fecha de emisión observaciones	Estado
1	Interventoría	2210030	2	11-04-2021 a 10-05-2021	18/05/2021	01/06/2021	Atendiendo Observaciones
1	Central	2210021	2	11-04-2021 a 10-05-2021	No entregado	NA	Atendiendo Observaciones
1	Santanderes 1	2210022	2	11-04-2021 a 10-05-2021	19/05/21	26/05/2021	Atendiendo Observaciones
1	Santanderes 2	2210034	2	11-04-2021 a 10-05-2021	19/05/2021	01/06/2021	Atendiendo Observaciones

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

#### 4.1.3. Ejecución de presupuestos

A continuación, se presenta el estado de ejecución de los contratos pertenecientes al grupo 1:

**Tabla 15 Estado de ejecución de presupuesto de interventoría PGO II – Grupo 1**


Grupo	Zona	Contrato	Valor ejecutado (\$)	Porcentaje (%)
1	Interventoría	2210030	\$ 97.118.470	17.78
1	Central	2210021	\$ 28.685.930	2.16
1	Santanderes 1	2210022	\$ 110.427.777	7.63
1	Santanderes2	2210034	\$ 75.018.068	6.0

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

#### 4.1.4. Registro Fotográfico

A continuación, se presenta registro fotográfico de la implementación de los diseños de los contratos pertenecientes al grupo 1:

**Ilustración 50 Registro fotográfico**

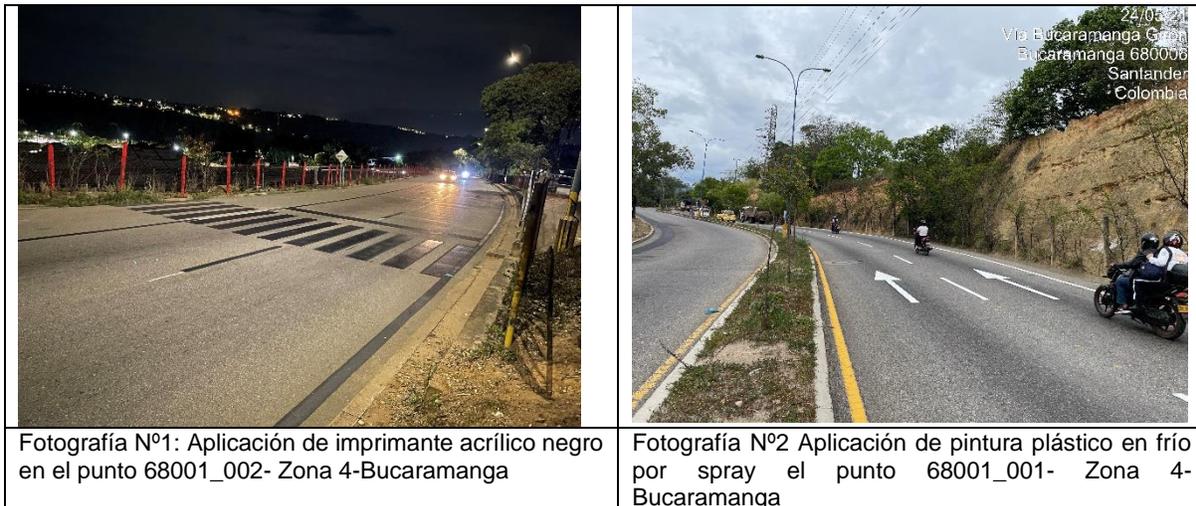



Fotografía N°3: Demarcación pasos peatonales en el punto 68001\_001- Zona 4-Bucaramanga



Fotografía N°4: Implementación señalización horizontal en el punto 68001\_001- Zona 4-Bucaramanga



Fotografía N° 5: Instalación de dispositivos reductores de velocidad en el punto 15001\_02-Zona 3-Tunja



Fotografía N° 6: Instalación de señales verticales en el punto 15001\_02-Zona 3-Tunja



Fotografía N°7: Demarcación señalización horizontal en el punto 15001\_03-Zona 3-Tunja



Fotografía N°8: Instalación de señales verticales en el punto 15001\_03-Zona 3-Tunja



Fotografía N°9: Demarcación señalización horizontal en el punto 68081\_04-Zona 6-Barrancabermeja



Fotografía N°10: Demarcación señalización horizontal en el punto 68081\_04-Zona 6-Barrancabermeja



Fotografía N°11: Demarcación señalización horizontal en el punto 68081\_02-Zona 6-Barrancabermeja



Fotografía N°12: Demarcación señalización horizontal en el punto 68081\_02-Zona 6-Barrancabermeja

#### 4.1.5. Conclusiones y logros

- A cada uno de los contratistas la interventoría solicitó un plan de contingencia en aras de recuperar el atraso presentado en cada contrato.
- Se presentaron afectaciones por bloqueos en las diferentes vías del país en el marco del paro nacional, lo que afectó el transporte de materiales y equipos a las diferentes zonas y ocasionado demoras en el inicio de las obras de acuerdo con lo que se tenía previsto.
- A la fecha los convenios con el municipio de Girón no se han suscrito con la ANSV, se requiere agilizar el proceso para iniciar el proceso de apropiación de los diseños en este ente territorial, pertenecientes a la zona 4 Santanderes 1.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

## 4.2. Grupo 2

### 4.2.1. Actividades e intervenciones

Durante el periodo del presente informe, se desarrollaron las siguientes actividades e intervenciones:

- **Apropiación y ejecución de diseños**

Previo a iniciar las actividades propias de implementación, es necesario realizar la apropiación de los diseños, esta apropiación consiste en tomar los diseños aprobados en la fase PGO I para cada punto a intervenir y realizar el ajuste de los planos, tomando como base el inventario actualizado existente en terreno y las características físicas que hayan sufrido cambios y/o modificaciones desde el momento de su aprobación, a continuación, se presenta el estado de este proceso:

**Tabla 16 Estado de apropiación y ejecución de diseños**

Zona	Contrato	Municipio	Punto de Diseño	Estado de Apropiación	% Intervención
Z01	2210019	Popayán	19001-001	Retirado por el Ente Territorial	0
			19001-002	Observado por ENTerritorio	0
			19001-003	Retirado por el Ente Territorial	0
			19001-004	Aprobado por ENTerritorio	0
			19001-005	En ajuste por contratista	0
			19001-006	Observado por ENTerritorio	0
			19001-007	Aprobado por ENTerritorio	0
		Pasto	52001-001	Observado por ENTerritorio	0
			52001-002	Observado por ENTerritorio	0
			52001-003	Observado por ENTerritorio	0
			52001-004	Aprobado por ENTerritorio	0
		Puerto Asís	86568-001	Aprobado por ENTerritorio	0
			86568-002	Observado por Interventoría	0
			86568-003	Aprobado por ENTerritorio	0
			86568-004	Observado por ENTerritorio	0
			86568-005	Aprobado por ENTerritorio	0
			86568-006	Aprobado por ENTerritorio	0
		Guadalajara de Buga	76111-001	Observado por ENTerritorio	0
		Z07	2210025	Acacias	50006-001
50006-002	Aprobado				0
Neiva	41001-001			Observado por ENTerritorio	0
	41001-002			Observado por ENTerritorio	0
	41001-008			En revisión por ENTerritorio	0

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

Zona	Contrato	Municipio	Punto de Diseño	Estado de Apropiación	% Intervención
			41001-009	En revisión por ENTerritorio	0
			41001-010	En revisión por ENTerritorio	0
		Pitalito	41551-001	En revisión por ENTerritorio	0
			41551-002	En revisión por ENTerritorio	0
			41551-003	En revisión por ENTerritorio	0
			41551-005	En revisión por ENTerritorio	0

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

- **Recorridos e inspecciones realizadas**

A la fecha aún no se cuenta con ejecución de obra en ninguna de las zonas para realizar recorridos y visitas de inspección temáticos que evidencien el avance de los contratos.

- **Comités, reuniones y/o mesas de trabajo**

Como parte de los compromisos establecidos durante la ejecución del proyecto, se continuó con el desarrollo de los comités técnicos de obra semanales, los cuales son citados por la interventoría para el control de la ejecución del proyecto, el cual incluye el avance en este momento de los entregables y los compromisos asociados a la documentación previa al inicio de la implementación en campo:

**Tabla 17 Desarrollo de comités semanales PGO II – Grupo 2**

Grupo	Nombre	Comité Semanal 6	Comité Semanal 7	Comité Semanal 8	Comité Semanal 9
2	Sur	05/05/2021	11/05/2021	18/05/2021	25/05/2021

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021

- **Análisis de precios unitarios**

Durante el período reportado, no se han presentado para los contratos correspondientes a PGO II grupo 2; ítems no previstos, para revisar, aprobar o desaprobar los respectivos Análisis de Precios Unitarios – APU.

- **Comparación y fijación de precios no previstos**

A la fecha no se ha presentado actividades no previstas para realizar comparación y fijación de precios, en los para los contratos correspondientes a PGO II grupo 2.

#### 4.2.2. Estado de informes interventoría

- **Informes interventoría:** Informes mensuales y semanales aprobados desde la supervisión a la interventoría e informes pendientes de aprobación.

**Tabla 18 Estado de informes mensuales de interventoría PGO II – Grupo 2 – ZO1**

Grupo	Zona	Contrato	Informe Mensual No	Período	Estado
2	Sur	2210031	1	Del 09 de marzo al 08 de abril de 2021	Observado por Supervisión
			2	Del 09 de abril al 08 de mayo de 2021	Pendiente de aprobación

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla 19 Estado de informes mensuales de interventoría PGO II – Grupo 2 – Z07**

Grupo	Zona	Contrato	Informe Mensual No	Período	Estado
2	Sur	2210031	1	Del 09 de marzo al 08 de abril de 2021	Observado por Supervisión
			2	Del 09 de abril al 08 de mayo de 2021	Pendiente de aprobación

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

**Tabla 20 Estado de informes semanales de interventoría PGO II – Grupo 2 – Z01**

Grupo	Zona	Contrato	Informe Semanal No	Período	Estado
2	Sur	2210031	1	Del 09 al 15 de marzo de 2021	Aprobado
			2	Del 16 al 22 de marzo de 2021	Aprobado
			3	Del 23 al 29 de marzo de 2021	Aprobado
			4	Del 30 de marzo al 05 de abril de 2021	Aprobado
			5	Del 06 al 12 de abril de 2021	Aprobado
			6	Del 13 al 19 de abril de 2021	Aprobado
			7	Del 20 al 26 de abril de 2021	Aprobado
			8	Del 27 de abril al 01 de mayo de 2021	Aprobado
			9	Del 02 al 08 de mayo de 2021	Aprobado
			10	Del 09 al 15 de mayo de 2021	Aprobado
			11	Del 16 al 22 de mayo de 2021	Aprobado
			12	Del 22 al 28 de mayo de 2021	Aprobado

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla 21 Estado de informes semanales de interventoría PGO II – Grupo 2 – Z07**

Grupo	Zona	Contrato	Informe Semanal No	Período	Estado
2	Sur	2210031	1	Del 09 al 15 de marzo de 2021	Aprobado
			2	Del 16 al 22 de marzo de 2021	Aprobado
			3	Del 23 al 29 de marzo de 2021	Aprobado
			4	Del 30 de marzo al 05 de abril de 2021	Aprobado
			5	Del 06 al 12 de abril de 2021	Aprobado
			6	Del 13 al 19 de abril de 2021	Aprobado
			7	Del 20 al 26 de abril de 2021	Aprobado
			8	Del 27 de abril al 01 de mayo de 2021	Aprobado
			9	Del 02 al 08 de mayo de 2021	Aprobado
			10	Del 09 al 15 de mayo de 2021	Aprobado
			11	Del 16 al 22 de mayo de 2021	Aprobado
			12	Del 22 al 28 de mayo de 2021	Aprobado

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

- **Informes de los contratistas:** Informes mensuales y semanales aprobados desde la interventoría a los contratistas e informes pendientes de aprobación.

**Tabla 22 Estado de informes mensuales contratistas PGO II – Grupo 2**

Zona	Contrato	Informe Mensual No	Período	Estado
Z01	2210019	1	Del 09 de marzo al 08 de abril de 2021	Aprobado
		2	Del 09 de abril al 10 de abril de 2021	Pendiente de aprobación
Z07	2210025	1	Del 09 de marzo al 08 de abril de 2021	Aprobado
		2	Del 09 de abril al 10 de abril de 2021	Pendiente de aprobación

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

**Tabla 23 Estado de informes semanales contratistas PGO II – Grupo 2**

Zona	Contrato	Informe Semanal No	Período	Estado
ZO1	2210019	1	Del 09 al 15 de marzo de 2021	Aprobado
		2	Del 16 al 22 de marzo de 2021	Aprobado
		3	Del 23 al 29 de marzo de 2021	Aprobado
		4	Del 30 de marzo al 05 de abril de 2021	Aprobado
		5	Del 06 al 12 de abril de 2021	Aprobado
		6	Del 13 al 19 de abril de 2021	Aprobado
		7	Del 20 al 26 de abril de 2021	Aprobado
		8	Del 27 de abril al 01 de mayo de 2021	Aprobado
		9	Del 02 al 08 de mayo de 2021	Aprobado
		10	Del 09 al 15 de mayo de 2021	Aprobado
		11	Del 16 al 22 de mayo de 2021	Aprobado
		12	Del 22 al 28 de mayo de 2021	Aprobado
ZO1	2210025	1	Del 09 al 15 de marzo de 2021	Aprobado
		2	Del 16 al 22 de marzo de 2021	Aprobado
		3	Del 23 al 29 de marzo de 2021	Aprobado
		4	Del 30 de marzo al 05 de abril de 2021	Aprobado
		5	Del 06 al 12 de abril de 2021	Aprobado
		6	Del 13 al 19 de abril de 2021	Aprobado
		7	Del 20 al 26 de abril de 2021	Aprobado
		8	Del 27 de abril al 01 de mayo de 2021	Aprobado
		9	Del 02 al 08 de mayo de 2021	Aprobado
		10	Del 09 al 15 de mayo de 2021	Aprobado
		11	Del 16 al 22 de mayo de 2021	Aprobado
		12	Del 22 al 28 de mayo de 2021	Aprobado

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

#### 4.2.3. Ejecución de presupuestos

- **Interventoría**

En resumen, para el periodo correspondiente, para la interventoría se presenta la siguiente ejecución presupuestal:

**Tabla 24 Estado de ejecución de presupuesto de interventoría PGO II – Grupo 2**

Grupo	Zona	Contrato	Valor ejecutado (\$)	Porcentaje (%)
2	Sur	2210031	0,00	0

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

- **Contratistas**

En resumen, para el periodo correspondiente, para los contratistas se presenta la siguiente ejecución presupuestal:

**Tabla 25 Estado de ejecución de presupuestos contratistas PGO II – Grupo 2**

Zona	Contrato	Valor ejecutado (\$)	Porcentaje (%)
ZO1	2210019	0,00	0
ZO7	2210025	0,00	0

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

#### 4.2.1. Novedades Contractuales

El 25 de mayo de 2021 Ingeniería Consultoría y Planeación -INCOPLAN S.A. presentó a la entidad la Solicitud de suspensión de los contratos de obra No 2210019, 221005 y del contrato de interventoría No. 2210031 con radicado No. 20214300181042, manifestando lo siguiente:

*(...) Atendiendo los comunicados del asunto con el que los contratistas solicitan la suspensión de su contrato, nos permitimos precisar:*

1. *Efectivamente la situación presentada en el País, a partir del 28 de abril por todos conocida, viene afectando el desarrollo de las obras; debido a las marchas, manifestaciones, cierres de vías, movilizaciones y en algunas Ciudades vandalismo y cierres de las Ciudades y Municipios, situaciones que imposibilitan la movilización de materiales y personal a los sitios de obra, realización de reuniones presenciales para inicio de las obras, labores de divulgación del proyecto etc., es de anotar que esta Interventoría ha venido informando semanalmente en los comités técnicos y por medio de los oficios 2021-4349-ISV-1356 y 2021-449-ISV-1504 de fecha 5 y 16 de mayo respectivamente.*
2. *Esta interventoría ha evidenciado que desde que la situación de orden público empezó a ser complicada para la movilidad, el contratista ha venido informando que las empresas que transportan y/o suministran los materiales cesaron actividades hasta que se superará el estado crítico de la situación nacional, sustentando esto con los comunicados del asunto entregados por los contratistas y en los cuales se da evidencia de que las empresas transportadoras no prestan el servicio que suministra los materiales a los*

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

*diferentes lugares del proyecto hasta que se normalice la situación que impide el paso de vehículos de carga.*

3. *Debido a que no se tiene certeza de cuánto tiempo estará de esta manera la situación de orden público en la en país, por lo que se requieren medidas inmediatas para evitar que la programación de obra para cada uno de los contratos se vea afectada a tal punto que ya no se pueda cumplir con los tiempos establecidos por la entidad.*

*Por lo anterior, ante las necesidades y soportes presentados, esta interventoría considera inminente la suspensión de los contratos y a su vez remite el presente comunicado con el fin de que se apruebe la solicitud de suspender los contratos de obra e interventoría por el término de un (01) mes a partir del 28 de mayo, o hasta que se superen los motivos que dan lugar a la presente solicitud. (...)*

En consecuencia, una vez analizada la solicitud, se consideró procedente suspender los contratos de obra No 2210019, 2210025 y el contrato de interventoría No. 2210031, novedad contractual suscrita a partir del día 28 de mayo de 2021 hasta el 28 de junio de 2021, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente solicitud de suspensión.

La suspensión de los contratos no significa convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera tener los contratistas.

#### **4.2.4. Conclusiones y logros**

- Teniendo en cuenta que, a la fecha de corte de este informe, no se ha dado inicio a las obras y con el fin de contrarrestar dicha demora, se han realizado continuas mesas de trabajo en conjunto con contratistas, interventoría y supervisión para agilizar la entrega de productos desde las diferentes áreas del proyecto, social, ambiental, comunicaciones y técnico. Adicionalmente, desde la supervisión se han realizado requerimientos mediante correos electrónicos, oficios, comités de seguimiento, así mismo, solicitud de la presentación del plan de choque que contenga las acciones correctivas necesarias para recuperar el atraso, lo anterior conformidad con lo establecido en la GUÍA PARA EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE ENTERRITORIO (GMI0005).
- 
- De igual forma con la suspensión de los contratos de obra e interventoría, desde la supervisión se solicitó para el reinicio de los mismos, un plan de contingencia que contrarreste los tiempos en demoras de entrega de los diferentes documentos obligatorios previos al inicio de obra. soportado en el cronograma de ejecución; este plan de contingencia debe ser presentado por los contratistas de obra y aprobado por la interventoría, lo cual garantizará que de igual forma se continuará con la gestión respectiva al visto bueno de las entidades territoriales de los diseños a implementar.

#### **4.2.5. Anexo Grupo 2**

- Anexo 03 - Grupo 3 formato F-GG-11

### 4.3. Grupo 3

#### 4.3.1. Actividades e intervenciones

Durante el periodo del presente informe, se desarrollaron las siguientes actividades e intervenciones:

- **Apropiación y ejecución de diseños**

Previo a iniciar las actividades propias de implementación, es necesario realizar la apropiación de los diseños, esta apropiación consistirá en tomar los diseños aprobados en la fase PGO I para cada punto a intervenir y realizar el ajuste de los planos tomando como base el inventario actualizado existente en terreno y las características físicas que hayan sufrido cambios y/o modificaciones desde el momento de su aprobación, a continuación, se presenta el estado de este proceso:

**Tabla 26 Estado de apropiación y ejecución de diseños**

Zona	Contrato	Municipio	Punto de Diseño	Estado de Apropiación	% Intervención
Z02	2210020	Valledupar	20001-001	Aprobado	85%
			20001-002	Aprobado	82%
			20001-003	Aprobado	85%
			20001-004	Aprobado	98%
			20001-005	Aprobado	0
			20001-006	Aprobado	0
		Barranquilla	08001-001	En ajuste por contratista	0
			08001-002	En ajuste por contratista	0
			08001-003	En ajuste por contratista	0
			08001-004	En ajuste por contratista	0
		Soledad	08758-001	En ajuste por contratista	0
			08758-002	En ajuste por contratista	0
			08758-003	En ajuste por contratista	0
			08758-004	En ajuste por contratista	0
			08758-005	En ajuste por contratista	0
			08758-006	En ajuste por contratista	0
			08758-007	En ajuste por contratista	0
Sincelejo	70001-001	En ajuste por contratista	0		
Z05	2210023	Medellín	05001-001	Aprobado	0
			05001-002	Aprobado	0
			05001-003	Aprobado	0
			05001-005	Aprobado	0
			05001-006	Aprobado	0
			Dos Quebradas	66170-004	En ajuste por contratista
		66170-005		En ajuste por contratista	0
		66170-006		En ajuste por contratista	0
		66170-007		En ajuste por contratista	0

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

- **Recorridos e inspecciones realizadas**

Desde el día 03 de mayo de 2021, se comenzó a realizar las actividades de implementación de la señalización vial implementada para los puntos 001, 003 y 004 del Municipio de Valledupar los cuales estaban apropiados, inicialmente se realizó el punteo de las líneas de borde y de centro, seguidamente se realizó la imprimación de las marcas viales de metro lineal y de metro cuadrado, para continuar con la implementación de la pintura metro lineal y metro cuadrado y la implementación de los dispositivos de señalización a la fecha de corte de este informe se tienen implementados. Teniendo en cuenta que los diseños no se han culminado en su totalidad no se han realizado visitas, pero se programó para los días del 1 al 4 de Junio de 2021 realizar el respectivo recorrido y la inspección de la señalización vial implementada.

- **Comités, reuniones y/o mesas de trabajo**

Como parte de los compromisos establecidos durante la ejecución del proyecto, se continuó con el desarrollo de los comités técnicos de obra semanales, los cuales son citados por la interventoría para el control de la ejecución del proyecto, el cual incluye el avance en este momento de los entregables y los compromisos asociados a la documentación previa al inicio de la implementación en campo:

**Tabla 27 Desarrollo de comités semanales PGO II – Grupo 3**

Grupo	Nombre	Comité Semanal 3	Comité Semanal 4	Comité Semanal 5	Comité Semanal 6
3	Norte	04/05/2021	11/05/2021	18/05/2021	25/05/2021

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

- **Análisis de precios unitarios**

Teniendo en cuenta la aprobación de los diseños de señalización del Municipio de Medellín, se realiza una solicitud por parte del ente territorial para que los pedestales o postes de la señalización vertical que se encuentran diseñados en perfil de ángulo se reemplacen por postes en tubería redonda de 2" y 3mm de espesor, galvanizada y pintada al horno, relleno de concreto de 3.000 psi, por lo tanto, al cierre de este informe el contratista en conjunto con la interventoría están realizando los respectivos Análisis de Precios Unitarios – APU, para la verificación y aprobación de ENTerritorio, para los contratos correspondientes a PGO II grupo 3.

- **Comparación y fijación de precios no previstos**

A la fecha no se ha presentado actividades no previstas para realizar comparación y fijación de precios, para los contratos correspondientes a PGO II grupo 3.

#### 4.3.2. Estado de informes interventoría

- **Informes interventoría:** Informes mensuales y semanales aprobados desde la supervisión a la interventoría e informes pendientes de aprobación.

**Tabla 28 Estado de informes mensuales de interventoría PGO II – Grupo 3 – ZO2**

Grupo	Zona	Contrato	Informe Mensual No	Periodo	Estado
3	Norte	2210032	1	Del 10 de marzo al 31 de marzo de 2021	Aprobación
			2	Del 01 de abril al 30 de abril de 2021	Pendiente de aprobación
			3	Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2021	Pendiente de entrega

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

**Tabla 29 Estado de informes mensuales de interventoría PGO II – Grupo 3 – ZO5**

Grupo	Zona	Contrato	Informe Mensual No	Periodo	Estado
3	Norte	2210032	1	Del 10 de marzo al 31 de marzo de 2021	Aprobado
			2	Del 01 de abril al 30 de abril de 2021	Pendiente de aprobación
			3	Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2021	Pendiente de entrega

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

**Tabla 30 Estado de informes semanales de interventoría PGO II – Grupo 3 – ZO2**

Grupo	Zona	Contrato	Informe Semanal No	Periodo	Estado
3	Norte	2210032	1	Del 10 de marzo al 20 marzo 2021	Aprobado
			2	Del 12 de marzo al 27 marzo 2021	Aprobado
			3	Del 29 de marzo al 04 de abril de 2021	Aprobado
			4	Del 05 de abril 2021 al 11 de abril de 2021	Aprobado
			5	Del 12 de abril al 17 de abril de 2021	Aprobado
			6	Del 18 de abril al 24 de abril de 2021	Aprobado
			7	Del 25 de abril al 01 de mayo de 2021	Aprobado
			8	Del 02 de mayo al 08 de mayo de 2021	Aprobado
			9	Del 09 de mayo al 15 de mayo de 2021	Aprobado
			10	Del 16 de mayo al 22 de mayo de 2021	Aprobado
			11	Del 23 de mayo al 29 de mayo de 2021	Pendiente de aprobación

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla 31 Estado de informes semanales de interventoría PGO II – Grupo 3 – ZO5**

Grupo	Zona	Contrato	Informe Semanal No	Periodo	Estado
3	Norte	2210032	1	Del 10 de marzo al 20 marzo 2021	Aprobado
			2	Del 12 de marzo al 27 marzo 2021	Aprobado
			3	Del 29 de marzo al 04 de abril 2021	Aprobado
			4	Del 05 de abril al 11 de abril 2021	Aprobado
			5	Del 12 de abril al 17 de abril de 2021	Aprobado
			6	Del 18 de abril al 24 de abril de 2021	Aprobado
			7	Del 25 de abril al 01 de mayo de 2021	Aprobado
			8	Del 02 de mayo al 08 de mayo de 2021	Aprobado
			9	Del 09 de mayo al 15 de mayo de 2021	Aprobado
			10	Del 16 de mayo al 22 de mayo de 2021	Aprobado
			11	Del 23 de mayo al 29 de mayo de 2021	Pendiente de aprobación

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

- **Informes de los contratistas:** Informes mensuales y semanales aprobados desde la interventoría a los contratistas e informes pendientes de aprobación.

**Tabla 32 Estado de informes mensuales contratistas PGO II – Grupo 3**

Zona	Contrato	Informe Mensual No	Periodo	Estado
ZO2	2210020	1	Del 10 de marzo al 31 de marzo de 2021	Aprobado
		2	Del 01 de abril al 30 de abril de 2021	Pendiente de aprobación
		3	Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2021	Pendiente de entrega
ZO5	2210023	1	Del 10 de marzo al 31 de marzo	Aprobado
		2	Del 01 de abril al 30 de abril de 2021	Pendiente de aprobación
		3	Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2021	Pendiente de entrega

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

**Tabla 33 Estado de informes semanales contratistas PGO II – Grupo 3**

Zona	Contrato	Informe Semanal No	Periodo	Estado
ZO2	2210020	1	Del 22 de marzo de al 27 de marzo de 2021	Aprobado
		2	Del 28 de marzo al 03 de abril de 2021	Aprobado
		3	Del 04 de abril al 11 de abril de 2021	Aprobado
		4	Del 12 de abril al 17 de abril de 2021	Aprobado
		5	Del 18 de abril al 24 de abril de 2021	Aprobado
		6	Del 25 de abril al 01 de mayo de 2021	Aprobado
		7	Del 02 de mayo al 08 de mayo de 2021	Aprobado
		8	Del 09 de mayo al 15 de mayo de 2021	Aprobado
		9	Del 16 de mayo al 22 de mayo de 2021	Pendiente por aprobar
		10	Del 23 de mayo al 29 de mayo de 2021	Pendiente de entrega
ZO5	2210023	1	Del 22 de marzo al 29 de marzo de 2021	Aprobado
		2	Del 29 de marzo al 04 de abril de 2021	Aprobado
		3	Del 05 de abril al 11 de abril de 2021	Aprobado
		4	Del 12 de abril al 18 de abril de 2021	Aprobado
		5	Del 19 de abril al 25 de abril de 2021	Aprobado
		6	Del 26 de abril al 01 de mayo de 2021	Aprobado
		7	Del 02 de mayo al 08 de mayo de 2021	Aprobado
		8	Del 09 de mayo al 15 de mayo de 2021	Aprobado
		9	Del 16 de mayo al 22 de mayo de 2021	Aprobado
		10	Del 23 de mayo al 29 de mayo de 2021	Aprobado

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

#### 4.3.3. Ejecución de presupuestos

- **Interventoría**

En resumen, para el periodo correspondiente, para la interventoría se presenta la siguiente ejecución presupuestal:

**Tabla 34 Estado de ejecución de presupuesto de interventoría PGO II – Grupo 3**

Grupo	Zona	Contrato	Valor ejecutado (\$)	Porcentaje (%)
3	Norte	2210032	0,00	0

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

- **Contratistas**

En resumen, para el periodo correspondiente, para los contratistas se presenta la siguiente ejecución presupuestal:

**Tabla 35 Estado de ejecución de presupuestos contratistas PGO II – Grupo 3**

Zona	Contrato	Valor ejecutado (\$)	Porcentaje (%)
Z02	2210020	0,00	0
Z05	2210023	0,00	0

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

#### 4.3.4. Conclusiones y logros

- En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de mayo, desde la supervisión se han realizado diferentes reuniones, comités técnicos semanales, mesas de trabajo, correos electrónicos y oficios radicados a la interventoría, estos con el fin de adelantar lo más pronto posible la apropiación y aprobación de los diseños en los municipios de Barranquilla, Soledad, Sincelejo y Dosquebradas. De esta forma se procede con los pasos definidos dentro de los documentos contractuales para dar comienzo con prontitud a la implementación de los diseños de señalización.
- En este mismo periodo se adelantan mesas de trabajo con la Supervisora delegada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial -ANSV-, informando sobre el seguimiento que se adelanta por parte de la Supervisión de Enterritorio al contrato de interventoría Grupo 3, así como las Zonas 2 y 5.
- Se han remitido al contratista diferentes oficios informándoles sobre los requisitos descritos en las reglas de participación y los documentos contractuales, para que se adelante los correspondientes trámites con el contratista, por incumplimiento u omisiones en el desarrollo contractual del proyecto.


**5. Área de Comunicaciones**

Durante el mes de **mayo** de 2021 se tuvo contacto semanal con el enlace de comunicaciones de la ANSV, con el fin de trabajar de manera coordinada las acciones estratégicas de planeación, diseño y ejecución de la propuesta de plan de medios para PGO. Se propuso versión preliminar del boletín de prensa, se envió a la ANSV, a ENTerritorio y a los 5 municipios donde comenzaron intervenciones. Se envió a ENTerritorio propuesta de dos banners de apoyo y a la ANSV se envió la parrilla para redes sociales. Se elaboró y se envió boletín de inicio de obra a Valledupar, Bucaramanga, Tunja y Barrancabermeja con la información del punto donde se dio inicio, inversión, medidas y priorización de puntos para diseños de PGOII. Adicionalmente se elaboró y se envió video de inicio de intervenciones a Bucaramanga, Tunja y Barrancabermeja para su difusión.

**5.1. Monitoreo de medios y redes sociales**

Con el fin de recopilar la información en medios y redes sociales que genera el desarrollo del programa Pequeñas Grandes Obras, se realizó el monitoreo de medios y redes sociales institucionales del sector y de prensa regional, reseñando noticias y piezas periodísticas en las cuales se menciona el programa. Esta actividad contribuye al control permanente de las percepciones de la comunidad, y a mantener un seguimiento a los aspectos reputacionales y de imagen propios de una de las estrategias con mayor despliegue territorial de la ANSV en el país. Las publicaciones se presentan en Ilustración 51:

**Ilustración 51 Monitoreo de medios y redes sociales sector transporte y prensa regional - PGO**

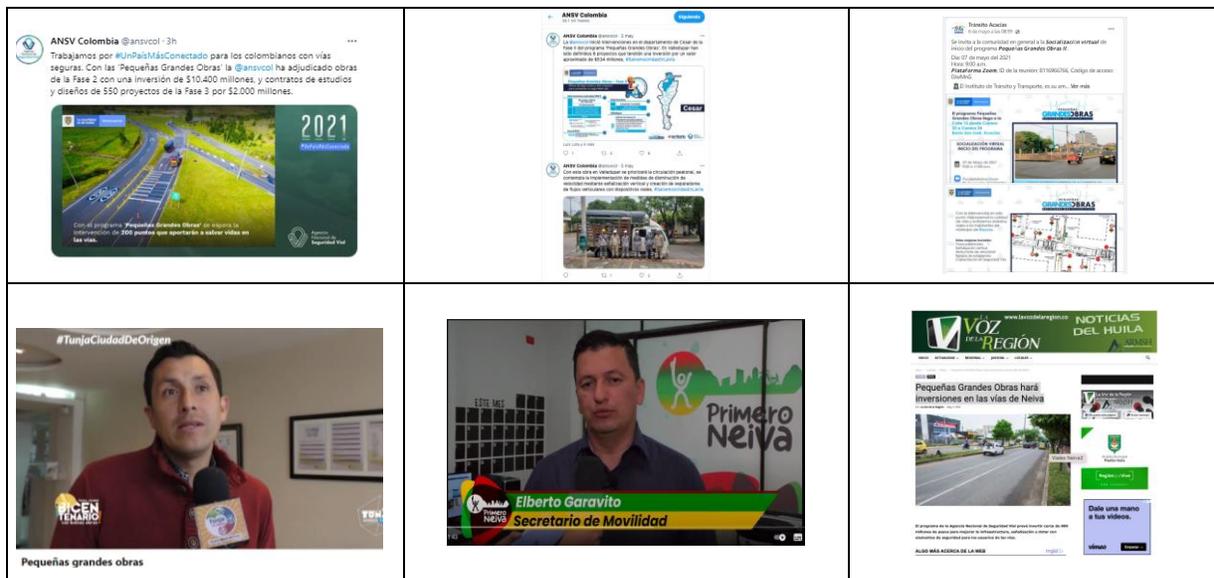



**En Neiva se busca reducir el índice de accidentalidad**

La Secretaría de Movilidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) invitan a la comunidad a generar y participar de la jornada de señalización del programa Pequeñas Grandes Obras a través de la cual se realizarán reguladas intervenciones en materia de seguridad vial en la ciudad.

La agencia va a invertir un poco más de 300 millones de pesos con lo cual se va a intervenir sobre todo en materia de infraestructura vial: señalización, pintura, se va a instalar tanto ómnibus fáciles, rampas y a cosas que son bastante importantes como: ómnibus fáciles, rampas de movilidad de élite.



Tránsito Bucaramanga @transitobucara · 10 may  
Las PequeñasGrandesObras llegan a la Diagonal 15 de Bucaramanga con intervenciones que salvarán vidas. Conciencia a la población de este programa de Bucaramanga y @Enterritorio gestionados por @ComunidadesDTE y @TransitoBucara



Dirección de Tránsito de Bucaramanga · 11 may  
Las PequeñasGrandesObras llegan a la Diagonal 15 de Bucaramanga con intervenciones que salvarán vidas. Conciencia a la población de este programa de Bucaramanga y @Enterritorio gestionados por @ComunidadesDTE y @TransitoBucara



Anexo 1- Audio Positiva 101...  
1 MB



**SIE7EDIAS**

Las dos obras que ejecutará la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la capital boyacense

Con el objeto de reducir la accidentalidad en la movilidad, se espera mejorar en los próximos días la seguridad vial en la ciudad de Bucaramanga. Para ello, se realizará la ejecución de dos obras que serán de gran importancia para la población.



MovilidadTunja @MovilidadTunja · 4h  
El Secretario de Tránsito y Transporte acompañó la socialización del proyecto de señalización vial a la comunidad dentro del convenio con la Agencia Nacional de la Seguridad Vial - Enterritorio. (Hilo)




enterritorio · Siguiendo

enterritorio @enterritorio · 15 may  
El programa Pequeñas Grandes Obras, desarrollado por la @Enterritorio y @Enterritorio, inició y ejecución de la fase II con la intervención del primer punto de la ciudad de Bucaramanga en la Diagonal 15 de Bucaramanga. Más información aquí: #PequeñasGrandesObras



Dirección de Tránsito de Bucaramanga · 15 may  
Con la entrega de la primera intervención en Valledupar inició la ejecución de la fase II del programa Pequeñas Grandes Obras



**Pequeñas Grandes Obras**

En el mes de mayo inició la ejecución de la Fase II con la intervención del primer punto en la ciudad de Valledupar. Se iniciaron obras en Medellín, Bucaramanga, Bucaramanga, Acandía y Tunja, con el fin de prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o lesión de los diferentes actores viales.



Con la entrega de la primera intervención en Valledupar inició la ejecución de la fase II del programa Pequeñas Grandes Obras

El día de hoy se realizaron intervenciones en Paragigante del país.



**última hora NOTICIAS**



**Intervendrán puntos críticos viales en Tunja**



**ALTO IMPACTO BAJO COSTO**

INICIÓ LA EJECUCIÓN DE LAS PEQUEÑAS GRANDES OBRAS EN VALLEDUPAR



Tránsito Bucaramanga @transitobucara · 13h  
@ComunidadesDTE iniciaron en Bucaramanga las intervenciones de la fase II del programa Pequeñas Grandes Obras, gestionadas por la DTE



**BUCARAMANGA CALLE 45 QUINTA ESTRELLA HASTA ANILLO VIAL**




Dirección de Tránsito de Bucaramanga · 12 h  
@ComunidadesDTE iniciaron en Bucaramanga las intervenciones de la fase II del programa Pequeñas Grandes Obras, gestionadas por la DTE



**NOTICIAS PGO**

Un programa de Pequeñas Grandes Obras



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

\*Nota: Se relacionan capturas de pantalla de las redes sociales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y medios de prensa digitales de algunas regiones del país. En todos los casos, se trata de apariciones en medios y redes verificadas durante el mes de mayo de 2021. Para ampliar la información, visite el Anexo 04-II - 20210531\_Monitoreo de Medios Mayo en el que encontrará los links de las publicaciones identificadas durante este periodo.

Para el mes de mayo, el monitoreo de medios arrojó un total de 30 portales en los que el proyecto Pequeñas Grandes Obras fue mencionado favorablemente, los cuales fueron difundidos en diferentes medios de comunicación, prensa digital, páginas web y redes sociales. De las 30 publicaciones 63% ocurrieron en redes sociales, el 30% en prensa digital y el 7% restante en portales web de entidades oficiales, esto evidencia que la mayor fortaleza de esta difusión se da por redes sociales de los Entes territoriales. Ver ilustración Ilustración 55

### Ilustración 52 Presencia PGO por Categoría de medios - Mayo.



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.


Dentro de las publicaciones, hemos segmentado la información para poder identificar cuáles fueron las publicaciones hechas internamente desde la ANSV o ENTerritorio y cuales se produjeron de manera externa. En el mes de mayo arroja un total de 9 publicaciones internas y 21 externas. (Ver Tabla 36). La **Ilustración 53** refleja en paralelo las publicaciones generadas internamente que mayoritariamente se presentan en redes sociales con una distribución equitativa entre las redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook y portales web de las entidades. Por su parte, la mayor actividad en las publicaciones generadas de manera externa se da en la prensa digital, mayoritariamente de portales regionales, lo que genera un impacto más localizado en la población beneficiaria, potenciando el alcance de la información en los entes territoriales objeto del programa.

**Tabla 36 Resumen publicaciones PGO por medio de comunicación – Mayo**

Medio	Interna	Externa	Total medio
Facebook	2	5	7
Twitter	2	6	8
Instagram	2	0	2
Youtube	1	1	2
Prensa Digital	0	7	7
Prensa Escrita	0	0	0
Radio	0	2	2
Pág web Entidad	2	0	2
<b>Total</b>			<b>30</b>

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021

**Ilustración 53 Publicaciones PGO por medio de comunicación: Interna Vs Externa**



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021

En todos los entes territoriales en los que se iniciaron intervenciones, se realizaron publicaciones en redes sociales y en prensa digital como se resume en la .


Tabla 37.

**Tabla 37. Publicaciones PGO por ente territorial - Mayo.**

Municipio	Internas	Externas	Total
General	1	0	1
Valledupar	7	0	7
Acacias	0	2	2
Tunja	0	6	6
Neiva	0	4	4
Bucaramanga	1	7	8
Barrancabermeja	0	1	1
Región Santander	0	1	1
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>30</b>

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Los entes territoriales en los que más publicaciones se generaron fueron Bucaramanga, Valledupar y Tunja, respectivamente como lo muestra la Tabla 61 Para casos como el de Valledupar, se observa que tras la deficiente respuesta del ente territorial en el apoyo a las publicaciones del programa, se genera un flujo desde la difusión propia de ANSV y ENTerritorio para impulsar el tema y generar visibilidad de estas intervenciones. La gráfica también refleja publicaciones en entes territoriales como Acacias, Neiva y Soledad, producto del boletín preliminar al inicio de obras que se comparte con los entes territoriales según la proyección entregada por el equipo técnico sobre los próximos acontecimientos del programa.

**Ilustración 54. Publicaciones PGO por ente territorial - Mayo.**


Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

El total General de PGO 2020 – 2021 es de 153 publicaciones. Ver **Tabla 38**.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla 38 Total, publicaciones PGO 2020 – 2021**

Resumen General Año 2020		Resumen General Año 2021	
Mes	Noticias	Mes	Noticias
Junio	3	Enero	5
Julio	3	Febrero	12
Agosto	13	Marzo	15
Septiembre	14	Abril	28
Octubre	12	Mayo	30
Noviembre	11	<b>Total</b>	<b>90</b>
Diciembre	7		
<b>Total</b>	<b>63</b>		

<b>Total Publicaciones</b>	<b>153</b>
----------------------------	------------

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021

## 5.2. Boletín de prensa

Se realizó *boletín de prensa* con la información de los avances correspondientes a abril y mediados de mayo de 2021, enviado el 11 de mayo a ANSV y ENTerritorio y publicado el 13 y fue enviado a los 5 municipios donde iniciaron intervenciones el 19 de mayo de 2021, sobre inicio de obras de PGOII del programa Pequeñas Grandes Obras.

Adicionalmente se envió el boletín de inicio de obras en Valledupar el 11 de mayo, Bucaramanga, Barrancabermeja y Tunja el 19 de mayo. Los boletines se presentan en la *Ilustración 55*.

### Ilustración 55 Boletines mensuales - Mayo de 2021.





**CON LA ENTREGA DE LA PRIMERA INTERVENCIÓN EN VALLEDUPAR INICIO LA EJECUCIÓN DE LA FASE II DEL PROGRAMA PEQUEÑAS GRANDES OBRAS**

- En el mes de mayo se realizarán intervenciones en 5 municipios del país
- La inversión total de las obras es de 9.034.000 millones de pesos

Bogotá, D. C., 12 de mayo de 2021. El programa 'Pequeñas Grandes Obras' (PGO), liderado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y desarrollado en convenio con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, (ENTerritorio), **inició** la ejecución de la Fase II con la intervención del primer punto en la ciudad de Valledupar. Serán 9 puntos a implementar en este municipio. Igualmente, en el mes de mayo se iniciarán obras en Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Acaolá y Tunja, con el fin de prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o lesión de los diferentes actores viales.

Las medidas implementadas en el punto ubicado en la calle 28 con carrera 16 de Valledupar, incluyeron la demarcación horizontal para la definición de carriles y mejorar la seguridad vial, al igual que senderos para el cruce de peatones, con la respectiva señalización que indica que existe una zona de juegos cercana.

Además, se llevó a cabo la instalación de una canalización en la carrera 16 con calle 28, para disminuir la accidentalidad, y el montaje de un desarrollo escolar para los peatones del colegio ubicado en este sector.

**ANTES:**



**DURANTE:**






**DESPUES:**



Para la realización de estas intervenciones, en el mes de abril se llevaron a cabo diversos encuentros en los municipios de las 7 zonas correspondientes a la Fase II, se realizaron 33 comités de seguimiento y 14 reuniones de socialización, avanzando en la consolidación de estos requisitos para el inicio de las obras.

Dentro de la caracterización y tipología de las medidas de la Fase II del programa Pequeñas Grandes Obras, se intervendrán, principalmente, 30 puntos en zonas escolares, 16 pasos peatonales, 4 con ampliación de zonas para peatones, 17 de gestión de velocidad, 10 con organización de flujo en intersecciones y 3 espacios con sistemas de contención.

La Fase III de Pequeñas Grandes Obras, encargada de la elaboración de los diseños de aproximadamente 550 puntos críticos donde se presenta un alto índice de siniestralidad, ya cuenta con la adjudicación de los cuatro consultores que elaborarán estos diseños.

**LA ANSV Y ENTERRITORIO INTERVIENEN 4 PUNTOS CRÍTICOS DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PEQUEÑAS GRANDES OBRAS - PGO**

- Las intervenciones se están llevando a cabo en 4 puntos críticos
- Las obras iniciaron en la calle 45 desde el Barrio Quinta Estrella hasta el Anillo Vial
- El costo aproximado de la ejecución es de 1.215 millones de pesos

Bogotá, D. C., mayo 19 de 2021. El programa 'Pequeñas Grandes Obras' (PGO), liderado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y gerenciado por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, (ENTerritorio), inició las intervenciones en Bucaramanga, comenzando por la Calle 45 desde el Barrio Quinta Estrella hasta el Anillo Vial, con el fin de disminuir la siniestralidad vial y las víctimas asociadas a los accidentes de tránsito.

Las obras beneficiarán a los actores viales del municipio a través de intervenciones como señalización vertical y horizontal, urbanismo táctico, construcción de medidas de tráfico calmado y medidas de contención. La inversión aproximada de estas intervenciones en Bucaramanga será de 1.215 millones y el costo total en el país será de 9.034 millones de pesos.

**Puntos a intervenir en Bucaramanga PGOI:**

Bucaramanga	Calle 45 entre Barrio Quinta Estrella y anillo vial
Bucaramanga	Avenida Metropolitana entre carrera 2a y carrera 14
Bucaramanga	Diagonal 15 entre calle 55 y calle 45
Bucaramanga	Calle 34 16 -19 zona Institución Educativa Las Américas

Con estas intervenciones de bajo costo y alto impacto, la ANSV y ENTerritorio contemplan prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o lesión de los diferentes actores viales en 24 departamentos del país.

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

### 5.3. Elaboración de banner

Elaboración de (2) banners para la página web, Instagram y Facebook de la Oficina Asesora de Comunicaciones de ENTerritorio, y propuesta para soporte del boletín mensual. Los banners se presentan en la Ilustración 56:

Ilustración 56. Banners apoyo boletín mensual – mayo 2021

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

#### 5.4. Cápsula de video PGO II

Se realizaron 3 cápsulas de videos, voz en off, para el inicio de obra de los Municipios de Bucaramanga, Barrancabermeja y Tunja, los cuales fue publicados en Portales web, Instagram y Facebook de la ANSV y ENTerritorio, y páginas web de los municipios. Los videos se presentan en *Ilustración 57*:

**Ilustración 57 . Video PGO – Inicio de obras – mayo 2021**



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

### 5.5. Seguimiento a enlace de comunicaciones de PGOII

Se realizó el seguimiento con los enlaces de comunicaciones de los municipios de PGOII, para verificar envío de información, corroborar los medios con que se interactúa y la posterior publicación. El cuadro de seguimiento se presenta en la Tabla 39 :

**Tabla 39 Cuadro seguimiento enlaces territoriales**

Directorio por zonas PGO II						
Central						
Datos					Mayo	
Departamento	Municipio	Enlace comunicaciones	Teléfono	Correo electrónico	Envío de información	Observaciones
Boyacá	Duitama	Vivianne Bonilla	3142195657	<a href="mailto:vivianne.bonilla@gmail.com">vivianne.bonilla@gmail.com</a>	19 MAYO: Se envía información de socializaciones de puntos 001 y 002 para compartir en redes	
Boyacá	Sogamoso	Erika Tibavija	3112322066	<a href="mailto:erika.t.alfonso@gmail.com">erika.t.alfonso@gmail.com</a>		No aplica para el periodo
Boyacá	Tunja	Angela Porras	3013418203	<a href="mailto:mediosboyaca@gmail.com">mediosboyaca@gmail.com</a>	Se envió información para socialización y fue publicada en twitter en tránsito / 12 mayo: Envió de Info socialización punto 003 y 002. / 13 de MAYO: Se le envió el boletín de mayo con el link de la ANSV donde está el boletín. / 21 MAYO: Video de apoyo a boletín de inicio de obras en TUNJA. / 24 MAYO: Se hizo seguimiento de publicaciones nuevas	12 MAYO: se publicó información de PGO en Boyacá 7 días, //. 13 de MAYO en periódico Extra. //

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Ver en el Anexo 05- II-20210531 -Directorio medios y seguimiento enlaces territoriales

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

### 5.6. Parrillas e información para Consejos Territoriales

Se realizó la parrilla con información para la elaboración de piezas de comunicación para la ANSV. Se realizó el monitoreo de medios de los Consejos Territoriales que ha realizado la ANSV, pero en el mes de mayo, no se encontraron publicaciones que estén relacionadas con PGO. Adicionalmente se envió información (bullet) de PGO para Consejos Territoriales en Huila, Putumayo, Meta, Cauca, Casanare, Caldas, Magdalena y San Andrés.

**Tabla 40 Parrilla para redes sociales PGO mayo**

Trino (280 caracteres)	Copy
La ANSV y ENTerritorio En el mes de mayo inició la ejecución de la Fase II con la intervención del primer punto en la ciudad de Valledupar. #Pequeñasgrandesobras	Para la fase II del Programa "Pequeñas Grandes obras" se dio inicio a la ejecución de obras para implementar medidas de seguridad vial en Valledupar
#Pequeñas Grandes Obras en mayo inicia obras en Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Acacias y Tunja, con el fin de prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o lesión de los diferentes actores viales.	La fase II del Programa #PequeñasGrandesObras inicia intervenciones de medidas de seguridad vial en 6 ciudades del país.
#Pequeñas Grandes Obras La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en convenio con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, (ENTerritorio) ya cuenta con la adjudicación de 4 consultores para la elaboración de diseños de 550 puntos críticos de la fase III	La fase III del programa #PequeñasGrandesObras elaborará diseños en 550 puntos críticos por un valor cercano a los 2.000 millones de pesos.
El programa Pequeñas Grandes Obras contempla prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o lesión de los diferentes actores viales #Pequeñas Grandes Obras	

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

## 6. Área de Gestión social

Durante el mes de mayo de 2.021, se continuó con la ejecución de actividades del componente de Gestión Social, enfocadas hacia el apoyo a la supervisión de PGO. Así entonces, a continuación, se relacionan las actividades que se adelantaron para el apoyo a la supervisión de la gestión social y los avances en la aplicación de la metodología de evaluación de impactos del componente de Gestión Social de PGO II.

### 6.1. Comités semanales de seguimiento PGO II

Durante el mes de mayo se asistió a 28 comités semanales de seguimiento, como se muestra en la Tabla 41. A continuación, se describen las actividades de gestión social en el marco de los comités en mención.

- Grupo 1. Zona 3 Centro, Zona 4 Santanderes 1 y Zona 6 Santanderes 2

Durante el mes de mayo se asistió a 4 comités semanales los días 6, 13, 20 y 27 de mayo de 2.021 para Zona 3 Centro, municipios de Tunja, Sogamoso y Duitama. Para Zona 4 Santanderes se asistió a 4 comités los días 7, 14, 21 y 28 de mayo de 2.021, municipios de Bucaramanga, Girón y Floridablanca. Para Zona 6 Santanderes 2, de igual forma, se asistió a 4 comités los días 7, 14, 21 y 28 de mayo de 2.021, municipio de Barrancabermeja, para un total de 12 comités semanales en este período. En dichos comités se trataron los temas de las actividades de gestión social, las dificultades presentadas y los planes de acción a realizar.

- Grupo 2. Zona 1 Pacífico y Amazonía y Zona 7 Llanos Orientales y Amazonía

Durante el mes de mayo se participó en 8 comités de seguimiento semanal, los cuales se llevaron a cabo los días 4, 11, 18, y 25 de mayo de 2.021. Durante los comités se trataron los avances de las actividades contenidas dentro del Plan de Gestión Social.

- Grupo 3. Zona 2 Caribe y Zona 5 Antioquia y Eje Cafetero

Durante el mes de mayo se asistió a 4 comités semanales los días 4, 11, 18 y 25 de mayo de 2.021 para Caribe, en donde se discutió la información de la obra técnica y social referida principalmente al inicio de obra de los municipios de Valledupar, Barranquilla, Soledad y Sincelejo.

En las mismas fechas (4, 11, 18 y 25 de mayo de 2.021) se asistió a los comités semanales de Zona 5 Antioquia y Eje cafetero, en donde se discutió el avance de las obras técnicas y sociales en los puntos para Medellín.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla 41 Comités semanales de seguimiento PGO II**

Grupo	Zona	No. de comité
Grupo 1	Zona 3 Centro	7-8-9-10
	Zona 4 Santanderes 1	6-7-8-9
	Zona 6 Santanderes 2	6-7-8-9
Grupo 2	Zona 1 Pacífico y Amazonía	6-7-8-9
	Zona 7 Llanos Orientales y Andina	6-7-8-9
Grupo 3	Zona 2 Caribe	7-8-9-10
	Zona 5 Antioquia – Eje cafetero	7-8-9-10
<b>Total comités</b>	<b>28</b>	

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

## 6.2. Revisión informes semanales y mensuales PGO II

Durante el mes de mayo se revisaron 18 informes semanales y 4 mensuales, como se muestra en la Tabla 42. A continuación, se describen las actividades desarrolladas en el marco de la revisión de dichos informes.

- Grupo 1. Zona 3 Centro, Zona 4 Santanderes 1 y Zona 6 Santanderes 2

Durante el mes de mayo se recibieron 4 informes semanales por parte de la interventoría, para cada una de las tres zonas, realizando las debidas observaciones a cada uno de ellos. El día 25 de mayo de 2.021 se recibió por parte de la interventoría un informe mensual que contiene la información de las tres zonas. El día 31 de mayo de 2.021 se recibió subsanación de observaciones.

- Grupo 2. Zona 1 Pacífico y Amazonía y Zona 7 Llanos Orientales y Amazonía

Durante el mes de mayo no se recibieron informes semanales de las Zonas 1 y 7.

El 27 de mayo de 2.021 se recibió por parte de la supervisión un informe mensual de la Zona 1. De esta manera, una vez realizada la revisión del documento, se evidenció que la información allí contenida daba claridad acerca de los avances y actividades realizadas para cada uno de los componentes de Gestión Social, según lo requerido en el Apéndice B. Para la Zona 7 igualmente se recibió un informe mensual, sin embargo, fue necesario hacer observaciones dado que no contenía información concerniente al Componente de Gestión Social y Comunicaciones.

- Grupo 3. Zona 2 Caribe y Zona 5 Antioquia y Eje Cafetero

Durante el mes de mayo se recibieron 3 informes semanales por parte de la interventoría, para cada zona (Caribe y Antioquia-Cafetero), realizando las debidas observaciones a cada uno de ellos.

El día 11 de mayo de 2.021 se recibió y revisó por parte de la interventoría de zona Caribe un informe mensual que contiene la información de las actividades de la Gestión Social. El mismo

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

ejercicio se realizó para la Zona 5 de los puntos de Medellín. Tras la revisión de estos documentos, se resalta que la información se recibió a conformidad.

**Tabla 42 Revisión informes semanales y mensuales PGO II**

Grupo	Zona	Informes semanales	Informes mensuales
<b>Grupo 1</b>	Zona 3 Centro	7-8-9-10	1
	Zona 4 Santanderes 1	7-8-9-10	
	Zona 6 Santanderes 2	7-8-9-10	
<b>Grupo 2</b>	Zona 1 Pacífico y Amazonía	-	1
	Zona 7 Llanos Orientales y Andina	-	1
<b>Grupo 3</b>	Zona 2 Caribe	6-7-8	1
	Zona 5 Antioquia – Eje Cafetero	6-7-8	
<b>Total</b>		<b>18</b>	<b>4</b>

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

### 6.3. Actividades de difusión y socialización PGO II

Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades de difusión y socialización, como se muestra en la Tabla 43.

**Tabla 43 Actividades de difusión y socialización PGO II**

Grupo	Zona	Actividad de difusión	Socializaciones realizadas
Grupo 1	Zona 3 Centro	Entrega de volantes y perifoneo en el municipio de Tunja y Duitama	Duitama para los puntos 15238-001 el día 19 de mayo, 15238-002 19 de mayo y para el municipio de Tunja los puntos 15001-002 12 de mayo y 15001-003 15 de mayo.
	Zona 4 Santanderes 1	Entrega de volantes y perifoneo en el municipio de Bucaramanga.	Bucaramanga el día 11 de mayo se realizó la socialización del punto 68001-003 y el día 31 de mayo en el punto 68001-004
	Zona 6 Santanderes 2	Entrega de volantes y perifoneo en el municipio de Barrancabermeja.	Barrancabermeja el punto 68081-002 el día 10 de mayo, el punto 68081-004, el día 3 de mayo, el punto 68081-005 el día 29 de mayo y el punto 68081-006 el día 25 de mayo.
Grupo 2	Zona 1 Pacífico y Amazonía	No se llevaron a cabo durante este mes.	

Grupo	Zona	Actividad de difusión	Socializaciones realizadas
	Zona 7 Llanos Orientales y Andina	Entrega de volante.	Acacias reunión #1 de inicio punto 50006-002 el día 7 de mayo de 2021.  Acacias reunión #2 de inicio punto 50006-002 el día 27 de mayo de 2021.
		Volante, perifoneo, afiches municipio de Neiva.	No se llevaron a cabo
Grupo 3	Zona 2	Volanteo de resocialización de diseño.	Valledupar; 20001-005; 21 de mayo de 2021

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

- Grupo 1. Zona 3 Centro, Zona 4 Santanderes 1 y Zona 6 Santanderes 2


En relación con la estrategia de divulgación y comunicaciones, para la Zona 3 se realizó la socialización en los municipios de Duitama (puntos 15238-001 el día 19 de mayo de 2.021 y 15238-002 19 de mayo de 2.021) y Tunja (puntos 15001-002 el 12 de mayo de 2.021 y 15001-003 el 15 de mayo de 2.021). Las socializaciones del municipio de Sogamoso se encuentran programadas para el mes de junio.

Para la Zona 4 Santanderes 1 se realizó la socialización de los puntos de Bucaramanga 68001-003 el día 11 de mayo de 2.021, y 68001-004 el día 31 de mayo de 2.021 en el punto. No se han iniciado acciones en los municipios de Girón y Floridablanca.

Para la Zona 6 se realizaron las socializaciones en 4 puntos del municipio de Barrancabermeja. El punto 68081-002 el día 10 de mayo de 2.021, el punto 68081-004, el día 3 de mayo de 2.021, el punto 68081-005 el día 29 de mayo de 2.021 y el punto 68081-006 el día 25 de mayo de 2.021. Los dos puntos restantes están programados para el día 3 de junio de 2.021.

A continuación, en la Ilustración 58 se presentan algunas fotografías correspondientes al proceso de divulgación del Grupo 1:

### Ilustración 58 Socialización de Barrancabermeja y Duitama

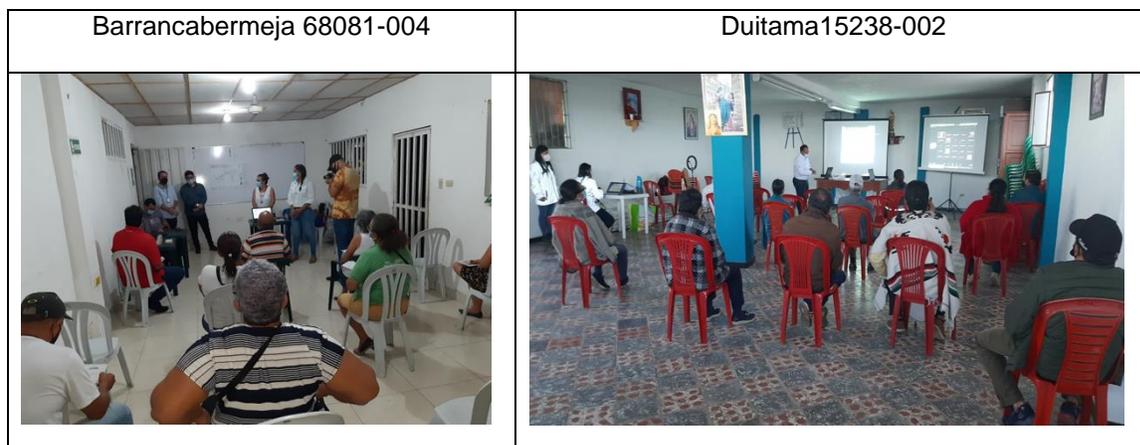

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

- Grupo 2. Zona 1 Pacífico y Amazonía y Zona 7 Llanos Orientales y Amazonía

La estrategia de divulgación y comunicación en los municipios de Popayán y Pasto se realizó durante el mes de abril, en dicha estrategia se utilizaron afiches, perifoneo y volantes. Sin embargo, es importante mencionar que, aunque las reuniones de inicio estaban programadas para el mes de mayo, a raíz de la situación de orden público que se ha vivido en el territorio nacional a causa del paro nacional, no fue posible realizar dichas reuniones, de esta manera una vez se reestablezca el orden se implementarán nuevamente las estrategias de perifoneo y volantes. En cuanto al municipio Guadalajara de Buga, se aprobó guion de perifoneo; para el municipio de Puerto Asís se aprobó guion y volantes para los puntos 005 y 006; sin embargo, no se ejecutaron acciones de implementación de estas estrategias ya que la implementación de la obra está programada para el mes de junio.

Para el punto 50006-002 perteneciente al municipio de Acacias, se llevó a cabo una primera reunión de socialización el día 7 de mayo de 2.021. Dicha reunión conto con la estrategia de entrega de volantes (ver Ilustración 59) el día 5 de mayo de 2,021, sin embargo, se realizó una segunda convocatoria de reunión de inicio en este punto a través de mensajes de WhatsApp y redes sociales el día 25 mayo de 2.021. En cuanto al punto 50006-001 aún no se ha realizado la distribución de volantes.

### Ilustración 59 Volante de invitación reunión de inicio Acacias



Para el municipio de Neiva se utilizaron 3 estrategias de divulgación y comunicación implementadas durante el mes de mayo para los puntos 41001-001 y 41001-002. La primera de ellas fue el perifoneo, realizado el 5 de mayo de 2.021; la segunda, la instalación de afiches el 13 de mayo de 2.021 (ver Ilustración 60); y la tercera, fue la distribución de volantes para los mismos puntos, la cual se realizó el 19 de mayo de 2.021. Es importante mencionar que tanto la estrategia de perifoneo y volante se deberán volver a implementar ya que no fue posible la realización de la reunión de inicio.

**Ilustración 60 Instalación de afiches divulgativos Neiva**



En cuanto al municipio de Pitalito, no se han iniciado acciones de divulgación y comunicación.

- Grupo 3. Zona 2 Caribe y Zona 5 Antioquia y Eje Cafetero

Teniendo en cuenta que las actividades de difusión y socialización para la Zona 2 Caribe iniciaron en el mes de abril con la ubicación de afiches en los respectivos puntos para Barranquilla, Sincelejo, Valledupar y Soledad, cumpliendo con el plazo de 15 días de divulgación previos a la reunión de inicio. En el mes de mayo se hizo una actualización técnica de los diseños para el punto 005 de Valledupar, lo que implicó hacer un proceso de resocialización puerta a puerta con los beneficiarios-usuarios para darles a conocer dichos cambios. Del mismo modo, y contando con la respectiva apropiación de diseños para punto 006 en Valledupar, se inicia proceso de divulgación y convocatoria a reunión de inicio, como se muestra en la Ilustración 61.

**Ilustración 61 Volantes de resocialización Punto 005 Valledupar**



 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

Para la Zona 5 Antioquia - Eje Cafetero se inició la planeación de actividades para el municipio de Dosquebradas.

#### 6.4. Lectura Territorial PGO II

En relación con la Lectura Territorial, durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades, como se muestra en la Tabla 44 Lectura territorial:

**Tabla 44 Lectura territorial**

Grupo	Zona	Lectura territorial
<b>Grupo 1</b>	Zona 3 Centro	Avances en la metodología de recolección de información para la elaboración de la Cartografía Social, Caracterización y Mapeo de Actores.
	Zona 4 Santanderes 1	
	Zona 6 Santanderes 2	Se recibió la Lectura Territorial de Zona 3. Se realizaron observaciones.
<b>Grupo 2</b>	Zona 1 Pacifico y Amazonía	Caracterización, reconocimiento y mapeo de actores para los 4 puntos de Popayán y Pasto en revisión de la Interventoría.
	Zona 7 Llanos Orientales y Andina	
<b>Grupo 3</b>	Zona 2	Se avanza en la consecución de la información para Cartografía social, Caracterización, Demografía y Mapeo de actores.
	Zona 5	

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

- Grupo 1. Zona 3 Centro, Zona 4 Santanderes 1 y Zona 6 Santanderes 2

El documento de lectura territorial del municipio de Barrancabermeja se recibió el día 20 de mayo de 2.021 para los 6 puntos del municipio. En este documento se evidencia que no cumple con ninguno de los requisitos establecidos en el Apéndice B y que además este documento no fue revisado por la interventoría, por lo cual, el día 26 de mayo de 2.02, se devuelve con observaciones a la interventoría, reiterando que deben cumplir con los lineamientos solicitados en el Apéndice B y que en el momento en que los productos se envíen ENTerritorio ya deben venir aprobados por la interventoría.

El documento de lectura territorial de los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso para todos los puntos fue enviado a la interventoría el día 21 de mayo de 2.021 y se encuentra actualmente en revisión para enviar las observaciones respectivas al contratista por parte de interventoría.

- Grupo 2. Zona 1 Pacifico y Amazonia y Zona 7 Llanos Orientales y Andina

Durante el mes de mayo el contratista entrego a la Interventoría el documento de Lectura Territorial, del municipio de Popayán.

En cuanto al municipio de Pasto, el documento no cuenta con la Cartografía Social del punto 52001-004 ya que, en el momento de realizar el levantamiento de la información, la actividad tuvo que ser aplazada a causa del toque de queda decretado por el municipio a raíz de la situación de orden público. De esta manera, una vez la situación se normalice, se reprogramará la actividad de

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

Cartografía Social. Sin embargo, el documento enviado por parte del Contratista está en proceso de revisión de la Interventoría.

Por su parte, en los municipios de Guadalajara de Buga y Puerto Asís aún no se ha dado inicio a esta actividad.

- Grupo 3. Zona 2 Caribe y Zona 5 Antioquia y Eje Cafetero

Respecto al componente de Lectura Territorial del Grupo 3, se han desarrollado actividades que implican la ejecución de cartografías sociales con las comunidades de los puntos que se van a intervenir. Para ello, se hicieron reuniones presenciales en las que la comunidad dio a conocer y reconocer sus territorios y dinámicas sociales, como se muestra en la Ilustración 62.

**Ilustración 62 Mosaico de reuniones Lectura Territorial**

**Valledupar**



**Pasto**



**Popayán**



Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

### 6.5. Talleres pedagógicos de seguridad vial

Durante el mes de mayo, se realizaron los talleres pedagógicos que se relacionan en la Tabla 45.

Con el ánimo de resolver dificultades y dudas que podría tener la comunidad en cuanto a las normas y convenciones establecidas para la movilidad segura, se generaron espacios de sensibilización en buenas prácticas de seguridad vial, para así asegurar que la comunidad conozca y entienda la correcta utilización de los elementos que se tendrán luego de las intervenciones, buscando hacer de los ciudadanos agentes de cambio que posibiliten la apropiación y comprensión de la nueva infraestructura y, por tanto, del éxito de la obra. Para este caso, los primeros talleres se desarrollaron con niños, como se muestra en la Ilustración 63.

**Tabla 45 Talleres pedagógicos en seguridad vial**

Grupo	Zona	Talleres en seguridad vial
<b>Grupo 1</b>	Zona 3 Centro	Asistencia a 1 taller en seguridad vial para niños y niñas en Tunja.
	Zona 4 Santanderes 1	
	Zona 6 Santanderes 2	Asistencia a 1 taller en seguridad vial para adultos en Bucaramanga.
<b>Grupo 2</b>	Zona 1 Pacífico y Amazonía	En planeación
	Zona 7 Llanos Orientales y Andina	
<b>Grupo 3</b>	Zona 2	Asistencia a 2 talleres en seguridad vial para niños y niñas en Valledupar
	Zona 5	Asistencia a 2 talleres en seguridad vial para adultos en Valledupar.

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

**Ilustración 63 Talleres pedagógicos Valledupar**



**Taller Pedagógico de Seguridad Vial con Niños P20001-003**

**6.6. Campaña de socialización y comunicaciones para la implementación del “Carril preferencial para motos” en Neiva**

Los días 14 y 18 de mayo de 2.021 se llevaron a cabo mesas de trabajo entre el Componente de Gestión Social y Comunicaciones y el grupo de Comportamiento y motos de la ANSV, con el fin de realizar la revisión de la PPT a implementar en la capacitación con multiplicadores del ente territorial.

Una vez realizada dicha revisión y ajustes a la PPT, a partir de los aportes dados por cada una de las partes, se realizó la programación y coordinación de la capacitación con multiplicadores del ente territorial, la cual se llevaría a cabo el miércoles 19 de mayo de 2.021; sin embargo, no fue posible la realización de la misma por la situación de orden público presente en el municipio a causa del paro nacional.

**6.7. Metodología de evaluación de impactos**

A partir de la metodología de evaluación de impactos del componente de gestión social de PGO II, se inició el proceso de toma de información para construir la línea base que permitirá comparar los resultados antes y después de la implementación de las intervenciones en los puntos, para así determinar el impacto y los beneficios del programa desde la percepción de la comunidad.

Durante este periodo se realizaron las encuestas de los puntos que se relacionan en la Tabla 46.

**Tabla 46 PGO II-Puntos encuestados para línea base de la evaluación de impacto**

Zona PGO II	Municipio	Identificación del punto
2	Valledupar	20001-001
2	Valledupar	20001-002
2	Valledupar	20001-003
2	Valledupar	20001-004
2	Valledupar	20001-005
2	Valledupar	20001-006
3	Tunja	15001-002
3	Tunja	15001-003

Zona PGO II	Municipio	Identificación del punto
4	Bucaramanga	68001-001
4	Bucaramanga	68001-002
4	Bucaramanga	68001-003
4	Bucaramanga	68001-004
5	Medellín	05001-001
5	Medellín	05001-002
5	Medellín	05001-003
5	Medellín	05001-005
5	Medellín	05001-006
6	Barrancabermeja	68081-002
6	Barrancabermeja	68081-004
6	Barrancabermeja	68081-005
6	Barrancabermeja	68081-006
7	Neiva	41001-001

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

Adicionalmente, se elaboró un formato de tabulación de resultados de las encuestas que se anexa a este informe, que permite de manera ágil y organizada relacionar las respuestas de las personas entrevistadas e ir obteniendo los promedios por punto y por ente territorial en simultáneo.

Durante el periodo del presente informe, se tabularon la totalidad de las encuestas relacionadas en la Tabla 46

Anexo 06 II-210506\_Tabulación\_Encuesta\_Evaluación\_Impacto\_SOC

## 7. Área Ambiental y SST

Desde el componente se debe garantizar que en el desarrollo de las intervenciones de señalización, demarcación y entre otras, que se deriven del contrato, se realicen dentro de un marco de actuación respetuosa y amigable con el ambiente que no solo de cumplimiento a la normatividad si no que contemple el uso racional y sostenible de los recursos naturales y bienes de protección ambiental presentes en los espacios geográficos y/o en las zonas sujetas de intervención de forma continua y eficaz, con miras a mitigar, prevenir y compensar los impactos ambientales adversos derivados de los procesos adelantados.

Así mismo, realizar la supervisión al seguimiento que deben hacer las interventorías a la implementación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo y ambientales, propuestas y ofertadas por los contratistas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Plan de Manejo Ambiental (PMA) y demás productos contractuales; de tal manera que sus resultados garanticen el adecuado manejo de los impactos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de los contratos; con el fin de prevenir accidentes de Trabajo y enfermedades laborales, reducir los riesgos presentes en la zona de trabajo y garantizar acciones de mejoras si se requieren.

En este orden de ideas el avance para el mes de mayo en el componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST) se centraron en las siguientes actividades:

- Control y seguimiento a la entrega oportuna de los productos ambientales y SST a remitir por parte de los contratistas e interventoría.
- Revisión, verificación y emisión de conceptos a los productos y comunicados remitidos por interventorías.
- Seguimiento a obligaciones en seguridad y salud en el trabajo por parte de las interventorías en el desarrollo de sus contratos.
- Seguimiento a la Implementación de medidas de manejo ambiental, protocolo de bioseguridad y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), propuestas y ofertadas por los contratistas de obra.
- Asistencia y participación en reuniones de inicio y seguimiento

### 7.1. Control y seguimiento a la entrega oportuna de los productos ambientales y SST a remitir por parte de los contratistas e interventoría.

Durante el periodo del presente informe en el marco de las obligaciones contractuales se adelantaron actividades de control y seguimiento a la entrega oportuna de los productos ambientales y SST descritos en el numeral 5 del *APENDICE C ESPECIFICACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SST*, con el fin de conseguir una ejecución contractual en los términos y supuestos acordados en el contrato.

Es de tener en cuenta que los contratos de obra por su naturaleza y por disposición de la Entidad cuentan con interventorías, quienes son la encargada del seguimiento y control de los contratos de obra, en cumplimiento de los contratos de interventoría suscrito con la entidad.

A continuación, se presenta en la Tabla 47 el balance de las acciones realizadas:

**Tabla 47 Relación de requerimientos realizados - Ambientales y SST**

PGO II - COMPONENTE AMB_SST				
Actividad adelantada	Fecha	Grupo	Zona	Destinatario
Elaboración de oficio de Incumplimiento por entrega del PMA Z6 - G1, radicado 20212700081851.	05/05/2021	1	6	interventoría
Envío de llamado de atención a interventoría por incumplimiento en la entrega del PMA Z6 y numero de versiones del documento.	11/05/2021	1	6	Interventoría
Se elaboró oficio de llamado de atención por la entrega de productos fuera de los plazos contractuales.	19/05/2021	2	1	Interventoría
Se realizó llamado de atención vía correo electrónico por la inadecuada implementación del PMT y medidas de SST	19/05/2021	1	3	Interventoría
Diligenciamiento del archivo de seguimiento a los documentos de carácter ambiental para PGO II.	21/05/2021	1, 2 y 3	Todas	Supervisión
Elaboración de oficio de incumplimiento en la entrega oportuna de informes semanales y mensuales por parte de interventoría Grupo 2, radicado 20212700110141.	24/05/2021	2	Todas	Interventoría

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

## 7.2. Revisión, verificación y emisión de conceptos a los productos y comunicados remitidos por interventorías

Durante el periodo del presente informe se realizó el apoyo a todas las actividades del componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarias para la supervisión de los contratos de Interventoría y de obra suscritos con la entidad, con el fin que se ejecuten dando cumplimiento a los lineamientos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en el apéndice C y normatividad vigente que regula el tema.

Así las cosas, en cumplimiento a lo anterior, se informa que se adelantaron durante el periodo del presente informe las siguientes actividades de evaluación, control y seguimiento a las actividades y/o labores de carácter ambiental y SST en concordancia con las obligaciones de las interventorías y las actividades propuestas y programadas por los contratistas:

- Se realizó acompañamiento a las interventorías y contratistas y seguimiento telefónico para la atención de observaciones a los documentos presentado.
- Se realizó la revisión y emisión de observaciones a los documentos remitidos por interventoría.
- Se realizó seguimiento a la implementación de medidas y procedimientos propuestos por el contratista en el PMA y SG-SST.
- Se realizó seguimiento a las actividades y medidas de seguridad y salud en el trabajo implementadas en oficinas y puntos de intervención.
- Se verifico que la ejecución de las labores y/o actividades en temas de SST estuvieran acorde con el marco legal aplicable, las exigencias contractuales, los requerimientos y especificaciones definidas en las reglas de participación, apéndice C y demás documentos contractuales establecidos por la entidad para los contratos de interventoría y contratista.
- Se atendió oportunamente la correspondencia recibida por parte de las interventorías, emitiendo oficio y conceptos de repuesta, solicitud y requerimientos por incumplimiento.
- Se revisaron y observaron los informes semanales y mensuales del componente ambiental y SST remitidos vía correo electrónico por las interventorías, correspondientes al periodo de marzo y abril de 2021.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

- Con ocasión al inicio de actividades de intervención se evidencio que las interventorías realizaron seguimiento y control a la implementación y adopción de las medidas propuestas en los protocolos de bioseguridad presentados por los contratistas, verificando las siguientes medidas:
  - Uso adecuado de elementos de protección personal (EPP) y elementos de protección individual (EPI).
  - Toma de temperatura al ingreso al campamento
  - Encuesta de sintomatológica
  - Desinfección de superficial de ropa
  - Desinfección de manos con gel antibacterial y alcohol al 70% de concentración antes de iniciar labores
  - Limpieza y desinfección de área de trabajo
  - Lavado de manos

Así mismo, se efectuó la elaboración de conceptos técnicos de recibido, aprobación y observaciones respecto a los Planes de manejo ambiental (PMA), Plan de Gestión de RCD - PG-RCD, Plan de Residuos Peligrosos- PGIRP, Programa o sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (PGSST/SGSST), Protocolo de bioseguridad, informes semanales, mensuales, hojas de vida, documentos de vinculación, protocolos de bioseguridad, y demás productos allegados por las Interventorías y contratistas.

A continuación, se presenta en la Tabla 48, Tabla 49,

Tabla 50, Tabla 51 y Tabla 52 el balance de las acciones realizadas y el estado de los productos presentados, tanto por los contratistas como por las interventorías:

**Tabla 48 Estado de los productos ambientales y SST de los Contratistas**

Interventoría	N° contrato	zona	N° contrato	PMA, PG-RCD y PGIRP	SG-SST	Protocolo contratista	Doc. Vinculacion contratista
				Estado	Estado	Estado	Estado
CONSORCIO SEDIC PROYECTOS	2210030	3	2210021	Aprobado - Interventoría	Aprobado - Interventoría	Aprobado - Interventoría	Aprobado - Interventoría
		4	2210022	Recibido - Supervisión	Recibido - Supervisión	Recibido - Supervisión	
		6	2210024				
INCOPLAN	2210031	1	2210019	Aprobado - Interventoría	Aprobado - Interventoría	Aprobado - Interventoría	Aprobado - Interventoría
		7	2210025	Recibido - Supervisión	Recibido - Supervisión	Recibido - Supervisión	
CONSORCIO INTERVENTORÍA VIAL	2210032	3	2210020	Aprobado - Interventoría	Aprobado - Interventoría	Aprobado - Interventoría	Aprobado - Interventoría
		5	2210023	Recibido - Supervisión	Recibido - Supervisión	Recibido - Supervisión	

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

**Tabla 49 Estado de los informes mensuales ambientales y SST de los Contratistas**

Contratista	zona	N° contrato	Informe Mensual	
			N°	Estado
Unión Temporal Señalización Vial	3	2210021	1	observado - Interventoría
			2	observado - Interventoría
Servicios Especializados de Señalización	4	2210022	1	observado - Interventoría
			2	observado - Interventoría
Gestión Vial Integral SAS	6	2210024	1	observado - Interventoría
			2	observado - Interventoría
Consorcio Señalización Vial HIC	1	2210019	1	observado - Interventoría
			2	Sin entregar
Corseing SAS	7	2210025	1	observado - Interventoría
			2	Sin entregar
Consorcio Señalización Vial HIC	2	2210020	1	Aprobado - Interventoría
			2	observado - Interventoría
Señalcon S.A.S	5	2210023	1	Aprobado - Interventoría
			2	observado - Interventoría

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

**Tabla 50 Estado de los productos ambientales y SST de las Interventorías**

Interventoría	N° contrato	Protocolo	Documentos de vinculación
CONSOCIO SEDIC PROYECTOS	2210030	Aprobado - Supervisión	Aprobado - Supervisión
INCOPLAN	2210031	Aprobado - Supervisión	Aprobado - Supervisión
CONSORCIO INTERVENTORÍA VIAL	2210032	Aprobado - Supervisión	Aprobado - Supervisión

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

**Tabla 51 Estado de los informes mensuales de ambientales y SST de las Interventorías**

Grupo	Interventoría	N° contrato	Informes Mensuales	
			N°	Estado
1	CONSOCIO SEDIC PROYECTOS	2210030	1 v3	Aprobado
			2 v2	Observado
2	INCOPLAN	2210031	1 v2	observado
			2	Sin entregar
3	CONSORCIO INTERVENTORÍA VIAL	2210032	1 v3	Aprobado
			2 v2	Observado

**Tabla 52 Consolidado del estado de los informes ambientales y SST de las Interventorías**

Producto	Cantidad Presentados	Estado	
		Aprobados	observados
Informes Semanales	8	5	3
Informes Mensuales	5	2	3

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

### 7.3. Seguimiento a obligaciones en seguridad y salud en el trabajo por parte de las interventorías.

Teniendo en cuenta que las interventorías como empresas legalmente constituidas deben cumplir con las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo con las obligaciones contractuales se informa que durante el periodo se realizó seguimiento a los siguientes temas:

#### 7.3.1. Exámenes médicos ocupacionales.

Para el periodo del presente informe y en cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007, Se verificó que todo el personal de las interventorías hubiese presentado los respectivos los exámenes médicos ocupacionales (Ingreso y periódicos) del personal contratado para la ejecución de los contratos.

#### 7.3.2. Afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social Integral.

Durante el periodo del presente informe se verificó que todo el personal mínimo de las interventorías cumpliera con las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social.

Para el periodo las interventorías en los informes mensuales N° 1, remitieron el certificado de pago de parafiscales para el mes de marzo de 2021, debidamente firmado por el representante legal; en el cual, se certifica el aporte correspondiente al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Así mismo certifica el pago de salarios y/u honorarios, los certificados indican el nombre, cargo y numero de documento de los trabajadores activos durante el mes de marzo.

Para el caso del personal vinculado por prestación de servicios se certifica que se adelantó la verificación y cumplimiento de la realización de los aportes relativos a EPS y AFP.

En la siguiente tabla, se relaciona el número de trabajadores por interventoría aprobado por ENTerritorio; el cual, es requisito para la ejecución de los contratos según lo dispuesto en las reglas de participación y anexo técnico.

**Tabla 53 Número de trabajadores de las Interventorías**

Grupo	N° contrato	Interventoría	N° Trabajadores
1	2210030	CONSOCIO SEDIC PROYECTOS	14
2	2210031	INCOPLAN	10
3	2210032	CONSORCIO INTERVENTORÍA VIAL	13

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**7.4. Seguimiento a la Implementación de medidas de manejo ambiental en el PMA, protocolo de bioseguridad y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), propuestas y ofertadas por los contratistas de obra.**

El objetivo fundamental de la implementación de las medidas propuestas por los contratistas en el SG-SST, PMA y protocolos de bioseguridad aprobados por las interventorías, es garantizar que en el desarrollo de los contratos de obras se adopten las acciones preventivas y de control necesarias frente a los riesgos de origen laboral existentes y a los riesgos potenciales de afectación a los bienes de protección ambiental, que aseguren el bienestar de todas las partes involucradas, evitando daños a la propiedad, al ambiente y a la salud de los trabajadores.

Por lo anterior y en el marco del seguimiento y control realizado por las interventorías en el periodo se observó la implementación de las siguientes medidas:

**7.4.1. Medidas implementadas en seguridad y salud en el trabajo**

Durante el mes de mayo y con ocasión al inicio de las obras de intervención en las zonas 2 Caribe, 3 Centro, 4 Santanderes 1 y 6 Santanderes 2, se evidencia que los contratistas realizaron:

- Instalación de señalización preventiva de oficinas y/o bodegas y adquisición de kit de emergencia (Extintor, camilla y botiquín de primeros auxilios).



**Localización:** Zona 2 Caribe - Valledupar Cto. 2210020 Consorcio Señalización Vial HIC



**Localización** Zona 4 Santanderes 1 Bucaramanga Cto 2210022 Servicios Especializados de Señalización

<b>Localización</b>	<b>Zona 6 Santanderes 2 Barrancabermeja Cto 2210024 Consorcio Sedic Proyectos</b>

- Los contratistas adelantaron las inducciones y socializaciones con el personal operativo, sobre los procedimientos seguros en las áreas SST y MA y protocolo de bioseguridad para prevención de contagio por COVID 19.

<b>Localización:</b>	<b>Zona 2 Caribe - Valledupar Cto. 2210020 Consorcio Señalización Vial HIC</b>

<b>Localización</b>	<b>Zona 3 Caribe - Tunja Cto. 2210021 Unión Temporal Señalización Vial</b>

<b>Localización</b>	<b>Zona 4 Santanderes 1 Bucaramanga Cto 2210022 Servicios Especializados de Señalización</b>

	
<b>Localización</b>	<b>Zona 6 Santanderes 2 Barrancabermeja Cto 2210024 Consorcio Sedic Proyectos</b>

- Uso adecuado de elementos de protección personal e indumentaria de cuadrillas

	
<b>Localización</b>	<b>Zona 2 Caribe - Valledupar Cto. 2210020 Consorcio Señalización Vial HIC</b>

	
<b>Localización</b>	<b>Zona 3 Caribe - Tunja Cto. 2210021 Unión Temporal Señalización Vial</b>

	
<b>Localización</b>	<b>Zona 4 Santanderes 1 Bucaramanga Cto 2210022 Servicios Especializados de Señalización</b>



**Localización**

**Zona 6 Santanderes 2 Barrancabermeja Cto 2210024 Consorcio Sedic Proyectos**

- Pausas activas y Suministro de hidratación al personal



**Localización**

**Zona 2 Caribe - Valledupar Cto. 2210020 Consorcio Señalización Vial HIC**



**Localización**

**Zona 4 Santanderes 1 Bucaramanga Cto 2210022 Servicios Especializados de Señalización**



**Localización**

**Zona 6 Santanderes 2 Barrancabermeja Cto 2210024 Consorcio Sedic Proyectos**

- Implementación de protocolo de bioseguridad, usos de topa bocas, desinfección de manos y registro de sintomatología.



**Localización** Zona 2 Caribe - Valledupar Cto. 2210020 Consorcio Señalización Vial HIC



**Localización** Zona 3 Caribe - Tunja Cto. 2210021 Unión Temporal Señalización Vial



**Localización** Zona 4 Santanderes 1 Bucaramanga Cto 2210022 Servicios Especializados de Señalización



**Localización** Zona 6 Santanderes 2 Barrancabermeja Cto 2210024 Consorcio Sedic Proyectos

- La interventoría informa que en el periodo **no se presentaron accidentes ni incidentes laborales** del personal de los contratistas ni de interventoría.

**7.4.2. Medidas de manejo ambiental**

En cumplimiento a lo propuesto en los planes de manejo ambiental los contratistas durante el mes de mayo y con ocasión al inicio de las obras de intervención en las zonas 2 Caribe, 3 Centro, 4 Santanderes 1 y 6 Santanderes 2, realizaron:

- Manejo de residuos sólidos: Contempla las acciones de separación en la fuente (uso de bolsas y/o canecas de colores), recolección y almacenamiento temporal en bodegas de RCD, material reutilizable, material reciclable y residuos peligrosos que se generaron dentro de los procesos de obra adelantados en el mes de mayo para realizar una adecuada disposición final con gestores autorizados.

	
<b>Localización</b>	<b>Zona 2 Caribe - Valledupar Cto. 2210020 Consorcio Señalización Vial HIC</b>
	
<b>Localización</b>	<b>Zona 3 Caribe - Tunja Cto. 2210021 Unión Temporal Señalización Vial</b>
	
<b>Localización</b>	<b>Zona 4 Santanderes 1 Bucaramanga Cto 2210022 Servicios Especializados de Señalización</b>



**Localización**

**Zona 6 Santanderes 2 Barrancabermeja Cto 2210024 Consorcio Sedic Proyectos**

- Actividades de orden, aseo y limpieza de las áreas intervenidas



**Localización**

**Zona 2 Caribe - Valledupar Cto. 2210020 Consorcio Señalización Vial HIC**



**Localización**

**Zona 3 Caribe - Tunja Cto. 2210021 Unión Temporal Señalización Vial**



**Localización**

**Zona 4 Santanderes 1 Bucaramanga Cto 2210022 Servicios Especializados de Señalización**



Para el periodo la interventoría informa que no fue necesario la implementación de medidas de manejo y protección de estructuras hidráulicas (sumideros, cunetas, y/o canales) ni individuos arbóreos; toda vez que ninguna de las intervenciones y actividades realizadas por los contratistas generaban riesgo potencial de afectación a estos 2 bienes de protección ambiental.

#### 7.4.3. Seguimiento a tramites ambientales

Para el periodo del presente informe el contratista de **Zona 4** Santanderes 1 Servicios Especializados de Señalización contrato 2210022, informo que se encuentra tramitando ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, permiso de poda de altura para la intervención de alrededor de 34 individuos arbóreos (I.A.) que se encuentran ubicados en los siguientes puntos; dado que estos individuos interfieren con las actividades de cambio de malla peatonal urbanística que tendrán una altura mínima de 2,08 metros.

**Tabla 54 Número de trabajadores de las Interventorías**

Municipio	Identificación del punto	Tramo o intersección
Bucaramanga	68001-001	Calle 45 entre Barrio Quinta Estrella y Anillo Vial
	68001-002	Av. Metropolitana entre Carrera 2A y Carrera 14
	68001-003	Diagonal 15 entre Calle 55 y Calle 45

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

- Individuos arbóreos que serán objeto de poda aérea.



Algunas de las especies a podar son Guayacán y Oití

### 7.5. Asistencia y participación en reuniones

Durante el periodo se realizó acompañamiento durante los comités de seguimiento y mesas de trabajo, con el fin de resolver inquietudes u orientar al constructor, al interventor sobre el alcance de temas y productos del componente ambiental y SST.

En la Tabla 55 se relacionan las reuniones adelantadas durante el periodo:

**Tabla 55 Reuniones PGO II – Componente ambiental y SST**

Reuniones adelantadas - COMPONENTE AMB _SST					
N°	Fecha	Grupo	zona	Tipo	Participantes
1	04/05/2021	3	2_Caribe	Comité de seguimiento	Interventoría Contratistas ENTerritorio
2	04/05/2021	2	1_Pacifico - Amazonia	Comité de seguimiento	
3	04/05/2021	2	7_Llnos Orient. - Central	Comité de seguimiento	
4	04/05/2021	3	5 Eje Cafetero -Antioquia	Comité de seguimiento	
5	06/05/2021	1	3_Centro	Comité de seguimiento	
6	07/05/2021	1	4_Santanderes 1	Comité de seguimiento	
7	07/05/2021	3	6_Santanderes 2	Comité de seguimiento	
8	11/05/2021	3	2_Caribe	Comité de seguimiento	
9	11/05/2021	3	5 Eje Cafetero -Antioquia	Comité de seguimiento	
10	11/05/2021	2	1_Pacifico - Amazonia	Comité de seguimiento	
11	11/05/2021	2	7_Llnos Orient. - Central	Comité de seguimiento	
12	13/05/2021	1	3_Centro	Comité de seguimiento	
13	14/05/2021	1	4_Santanderes 1	Comité de seguimiento	
14	14/05/2021	3	6_Santanderes 2	Comité de seguimiento	
15	14/05/2021	3	2_Caribe	Comité de seguimiento	
16	14/05/2021	1	3_Centro	Comité de seguimiento	
17	18/05/2021	3	2_Caribe	Comité de seguimiento	
18	18/05/2021	3	5 Eje Cafetero -Antioquia	Comité de seguimiento	
19	18/05/2021	2	1_Pacifico - Amazonia	Comité de seguimiento	
20	18/05/2021	2	7_Llnos Orient. - Central	Comité de seguimiento	

Reuniones adelantadas - COMPONENTE AMB_SST						
N°	Fecha	Grupo	zona	Tipo	Participantes	
21	20/05/2021	1	3_Centro	Comité de seguimiento		
22	21/05/2021	1	4_Santanderes 1	Comité de seguimiento		
23	21/05/2021	3	6_Santanderes 2	Comité de seguimiento		
24	25/05/2021	3	2_Caribe	Comité de seguimiento		
25	25/05/2021	3	5 Eje Cafetero -Antioquia	Comité de seguimiento		
26	25/05/2021	2	1_Pacifico - Amazonia	Comité de seguimiento		
27	25/05/2021	2	7_Llnos Orien. - Central	Comité de seguimiento		
28	26/05/2021	1	3_Centro	Comité de seguimiento		
29	27/05/2021	3	5 Eje Cafetero -Antioquia	Comité de seguimiento		
30	28/05/2021	1	4_Santanderes 1	Comité de seguimiento		
31	28/05/2021	3	6_Santanderes 2	Comité de seguimiento		
1	03/05/2021	3	2_Caribe	Mesa de Trabajo		Interventoría - Contratistas ENTerritorio
2	06/05/2021	1	Z3, Z4, Z6	Mesa de Trabajo		
3	12/05/2021	NA	NA	Mesa de trabajo Interna		
4	26/05/2021	3	2 Caribe, 55 Eje Caf-Antio	Mesa de Trabajo		
1	10/05/2021	3	2_Caribe	Reunión de inicio	Interventoría - Contratistas ENTerritorio, comunidad	

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

## 8. Informe jurídico

En esta sección se presentan los aspectos de orden jurídico que son determinantes para el desarrollo del Contrato Interadministrativo, principalmente los relacionados con las adquisiciones del proyecto, que se materializarán bajo la figura de contratación derivada. También incluye los elementos relacionados con la gestión contractual del Contrato Interadministrativo, y naturalmente, presenta los avances en el análisis normativo que requiera la ejecución del contrato

### 8.1. Actividades en procesos de selección

#### 8.1.1. Programa Pequeñas Grandes Obras II- PGO II

De los contratos objeto del proceso de contratación CAB-008-2020 en el mes de mayo se presenta el siguiente estado contractual:

**Tabla 56. Actividades de apoyo a la supervisión**

Grupo	No. Zona	Zona	Contratista	No. Contrato	Fecha firma de contrato	Suscripción acta De inicio	Fecha de Aprobación garantía según acta de inicio	Fecha De Terminación	Nueva fecha De Terminación de acuerdo con suspensión
G1	3	Central	Unión Temporal Señalización Vial	2210021	5/02/2021	11/03/2021	16/03/2021	23/07/2021	N/A
	4	Santanderes 1	Servicios Especializados De Señalización Ltda.	2210022	3/02/2021	11/03/2021	23/03/2021	23/07/2021	N/A
	6	Santanderes 2	Gestión Vial Integral SAS	2210024	4/02/2021	11/03/2021	17/03/2021	23/07/2021	N/A
G2	1	Pacífico Y Amazonía	Consortio Señalización Vial Hic	2210019	8/02/2021	9/03/2021	16/03/2021	21/07/2021	21/08/2021
	7	Llanos Orientales Y Andina	Corseing Sas	2210025	4/02/2021	9/03/2021	15/03/2021	21/07/2021	21/08/2021
G3	2	Caribe	Consortio Señalización Vial Hic	2210020	5/02/2021	10/03/2021	18/03/2021	22/07/2021	N/A
	5	Eje Cafetero Y Antioquia	Señalizaciones Y Construcciones S.A.S – Señalcon S.A.S	2210023	3/02/2021	10/03/2021	6/04/2021	22/07/2021	N/A

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

\*Se precisa que de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.4 de las reglas de participación del proceso CAB-008-2020: El plazo de ejecución de los Contratos se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 219143. En caso de que dicho contrato interadministrativo no sea prorrogado, esta circunstancia se entenderá por cumplida y el

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

*contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del contrato interadministrativo No. 219143; situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de los CONTRATISTAS, salvo aquellos efectivamente causados hasta la fecha de acaecimiento de la condición.*

### **SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 2210019 Y 2210025:**

**2210019:** Mediante oficio COM-019-ZONA 1 del 24 de mayo de 2021, el contratista de obra Consorcio Señalización Vial HIC, solicitó la suspensión del contrato aduciendo que con ocasión del paro nacional que el país viene afrontando desde el día 28 de abril de 2021, se ha imposibilitado la movilización de materiales y personal a los sitios de obra, la realización de reuniones presenciales para el inicio de las obras y las labores de divulgación del proyecto. Por lo anterior, solicitó a la interventoría que se considerara la suspensión del proyecto por el término de un (1) mes a partir del 28 de mayo de 2021.

Continuando con lo anterior, mediante comunicación 2021-449-ISV-1611 con radicado Enterritorio No. 20214300181042 del 25 de mayo de 2021, la interventoría ejercida a través del contrato No. 2210031- Ingeniería, Consultoría y Planeación S.A. INCOPLAN S.A, presentó a Enterritorio solicitud de suspensión del contrato de interventoría y los contratos de obra No. 2210019 y 2210025 por el término de un (1) mes o hasta que se superen los motivos que dan lugar a la solicitud.

Finalmente, la supervisora Ester Lucía Lemos Andrade a través de oficio No. 20212700097311 del 25 de mayo de 2021, conceptuó sobre la solicitud de suspensión de los contratos de obra No. 2210019 y 2210025 y el contrato de interventoría No. 2210031, considerando procedente la suspensión por el término de un (1) mes a partir del día 28 de mayo de 2021, o antes si se superan los motivos que dan origen a la solicitud de suspensión.

La suspensión quedó en firme en la plataforma secop II el día 28 de mayo de 2021, mediante la referencia de modificación No. CO1.CTRMOD.6084002.

**2210025:** Mediante oficio 40-21 del 20 de mayo de 2021, el contratista de obra Corseing S.A.S, solicitó la suspensión del contrato aduciendo que acuerdo con sus oficios 35 y 39 y a lo manifestado en el comité de obra del 18 de mayo de 2021, se consideró que las diferentes circunstancias que se vienen presentando a nivel nacional relacionadas con el paro, están afectando el desarrollo de la obra, debido a que varios de sus proveedores han manifestado desabastecimiento de la materia prima, además de la dificultad presentada para el traslado de personal, materiales y equipos de trabajo a los lugares en que deben realizarse los trabajos de implementación. Por lo anterior, solicitó a la interventoría que se considerara la suspensión del proyecto por el término de un (1) mes a partir del 28 de mayo de 2021.

Continuando con lo anterior, mediante comunicación 2021-449-ISV-1611 con radicado Enterritorio No. 20214300181042 del 25 de mayo de 2021, la interventoría ejercida a través del contrato No. 2210031- Ingeniería, Consultoría y Planeación S.A. INCOPLAN S.A, presentó a Enterritorio solicitud de suspensión del contrato de interventoría y los contratos de obra No. 2210019 y 2210025 por el término de un (1) mes o hasta que se superen los motivos que dan lugar a la solicitud.

Finalmente, la supervisora Ester Lucía Lemos Andrade a través de oficio No. 20212700097311 del 25 de mayo de 2021, conceptuó sobre la solicitud de suspensión de los contratos de obra No. 2210019 y 2210025 y el contrato de interventoría No. 2210031, considerando procedente la suspensión por el término de un (1) mes a partir del día 28 de mayo de 2021, o antes si se superan los motivos que dan origen a la solicitud de suspensión.

La suspensión quedó en firme en la plataforma secop II el día 28 de mayo de 2021, mediante la referencia de modificación No. CO1.CTRMOD.6086821.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

Paralelo a lo señalado, desde el componente jurídico se apoyó la labor de los profesionales designados para la supervisión de los contratos de interventoría, en la proyección de los oficios y requerimientos a elevar tanto a los contratistas de obra como a las áreas transversales e incluso a entidades externas, los cuales se detallan a continuación:

**Tabla 57. Actividades de apoyo a la supervisión**

No.	Destinatario	Contrato	No. Radicado	Fecha	Asunto
1	Contratista Zona 5	2210023	20212700082451	6/05/2021	Entrega planos de señalización del municipio de Dosquebradas
2	Fiduciaria Popular	219143	20212700080281	3/05/2021	Respuesta a fiduciaria sobre datos de interventoría para desembolso de anticipo
3	Subgerencia de Operaciones	219143	20212700084383	26/05/2021	Solicitud de aprobación contrato de fiducia para anticipo Zona 1

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

### 8.1.2. Programa Pequeñas Grandes Obras II- PGO II – Interventoría

Los contratos objeto del proceso de contratación CME -023-2020 para el mes de mayo presentan el siguiente estado contractual:

**Tabla 58. Estado contratos proceso CME-023-2020**

Grupo	No. Zona	Zona	Contratista	No. Contrato	Fecha firma de contrato	Suscripción acta de inicio	Fecha de Aprobación garantía según acta de inicio	Fecha De Terminación	Nueva fecha De Terminación de acuerdo con suspensión
G1	3	Central	Consorcio sedic proyectos	2210030	5/02/2021	11/03/2021	25/03/2021	23/07/2021	N/A
	4	Santanderes 1							
	6	Santanderes 2							
G2	1	Pacífico Y Amazonía	Incoplan	2210031	4/02/2021	9/03/2021	23/03/2021	21/07/2021	21/08/2021
	7	Llanos orientales Y andina							
G3	2	Caribe	Consorcio interventoría vial	2210032	4/02/2021	10/03/2021	30/03/2021	22/07/2021	N/A
	5	Eje cafetero y Antioquia							

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

*\*Se precisa que de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.4 de las reglas de participación del proceso CME-023-2020: El plazo de ejecución de los Contratos se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 219143. En caso de que dicho contrato interadministrativo no sea prorrogado, esta circunstancia se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del contrato interadministrativo No. 219143; situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de los CONTRATISTAS, salvo aquellos efectivamente causados hasta la fecha de acaecimiento de la condición.*

### SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2210031:

**2210031:** El día 25 de mayo de 2021, mediante comunicación 2021-449-ISV-1611 con radicado Enterritorio No. 20214300181042, la firma de interventoría Ingeniería, Consultoría y Planeación INCOPLAN S.A, indica que de conformidad con las solicitudes presentadas por los contratistas de obra de las zonas 1 y 7 y dadas las situaciones generadas con ocasión del paro nacional: Marchas, manifestaciones, cierres de vías, movilizaciones, cierres de las Ciudades y Municipios; se ha imposibilitado la movilización de materiales y personal a los sitios de obra, realización de reuniones presenciales para inicio de las obras, labores de divulgación del proyecto etc. Por lo anterior, consideró inminente la suspensión de los contratos de interventoría y obra de las zonas 1 y 7, por el término de un (1) mes a partir del 28 de mayo de 2021, o hasta que se superen los motivos que dan lugar a la presente solicitud.

El día 25 de mayo de 2021, mediante oficio No. 20212700097311, la supervisora Ester Lucía Lemos Andrade, conceptuó sobre la solicitud de suspensión de los contratos de obra No. 2210019 y 2210025 y el contrato de interventoría No. 2210031, considerando procedente la suspensión por el término de un (1) mes a partir del día 28 de mayo de 2021, o antes si se superan los motivos que dan origen a la solicitud de suspensión.

El día 28 de mayo de 2021, la suspensión quedó en firme en la plataforma Secop II, mediante la referencia de modificación No. CO1.CTRMOD.6082894.

Paralelo a lo señalado, desde el componente jurídico se apoyó la labor de los profesionales designados para la supervisión de los contratos de interventoría, en la proyección de los requerimientos a elevar a los contratistas, los cuales se detallan a continuación:

**Tabla 59. Actividades de apoyo a la supervisión**

No.	Destinatario	Nombre	Contrato	No. Radicado	Fecha	Asunto
1	Interventoría Grupo 1	Consortio Sedic proyectos	2210030	20212700081851	05/05/2021	Incumplimiento en la entrega y aprobación del PMA contrato 2210024 zona Santanderes 2.
2				20212700084831	11/05/2021	Aprobación del Informe Mensual N°1 V.2 de Interventoría.
3				20212700086521	12/05/2021	Solicitud aplicación de encuestas para metodología de evaluación de impactos- Gestión Social
4				20212700090071	14/05/2021	Solicitud informe estado del proyecto.
5				20212700094181	19/05/2021	Respuesta sobre solicitud aplicación de encuestas para metodología de evaluación de impactos- Gestión Social

No.	Destinatario	Nombre	Contrato	No. Radicado	Fecha	Asunto
1	Interventoría Grupo 2	Incoplan S.A.	2210031	20212700085801	12/05/2021	Respuesta sobre solicitud Suspensión Contrato de Obra 2210025
2				20212700086541	12/05/2021	Observaciones ajuste de diseños contrato 2210025
3				20212700085821	12/05/2021	Solicitud aplicación de encuestas para metodología de evaluación de impactos- Gestión Social
4				20212700086781	12/05/2021	Aprobación Protocolo de bioseguridad Interventoría.
5				20212700094521	19/05/2021	Respuesta sobre solicitud aplicación de encuestas para metodología de evaluación de impactos- Gestión Social
6				20212700096531	24/05/2021	Puntos a intervenir en el Municipio de Popayán - contrato 2210025
7				20212700110141	24/05/2021	Incumplimiento en la entrega oportuna de informes semanales y mensuales de interventoría.
8				20212700096521	24/05/2021	Respuesta a solicitud Suspensión Contratos de Obra e interventoría
9				20212700110101	28/05/2021	Observaciones al Informe Mensual N°1 V.2
10				20212700110171	29/05/2021	Incumplimiento en entrega de productos dentro de los tiempos contractuales Contrato 2210019.

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

No.	Destinatario	Nombre	Contrato	No. Radicado	Fecha	Asunto
1	Interventoría Grupo 3	Consorcio Interventoría vial I	2210032	20212700086621	12/05/2021	Solicitud aplicación de encuestas para metodología de evaluación de impactos- Gestión Social
2				20212700086861	12/05/2021	Respuesta a solicitud de información para la georreferenciación de los planos récord.
3				20212700093911	19/05/2021	Respuesta sobre solicitud aplicación de encuestas para metodología de evaluación de impactos- Gestión Social
4				20212700095151	20/05/2021	Justificación presupuestos aprobados diseños municipios de Valledupar.
5				20212700095681	21/05/2021	Observaciones al Informe Mensual N°2 V1 de Interventoría

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

No.	Destinatario	Nombre	Contrato	No. Radicado	Fecha	Asunto
6				20212700108801	27/05/2021	Posible incumplimiento de obligaciones contractuales.
7				20212700109051	27/05/2021	Solicitud de informe detallado acerca de la implementación de señalización vial en el municipio de Valledupar Punto 20001-002

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

### 8.1.3. Programa Pequeñas Grandes Obras III - PGO III – Consultoría Diseño

De los contratos objeto del proceso de contratación CME-026-2020 se mantiene la información reportada en el mes de abril, con el siguiente estado:

**Tabla 60. Estado contratos proceso CME-026-2020**

Grupo	No. Zona	Zona	Firma	No. Contrato	Fecha firma de contrato	Acta de inicio	Fecha De Terminación
<b>G1</b>	1	Central	Consorcio sp - PGO III	22100500	17/02/2021	Pendiente de la selección de interventoría	<b>Pendiente</b>
	2	Santanderes 1	Consorcio sp - PGO III	2210051	17/02/2021	Pendiente de la selección de interventoría	<b>Pendiente</b>

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

De los contratos objeto de los procesos de contratación Abierta - INA-005-2021 zona Centro Oriente del país e Invitación Abierta - INA-006-2021 zona Centro Norte del país, se mantiene la información reportada en el mes de abril, con el siguiente estado:

Proceso INA-005-2021 zona Centro Oriente:

Grupo	No. Zona	Zona	Firma	No. Contrato	Fecha firma de contrato	Acta de inicio	Fecha De Terminación
<b>G2</b>	4	Centro oriente	Señales Ltda.	2210156	15/04/2021	Pendiente de la selección de interventoría	<b>Pendiente</b>

Proceso INA-006-2021 zona Centro Norte:

Grupo	No. Zona	Zona	Firma	No. Contrato	Fecha firma de contrato	Acta de inicio	Fecha De Terminación
<b>G2</b>	3	Centro norte	Señales Ltda.	2210179	15/04/2021	Pendiente de la selección de interventoría	<b>Pendiente</b>

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

En razón a lo expuesto, el siguiente cuadro resume el consolidado de los contratos para el programa PGO III – Diseño, así:

**Tabla 61. Consolidado contratos Programa PGO III- Diseños.**

Grupo	No. Zona	Zona	Firma	No. Contrato	Fecha firma de contrato	Acta de inicio	Fecha De Terminación
<b>G1</b>	<b>1</b>	Central	Consortio sp - PGO III	22100500	17/02/2021	Pendiente de la selección de interventoría	<b>Pendiente</b>
	<b>2</b>	Santanderes 1	CONSORCIO SP - PGO III	2210051	17/02/2021	Pendiente de la selección de interventoría	<b>Pendiente</b>
<b>G2</b>	<b>3</b>	Centro norte	Señales Ltda.	2210179	15/04/2021	Pendiente de la selección de interventoría	<b>Pendiente</b>
	<b>4</b>	Centro Oriente	Señales Ltda.	2210156	15/04/2021	Pendiente de la selección de interventoría	<b>Pendiente</b>

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

#### **8.1.3.1. Proceso INA -007-2021 Interventoría Diseños**

La Invitación Abierta INA-007-2021 Interventoría, fue declarada fallida de conformidad con el Acta de Declaratoria de Fallido del proceso del 7 de abril de 2021, tal como fue reportado en el informe del mes de abril.

#### **8.1.3.2. Proceso Invitación Oferentes Preseleccionados IOP-004-2021**

Dada la declaratoria de fallido del proceso INA-007-2021 del 7 de abril de 2021 y de conformidad con el concepto de la firma Arrieta Mantilla y Asociados, se informó a la Gerencia de Unidad y del Convenio que se debería dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 35.11 -Declaratoria de fallido, lo cual fue previamente socializado con la ANSV en mesa de trabajo adelantada el día 27 de abril de 2021, así:

1. El día 28 de abril de 2021 en cumplimiento de lo anterior, se radicó ante el grupo de Planeación contractual el formato de Documento de Planeación Componente 1 - Caracterización de la necesidad F-PR-26.
2. El día 29 de abril de 2021 se recibe el Documento de Condiciones Adicionales - Componente No. 2 del Documento de Planeación (Formato F-PR-27).
3. El día 30 de abril se radica ante el grupo de procesos de selección la solicitud No. 931 – 2021 y anexos, mediante la cual se solicita la apertura del proceso Oferentes Pre-Seleccionados.
4. El 04 de mayo de 2021 se publica en la plataforma SECOP II la invitación **IOP-004-2021** cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL, JURÍDICA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL DENTRO DEL PROGRAMA PEQUEÑAS GRANDES OBRAS PGO III PARA CUATRO ZONAS DEL PAÍS” y se publica el cronograma del proceso así:

**Tabla 62 Cronograma del proceso IOP-004-2021**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha Estimada</b>	<b>Lugar</b>
<b>Publicación de los términos y condiciones del proceso de selección en la Plataforma SECOP II.</b>	04/05/2021	SECOP II
<b>Plazo para presentar Observaciones a los términos y condiciones.</b>	Término de tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de los documentos del proceso. 7 DE MAYO DE 2021	SECOP II
<b>Respuesta a las observaciones de los términos y condiciones.</b>	Dentro de los DOS (02) días hábiles siguientes a la fecha del Plazo para presentar observaciones a los términos y condiciones. 11 DE MAYO DE 2021	SECOP II
<b>Plazo máximo para la expedición de Adendas</b>	DOS (02) días antes de la fecha máxima establecida en el Cronograma para la recepción de ofertas. 12 DE MAYO DE 2021	SECOP II
<b>Cierre de recepción de ofertas</b>	Desde la publicación de los Documentos del Proceso de Selección hasta ocho (8) días hábiles siguientes a su publicación. 14 DE MAYO DE 2021 A las 3:00 p.m.	SECOP II
<b>VERIFICACIÓN DE REQUISITOS</b>		
<b>Verificación y publicación de Cumplimiento de Requisitos de preselección</b>	Dentro de los DOS (02) días hábiles siguientes a la fecha prevista para el cierre del término para presentar ofertas. 19 DE MAYO DE 2021	SECOP II
<b>Término Para Presentar las observaciones y subsanaciones.</b>	Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes al término que antecede. 24 DE MAYO DE 2021	SECOP II
<b>Publicación Informe de respuestas a las observaciones, informe de preselección y lista de oferentes preseleccionados (si la lista de oferentes es menor a dos (2) oferentes se publicará también el Acta de Declaratoria de Fallida).</b>	Dentro de UN (01) días hábil siguiente al vencimiento del término para presentar aclaraciones. 25 DE MAYO DE 2021	SECOP II
<b>Publicación del Informe Preliminar</b>	Dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes al término de Publicación de la lista de oferentes preseleccionados 27 DE MAYO DE 2021	SECOP II

Actividad	Fecha Estimada	Lugar
<b>Término Para Presentar las observaciones y subsanaciones.</b>	Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes al término que antecede. 1 DE JUNIO DE 2021	SECOP II
<b>Evaluación de la oferta económica</b>	Al día hábil siguiente al término Para Presentar las observaciones y subsanaciones. 2 DE JUNIO DE 2021	SECOP II
<b>Publicación del Informe Final y de Recomendación</b>	4 DE JUNIO DE 2021	SECOP II
<b>Acta de Selección o Fallido y Publicación.</b>	Dentro del día hábil siguiente a la publicación del Informe de Recomendación. 8 DE JUNIO DE 2021	SECOP II
<b>CONTRATO</b>		
<b>Entrega de documentación requerida por parte del oferente seleccionado</b>	Dentro de los DOS (02) días hábiles siguientes a la publicación del Acta de Selección. 10 DE JUNIO DE 2021	SECOP II
<b>Firma del Contrato</b>	11 DE JUNIO DE 2021	SECOP II
<b>Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual</b>	Dentro del día hábil siguiente a la firma del contrato 15 DE JUNIO DE 2021	SECOP II

*Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.*

5. En desarrollo del referido cronograma y dentro del plazo para presentar Observaciones a los términos y condiciones, a las 4:28 p.m. se recibe observación por parte de CONSULTCIVIL SAS y solicitud de aclaración a los términos de la firma Proyectos y construcciones viales PIV INGENIERIA SAS.
6. El día 11 de mayo de 2021 se publica respuesta a las observaciones por parte del grupo de procesos de selección.
7. El día 14 de mayo de 2021, a las 3:00 p.m., se estableció como fecha de recepción de ofertas, de conformidad con lo establecido en Anexo 2 Cronograma del Proceso IOP-004-2021, habiéndose registrado OCHO (8) ofertas.

El orden de ofertas registradas en la Plataforma SECOP II fue la siguiente:

**Tabla 63 Proceso IOP-004-2021 ofertas registradas**

No.	Nombre O Razón Social Del Oferente	Integrantes Y %	Fecha Y Hora De Presentación	Garantía De Seriedad De La Oferta
1	Proyectos Construcciones Civiles Y Viales S.A.S	N/A	14/05/2021 9:17 Am	11-45-101102809 Seguros Del Estado
2	Consorcio Sedic Proyectos	Sedic Consulting S.A.S (51.00%) La Consultora S.A.S (49.00%) (Antes Mur Proyectos) Interventoría Grupo I PGOII	14/05/2021 12:45 Pm	65-45-101068364 Seguros Del Estado
3	Consorcio 004 Interventores Terra Pc	Pedro José Corredor Becerra (50.00%) Terra Ingenieros Civiles SAS (50.00%)	14/05/2021 1:18 Pm	51-45-101005911 Seguros Del Estado
4	Acinco	N/A	14/05/2021 2:23 Pm	4110013302 Segurexpo Bancoldex - Cesce
5	Consorcio Seguridad Vial	Organización Luis Fernando Romero Sandoval Ingenieros Sas (60.00%) Empresas Grupo Romero Sas (40.00%)	14/05/2021 2:44 Pm	Csc-1000844 Seguros Mundial
6	Consorcio Interventoría Vial	Arquitectura E Ingeniería De Consulta S.A.S. (49.00%) Jasen Consultores S.A.S. (51.00%)	14/05/2021 2:45 Pm	21-45-101331141 Seguros Del Estado
7	Consorcio Ingestone	Freestone Construcciones Sas (33.00%) Ferreria S.A.S. (33.00%) (Ingesuelos De Colombia Limitada (34.00%))	14/05/2021 2:49 Pm	11-45-101102958 Seguros Del Estado
8	CONSORCIO INCOL-ALEPH	ALEPH INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. (60.00%) INCOL S.A. (40.00%)	14/05/2021 2:50 PM	430-47-994000052019 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

8. El día 19 de mayo de 2021 se publicó el informe de verificación de Requisitos de preselección, de acuerdo con los criterios de preselección establecidos en el Documento de Términos y condiciones en su numeral 5.4, se lista a continuación lo establecido en el informe frente a los requisitos de preselección para el proceso:

**Tabla 64 Verificación de Requisitos de preselección Proceso IOP-004-2021**

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Nombre O Razón Social Del Interesado		Cumplimiento DeRequisito De Preselección
1	Proyectos Construcciones Civiles Y Viales S.A.S. Piv Ingeniería S.A.S. Nit. 860.510.291-5 Representante Legal: Lisbeth Del Carmen LedesmaLeón C.C. 32.790.637	Cumple
2	Consorcio Sedic Proyectos Representante Legal: Juan Pablo Muñoz Andrade C.C. 80.854.607	Cumple
3	Consorcio 004 Interventores Terra-Pc Representante Legal: Pedro José Corredor Becerra C.C. 7.227.602	Cumple
4	Acinco ingeniería S.A.S. Nit. 901.230.477 Representante Legal: Juliana Andrea Sarmiento García C.C. 52.816.621	Cumple
5	Consorcio Seguridad Vial Representante Legal: Erica Janitza Sanchez Ruiz C.C. 1.121.894.693	No Cumple
6	Consorcio Interventoria Vial Representante Legal: Erick José Castillo Curieux C.C. 79.602.923	Cumple
7	Consorcio Ingestone Representante Legal: German Augusto Baronbustos C.C. 80.539.741	Cumple
8	Consorcio Incol-Aleph Representante Legal: Henry Sánchez Rodríguez C.C. 16.715.628	Cumple

En el referido informe se precisó al interesado en el proceso CONSORCIO SEGURIDAD VIAL que: de conformidad con las reglas de subsanación establecidas en el manual de contratación, se requiere que el documento con el cual se pretende dar cumplimiento al requisito de experiencia sea aclarado de tal modo que se pueda observar que la experiencia del oferente es relacionada con los requerimientos mínimos solicitados en el numeral 5.3.1 del documento de Términos y Condiciones. Para la subsanación de este requerimiento tendrán un término máximo de tres días hábiles (3).

9. El 21 de mayo de 2021 se recibió la subsanación del CONSORCIO SEGURIDAD VIAL.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

10. El 25 de mayo de 2021 se publicó el informe de preseleccionados, de acuerdo con los criterios de preselección establecidos en el Documento de Términos y condiciones en su numeral 5.4, se lista los oferentes preseleccionados para el proceso:

**Tabla 65 Oferentes preseleccionados para el proceso IOP-004-2021**

Nombre O Razón Social Del Interesado	
1	Proyectos Construcciones Civiles Y Viales S.A.S. – PivIngeniería S.A.S. Nit. 860.510.291-5 Representante Legal: Lisbeth Del Carmen LedesmaLeón C.C. 32.790.637
2	Consorcio Sedic Proyectos Representante Legal: Juan Pablo Muñoz Andrade C.C. 80.854.607
3	Consorcio 004 Interventores Terra-Pc Representante Legal: Pedro Jose Corredor Becerra C.C. 7.227.602
4	Acinco Ingenieria S.A.S.Nit. 901.230.477 Representante Legal: Jhuliana Andrea SarmientoGarcía C.C. 52.816.621
5	Consorcio Seguridad Vial Representante Legal: Erica Janitza Sanchez Ruiz C.C. 1.121.894.693
6	Consorcio Interventoria Vial Representante Legal: Erick José Castillo Curieux C.C. 79.602.923
7	Consorcio Ingestone Representante Legal: German Augusto Baron Bustos C.C. 80.539.741
8	Consorcio Incol-Aleph Representante Legal: Henry Sanchez Rodriguez C.C. 16.715.628

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

11. El día 27 de mayo de 2021 se publicó la adenda no. 1 modificando el cronograma justifica por el grupo de procesos por “*Que, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el ANEXO 2 – CRONOGRAMA del documento términos y condiciones, y la cantidad de ofertas recibidas se hace necesario prorrogar el plazo.*”, quedando de la siguiente manera:

**PRIMERO.** - *Se modifica el ANEXO 2 – CRONOGRAMA del documento de invitación del proceso, concretamente a partir de la publicación del Informe Preliminar en los siguientes términos:*

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla 66 Modificación al cronograma del proceso IOP-004-2021**

Actividad	Fecha Estimada	Lugar
<b>Publicación del Informe Preliminar</b>	Dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes al término de Publicación de la lista de oferentes preseleccionados <b>31 DE MAYO DE 2021</b>	SECOP II
<b>Término Para Presentar las observaciones y subsanaciones.</b>	Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes al término que antecede. 3 DE JUNIO DE 2021	SECOP II
<b>Evaluación de la oferta económica</b>	Al día hábil siguiente al término Para Presentar las observaciones y subsanaciones. 4 DE JUNIO DE 2021	SECOP II
<b>Publicación del Informe Final y de Recomendación</b>	8 DE JUNIO DE 2021	SECOP II
<b>Acta de Selección o Fallido y Publicación.</b>	Dentro del día hábil siguiente a la publicación del Informe de Recomendación. 9 DE JUNIO DE 2021	SECOP II
<b>CONTRATO</b>		
<b>Entrega de documentación requerida por parte del oferente seleccionado</b>	Dentro de los DOS (02) días hábiles siguientes a la publicación del Acta de Selección. 11 DE JUNIO DE 2021	SECOP II
<b>Firma del Contrato</b>	15 DE JUNIO DE 2021	SECOP II
<b>Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual</b>	Dentro del día hábil siguiente a la firma del contrato 16 DE JUNIO DE 2021	SECOP II

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

**SEGUNDO.** - Los demás textos, numerales y anexos de los términos y condiciones, así como los otros documentos del proceso no modificados mediante la presente adenda, permanecen vigentes y son de estricto cumplimiento para el proceso de CONTRATACIÓN INVITACION A OFERENTES PRESELECCIONADOS No. IOP-004-2021.

12. De conformidad con lo anterior, el día 31 de mayo de 2021 se publicó en la plataforma Secop II el Informe Preliminar en el que, de acuerdo con las observaciones del Comité Evaluador, una vez realizada la verificación de requisitos habilitantes, ninguno de los OCHO (8) oferentes resultó habilitado. Se lista a continuación, lo establecido en el Informe Preliminar frente al cumplimiento de requisitos habilitantes:

**Tabla 67 Informe Preliminar frente al cumplimiento de requisitos habilitantes**

Oferte		Requisitos Habilitantes			Resultado
		Jurídicos	Financieros Y De Organización	Técnicos	
1	Proyectos Construcciones Civiles Y Viales S.A.S. Piv Ingeniería S.A.S.	No Cumple	Cumple	No Cumple	No Habilitado
2	Consortio Sedic Proyectos	No Cumple	Cumple	No Cumple	No Habilitado
3	Consortio 004 Interventores Terra-Pc	No Cumple	Cumple	No Cumple	No Habilitado
4	Acinco ingeniería S.A.S.	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Habilitado
5	Consortio Seguridad Vial	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Habilitado
6	Consortio Interventoría Vial	No Cumple	Cumple	No Cumple	No Habilitado
7	Consortio Ingestone	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Habilitado
8	Consortio Incol-Aleph	No Cumple	Cumple	No Cumple	No Habilitado

Fuente: Elaboración propia ENTerritorio – GIP, 2021.

Los soportes señalados en el presente acápite podrán ser consultados en el Anexo 07 Soportes Jurídicos

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

## 9. Conclusiones

En la presente sección se consolidan las conclusiones y recomendaciones derivadas del trabajo de la GIP durante el periodo de abril 2021, en la ejecución del contrato interadministrativo.

### 9.1. En el área de Seguridad Vial

- Se realizó la revisión de apropiación de los diseños de PGO II, con la verificación de ajustes de los planos de acuerdo con lo plasmado en el anexo 2A, así como los cambios en las condiciones actuales de las vías a intervenir, verificando que los diseños sean vigentes, idóneos y garanticen la seguridad vial, a fecha de corte de este informe se realizaron reuniones con ocho entes territoriales y se tienen 33 diseños apropiados.
- Se realizó capacitación de refuerzo en seguridad vial al personal de los contratistas de obra e interventoría de PGO II.

### 9.2. En el área de Tránsito

- A la fecha de corte del presente informe se ha realizado visita para toma de información de línea base para determinación de impactos en 18 de los 20 puntos propuestos en la metodología.
- En 17 de los 18 puntos registrados se tomó información de videos para análisis de conflictos y en los 18 puntos se hizo registro de velocidades.
- En el período del presente informe se hizo un breve resumen de las condiciones observadas en campo y los conflictos evidenciados.
- Para el presente período contractual se iniciará a desglosar esta información, así como a entregar procesamientos de los primeros puntos de velocidades registradas.
- Dada la actual situación de orden público en el país, está pendiente definir los dos puntos restantes para la toma de información de línea base, los cuales serán informados en el próximo período contractual.

### 9.3. En el área de supervisión PGO II

#### 9.3.1. Grupo 1

- Para el próximo período, se continuará adelantando la gestión para el cumplimiento de parte de los contratistas de la ejecución de los contratos de obra de acuerdo con los planes de inversión establecidos.
- En los municipios de Duitama y Sogamoso, se encuentran dos puntos en cada municipio, con malas condiciones del pavimento y se requiere las intervenciones por parte de los entes territoriales.
- Se logró la suscripción del convenio entre la ANSV y el municipio de Floridablanca, con lo cual se realizó entrega de diseño al contratista, quien realizó apropiación del mismo y obtuvo aprobación por parte de la interventoría.

### 9.3.2. Grupo 2

- En los municipios de Popayán y Pitalito, se encuentran uno y tres puntos respectivamente, con malas condiciones del pavimento para la implementación de la señalización horizontal y se requiere las intervenciones de mantenimiento vial por parte de los entes territoriales.
- Tanto para los dos contratos, el 2210019 y el 2210025, se han tenido demoras en la presentación y aprobación de los diseños. Desde la supervisión se han realizado reiteradamente los llamados de atención respectivos mediante correos, oficios y comités semanales; cabe anotar que los diseños se han devuelto a interventoría y contratistas, con las observaciones que deben realizar de acuerdo a lo consignado previamente en los anexos 2A, y de acuerdo con las múltiples mesas de trabajo que se han realizado desde ENTerritorio con el fin de socializar y revisar a detalle con contratista e interventor, los ajustes requeridos en los diseños. De igual forma se realizó toda la gestión necesaria para obtener los requisitos previos al inicio de actividades, tales como las relacionadas a los componentes sociales, ambientales y de SST; se realizó la gestión de solicitud de estos documentos en comités y reuniones, así como mediante correos electrónicos, apoyando la labor de la interventoría.
- Los contratos 2210019, 2210025 y 2210031, se encuentran suspendidos por orden público desde el 28 de mayo de 2021 hasta el 28 de junio de 2021, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión. Sin embargo, desde la supervisión se solicitó para el reinicio de estos, un plan de contingencia que contrarreste los tiempos en demoras de entrega de los diferentes documentos obligatorios previos al inicio de obra, tales como: apropiación de diseños para cada uno de los puntos a intervenir en las zonas, permisos respectivos de planes de manejo de tránsito, desarrollo de las actividades sociales y de comunicaciones. Dicho plan de contingencia debe estar soportado en el cronograma de ejecución, ser presentado por los contratistas de obra y aprobado por la interventoría, lo cual garantizará que de igual forma se continuará con la gestión respectiva al visto bueno de las entidades territoriales de los diseños a implementar.

### 9.3.3. Grupo 3

- Por parte de la supervisión del contrato, se ha adelantado diferentes gestiones para tramitar con la Agencia de Seguridad Vial, las correspondientes mesas de trabajo para apropiación de diseños con el Ente territorial, así mismo se ha gestionado para la presentación y la aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito.
- Teniendo en cuenta lo anterior, desde la supervisión se solicitó un plan de contingencia que contrarreste los tiempos en demoras de entrega de los diferentes documentos obligatorios previos al inicio de obra, soportado en el cronograma de ejecución; este plan de contingencia presentado por los contratistas de obra fue aprobado por la interventoría, lo cual garantiza que de igual forma se continuará con la gestión respectiva al visto bueno de las entidades territoriales de los diseños a implementar.
- Durante este periodo, se comenzó con la implementación de los 3 diseños de señalización apropiados y aprobados por todas las partes (Contratista, interventoría, Enterritorio, ANSV y el Ente territorial), se realizó la aprobación de los tres diseños faltantes, para proceder con las respectivas actividades de implementación de las medidas de pacificación vial.
- Se logró la aprobación de los 5 diseños del municipio de Valledupar y del Plan de Manejo de Tránsito, de igual manera se tramitó toda la logística necesaria para comenzar con las respectivas actividades de implementación de señalización vial, enmarcada dentro del programa pequeñas grandes obras PGO-III.

## 9.4. En el área de Comunicaciones

- Por parte del área de Comunicaciones en el mes de mayo se entregó el boletín mensual con los datos a corte del 30 de abril y mediados de mayo, en coordinación con el enlace de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Adicionalmente se elaboraron 4 boletines de inicio para

los territorios donde empezaron intervenciones PGOII (Valledupar, Barrancabermeja, Bucaramanga y Tunja) los cuales fueron divulgados en los medios de comunicación plasmados en el formato de monitoreo de medios, el cual se adjunta a este informe.

- Se elaboraron 3 cápsulas de video como apoyo a cada boletín de inicio de obras, cuya realización incluye la grabación de voz en off, animación de títulos, registro fotográfico real de las obras, este material y se envió a ENTerritorio y los municipios donde se iniciaron intervenciones, para su posterior divulgación en redes sociales.
- Se realizaron 2 banner de apoyo para la oficina de Comunicaciones de ENTerritorio y la parrilla para redes sociales la cual fue enviada a la ANSV para la realización de piezas de comunicación para redes sociales.
- Se realizó revisión y corrección de volantes, afiches, perifoneo y vallas para las 7 zonas PGOII.
- Se realizaron actividades para el plan de trabajo de la campaña de lanzamiento del punto 001-Neiva, como la infografía para los volantes para las diferentes piezas de comunicación, al igual que el guion del video para este punto. Se realizó la presentación del taller para reuniones de sensibilización para multiplicadores de información.
- Se realizó guion y video para estrategia de fidelización al cliente de ENTerritorio, con información general del programa PGO.
- Con el constante contacto con los enlaces de comunicaciones en cada ente territorial, se logra potenciar la difusión del programa. Seguirá siendo esta la vía más preponderante para dar a conocer el avance de las obras. Sin embargo, en el caso de Barrancabermeja se ha enviado información, como boletines y video de inicio de obra, con copia al Secretario de Tránsito, sin obtener mayores resultados. Este tema se reforzará con publicaciones emitidas desde las redes sociales de ENTerritorio para lograr generar noticias para el mes de junio. Trabajamos en una estrategia para lograr mayor difusión en este ente territorial.
- Hasta el momento, la totalidad de las noticias generadas alrededor del programa han tenido un enfoque positivo y en todas se ha reconocido el nombre de la ANSV como gestora y promotora del proyecto. De igual manera, se logra la mención de ENTerritorio para hacerlo posible.
- En el proceso de divulgación de reuniones de socialización, se ha buscado el apoyo de los enlaces en cada territorio para que esta pueda ser difundida en las redes sociales de la alcaldía o el ente de tránsito según sea el caso, en esto, se ha recibido el apoyo de algunos entes como Bucaramanga y Tunja, que han sido muy diligentes con este tipo de situaciones, sin embargo, en otros municipios la respuesta no ha sido tan favorable, se continuará el trabajo para fortalecer estas relaciones y continuar potenciando la divulgación para todas las reuniones en torno al programa.

#### **9.5. En el área de Gestión Social**

- Durante el mes de mayo se construyó la línea base de la metodología de evaluación de impactos del componente de gestión social de PGO II, con la aplicación y tabulación de encuestas de 22 puntos de los entes territoriales que fueron priorizados.
- Durante el mes de mayo, a pesar de la situación de orden público, se continuo el proceso de divulgación para reunión de inicio en algunos de los municipios de las 7 zonas de PGO II.
- Las reuniones de socialización evidencian la acogida y percepción positiva de las intervenciones que se llevarán a cabo en los puntos.
- Se participó en 28 comités de seguimiento semanal.
- Se revisaron 18 informes semanales y 4 informes mensuales.
- En el mes de mayo se llevaron a cabo un total de 11 reuniones de socialización, la mayoría de ellas de Grupo 1, dado que Grupo 3 adelantó sus reuniones de socialización en el mes de abril.
- Se avanzó en la revisión de los respectivos informes de lectura territorial.
- Se asistió a 6 talleres de educación vial para niños, niñas y adultos. Se constató que los talleres en seguridad vial asistieron entre 3 y 4 niños por hogar en el caso de los que fueron virtuales.

- Durante el mes de mayo se realizaron las respectivas lecturas territoriales para todos los puntos del municipio de Valledupar y se avanzó en la consolidación y revisión de la información por parte de la interventoría.
- En el municipio de Valledupar se desarrollan 4 talleres pedagógicos de seguridad vial (2 para adultos y 2 para niños) logrando acogida por parte de las comunidades; sin embargo, se hace necesario crear una estrategia de Taller en Casa, con la cual se lleve el taller de seguridad vial hasta el domicilio de los beneficiarios/usuarios de las obras.
- A pesar del proceso de divulgación y convocatoria realizado durante el mes de mayo para las reuniones de inicio en los municipios de Popayán, Pasto y Neiva, no fue posible llevar a cabo dichas reuniones por causa del orden público presente en estos municipios. Por consiguiente, una vez se resuelva dicha situación se deberá nuevamente proceder a la implementación del proceso de divulgación.
- Durante el mes de junio de 2021 se iniciará el proceso de divulgación para reunión de inicio en los puntos de Grupo 3 Z5- Dosquebradas.

#### **9.6. En el área Ambiental**


- Para el periodo del presente informe se dio cumplimiento a las actividades propuestas para el componente ambiental en el plan de trabajo.
- Durante el periodo se generaron los respectivos llamados de atención a las interventorías por incumplimiento en los tiempos de entrega de los productos de carácter ambiental y SST, que conforme a las obligaciones establecidas en los documentos contractuales.
- La supervisión e interventorías, según el caso, recibieron y aprobaron los productos verificando el cumplimiento de los requerimientos normativos, contractuales y especificaciones vigentes a que hubiera lugar.
- Para la elaboración de los informes mensuales los contratistas e interventorías están haciendo uso de las listas de verificación y contenidos de los informes mensuales propuestos por la supervisión para el componente ambiental y SST; los cuales buscan estandarizar y simplificar la elaboración y presentación de los documentos requeridos durante el desarrollo de los contratos.
- Desde la supervisión se realizó el acompañamiento ambiental y SST requerido durante el periodo tanto por contratistas como por interventorías.

#### **9.7. En el área Jurídica**

- Se adelantaron las gestiones jurídicas necesarias para llevar a cabo la suspensión del contrato de interventoría No. 2210030 y los contratos de obra No. 2210019 y 2210025, y que tales novedades contractuales quedaran formalizadas en la Plataforma Secop II.
- Se mantuvo el monitoreo y control en la Plataforma Secop II de los tiempos establecidos en los cronogramas de las Reglas de participación del proceso IOP-004-2021, presentando diariamente el respectivo informe de avance frente a cada una de las actividades y novedades que fueron surgiendo en el desarrollo del proceso, así mismo se apoyó todo lo requerido por el Grupo de Procesos de Selección desde el componente jurídico, de lo cual se mantuvo informado a los delegados de la ANSV.
- Se orientaron acciones de orden jurídico en conjunto con los profesionales de supervisión, para requerir a los contratistas a dar cumplimiento a los tiempos establecidos de las actividades propias de la ejecución en el marco de las obligaciones contractuales.
- Se acompañó las reuniones programadas por la gerencia con las áreas transversales en pro de buscar soluciones expeditas para la continuidad del proceso de interventoría PGO III- Diseño, así como la elaboración de los documentos requeridos por las áreas transversales para la continuidad en los mismos.

## Anexos

### Anexo 01-Actas del proyecto



Anexo 02 -20210512 - Informes mes de abril 2021 IEF 10



El futuro es de todos DNP Departamento Nacional de Planeación

enterritorio  
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 20213100080153

Pública  Pública Reservada  Pública Clasificada

Bogotá D.C, 12-05-2021

**MEMORANDO**

**PARA:** JUAN CARLOS PINILLA SALGADO  
Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 2

**ZORANYI SIERRA DÍAZ**  
Gerente de Convenio 219143

**DE:** GRUPO DE CONTABILIDAD


**ASUNTO:** Informe de Ejecución Financiera Convenio 219143 suscrito con la Agencia Nacional de Seguridad Vial

ADJUNTO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para su conocimiento y fines pertinentes y teniendo en cuenta que ENTerritorio es quien ejecuta los

4:14 p. m.  
8/06/2021

**Anexo 03-Grupo 3 formato F-GG-11**



Anexo 04-II - 20210531\_Monitoreo de Medios Mayo

FORMATO MONITOREO DE MEDIOS PEQUEÑAS GRANDES OBRAS												enterritorio 		
FASE DEL PROYECTO	ZONA	QUIÉN REPORTA		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERNO	EXTERNO	NOMBRE DEL MEDIO	TIPO DE MEDIO (prensa o red social)	TITULAR	FECHA DE PUBLICACIÓN	LINK DE LA PUBLICACIÓN	PANTALLAZO DE LA PUBLICACIÓN	EL MENSAJE ES POSITIVO, NEGATIVO O NEUTRAL
		COMTRATISTA (X)	INTERVENIORA (X)											
PGOII	Bogotá	Comunicaciones PGD		General	General	X		ANSV	Twitter	Trabajamos por un país más conectado para los colombianos con vías seguras.	3-may-21	<a href="https://twitter.com/ansvcol">https://twitter.com/ansvcol</a>		Positivo
PGOII	Z2: Caribe	Comunicaciones PGD		Cesar	Valledupar	X		ANSV	Twitter	La @ansvcol inició intervenciones en el departamento de Cesar de la Fase II del programa 'Pequeñas Grandes Obras'. En Valledupar han sido definidos 6 proyectos que tendrán una inversión por un valor aproximado de \$534 millones. #SalvemosVidasEnLaVía	3-may-21	<a href="https://twitter.com/ansvcol/status/1383362868882503363">https://twitter.com/ansvcol/status/1383362868882503363</a>		Neutral
PGOII	Z7: Llanos Orientales y Andina	Comunicaciones PGD		Meta	Acacías		X	Secretaría de Tránsito	Facebook	Se invita a la comunidad en general a la Socialización virtual de inicio del programa Pequeñas Grandes Obras	6-may-21	<a href="https://www.facebook.com/Tiansu/transporteAcacias">https://www.facebook.com/Tiansu/transporteAcacias</a>		Positivo

**Anexo 05- II-20210531 -Directorio medios y seguimiento enlaces territoriales**

Anexo 05- II-20210531 -Directorio medios y seguimiento enlaces territoriales - Excel

Archivos Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer? Iniciar sesión Compartir

O6 Redes en general

DIRECTORIO POR ZONAS PGO II														
PACÍFICO Y AMAZONÍA														
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENLACE COMUNICACIONES	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	MEDIOS DE COMUNICACIÓN									
Valle del Cauca	Guadalupe de Buga	Jesús Antonio Sánchez (primero se envía a él)	3154892582	<a href="mailto:sectransito@guadalupebuga-valle">sectransito@guadalupebuga-valle</a>	El país - 032 8987000	Diario de occidente - 032 8331111	Q'hubo Call - 032 8331111	90 Minutos	Soy de Buenaventura			90 Minutos - 032 6848440		
Nariño	Pasto	Cristian Burgos Secretaría de tránsito (si no contesta llamo a Mónica)	3008451305	<a href="mailto:seguridadvial@transitopasto.gov.co">seguridadvial@transitopasto.gov.co</a>	Diario del sur - 032 7310048	Nariño Hoy/NA								
Cauca	Popayán	Juan Pablo Velasco	3166872479	<a href="mailto:jpvelascao@gmail.com">jpvelascao@gmail.com</a>	El Nuevo Liberal - 032 8334141	Distrito del Cauca (Diario Extra) - 313828471	Periódico Virtual	La Campana	Caracol Radio	RCN	Radio Super	emisora 105.1	La Campana 032 8237816	Redes en general
Putumayo	Puerto Asis	Wilmer Antonio Mena (se envía a él)	3208355025	<a href="mailto:transitopuertoasis@hotmail.com">transitopuertoasis@hotmail.com</a>	N/A									
CARIBE														
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENLACE COMUNICACIONES	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	MEDIOS DE COMUNICACIÓN									

SEGUIMIENTO ENLACES DIRECTORIO

7:57 p. m. 14/06/2021

**Anexo 06-II-210506\_Tabulación\_Encuesta\_Evaluación\_Impacto\_SOC**

Anexo 06-II-210506\_Tabulación\_Encuesta\_Evaluación\_Impacto\_SOC - Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer? Iniciar sesión Compartir


D3 Teléfono de contacto

INFORMACIÓN GENERAL				Índice de Riesgo de seguridad vial percibido (RP)		Involucramiento de la Com	
Consecutivo	Código del punto	Nombre Encuestado(a)	Teléfono de contacto	Factor de Amenaza	Factor de Vulnerabilidad	Factor de Información	Factor
				13. Dadas las condiciones actuales de la vía en este punto, ¿qué tan segura(o) se siente cruzando la calle? Muy seguro (1), Medianamente seguro (2), Muy inseguro (3)	14. Usted cree que si se presenta un accidente de tránsito en este punto, ¿es posible que alguien muera (3), que alguien resulte herido (2), o que haya un choque sin heridos o muertes (1)?	15. De 1 a 3, siendo 3 mucho, 2 poco y 1 nada, ¿qué tan informado se ha sentido sobre la intervención que se va a realizar?	16. De mucl na import que es en la se
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							


Municipio Direcciones puntos

7:59 p. m. 14/06/2021

### Anexo 07- Soportes Juridicos



### Anexo 08- Soportes Georreferenciación y avances



 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

### Indice de tablas

Tabla 1. Información general – Contrato interadministrativo 219143/104-2019 - corte mayo 2021	5
Tabla 2. Espacios de articulación del contrato interadministrativo –mayo de 2021.....	6
Tabla 3. Correspondencia generada – corte a 31 de mayo de 2021.....	6
Tabla 4. Pago de la cuota de Gerencia Integral del Proyecto .....	7
Tabla 5. Autorizaciones de desembolso de recursos GIP en Comités Financieros .....	9
Tabla 6 Contratos derivados .....	11
Tabla 7 Contratos Derivados Suscritos en mayo 2021.....	14
<b>Tabla 8. Autorizaciones de desembolso de recursos MAI en Comités Financieros .....</b>	<b>16</b>
Tabla 9 Estado ejecución financiera con corte a abril 2021.....	20
Tabla 10 Reuniones de apropiación adelantadas para los puntos de PGO II.....	26
Tabla 11 Puntos de muestra de evaluación de impactos municipio de Pasto .....	28
Tabla 12 Estado de apropiación y ejecución de diseños grupo 1 .....	53
Tabla 13 Desarrollo de comités semanales PGO II – Grupo 1.....	54
Tabla 14 Estado de informes mensuales de interventoría PGO II – Grupo 1.....	54
Tabla 15 Estado de ejecución de presupuesto de interventoría PGO II – Grupo 1.....	55
Tabla 16 Estado de apropiación y ejecución de diseños .....	58
Tabla 17 Desarrollo de comités semanales PGO II – Grupo 2 .....	59
Tabla 18 Estado de informes mensuales de interventoría PGO II – Grupo 2 – ZO1.....	59
Tabla 19 Estado de informes mensuales de interventoría PGO II – Grupo 2 – ZO7.....	60
Tabla 20 Estado de informes semanales de interventoría PGO II – Grupo 2 – ZO1.....	60
Tabla 21 Estado de informes semanales de interventoría PGO II – Grupo 2 – ZO7.....	61
Tabla 22 Estado de informes mensuales contratistas PGO II – Grupo 2.....	61
Tabla 23 Estado de informes semanales contratistas PGO II – Grupo 2 .....	62
Tabla 24 Estado de ejecución de presupuesto de interventoría PGO II – Grupo 2.....	63
Tabla 25 Estado de ejecución de presupuestos contratistas PGO II – Grupo 2 .....	63
Tabla 26 Estado de apropiación y ejecución de diseños .....	65

Tabla 27	Desarrollo de comités semanales PGO II – Grupo 3 .....	66
Tabla 28	Estado de informes mensuales de interventoría PGO II – Grupo 3 – ZO2.....	67
Tabla 29	Estado de informes mensuales de interventoría PGO II – Grupo 3 – ZO5.....	67
Tabla 30	Estado de informes semanales de interventoría PGO II – Grupo 3 – ZO2.....	67
Tabla 31	Estado de informes semanales de interventoría PGO II – Grupo 3 – ZO5.....	68
Tabla 32	Estado de informes mensuales contratistas PGO II – Grupo 3 .....	68
Tabla 33	Estado de informes semanales contratistas PGO II – Grupo 3 .....	69
Tabla 34	Estado de ejecución de presupuesto de interventoría PGO II – Grupo 3.....	70
Tabla 35	Estado de ejecución de presupuestos contratistas PGO II – Grupo 3 .....	70
Tabla 36	Resumen publicaciones PGO por medio de comunicación – Mayo .....	74
Tabla 37.	Publicaciones PGO por ente territorial - Mayo.....	75
Tabla 38	Total, publicaciones PGO 2020 – 2021 .....	76
Tabla 39	Cuadro seguimiento enlaces territoriales .....	79
Tabla 40	Parrilla para redes sociales PGO mayo .....	80
Tabla 41	Comités semanales de seguimiento PGO II .....	82
Tabla 42	Revisión informes semanales y mensuales PGO II .....	83
Tabla 43	Actividades de difusión y socialización PGO II.....	83
Tabla 44	Lectura territorial.....	87
Tabla 45	Talleres pedagógicos en seguridad vial .....	90
Tabla 46	PGO II-Puntos encuestados para línea base de la evaluación de impacto.....	91
Tabla 47	Relación de requerimientos realizados - Ambientales y SST.....	94
Tabla 48	Estado de los productos ambientales y SST de los Contratistas .....	95
Tabla 49	Estado de los informes mensuales ambientales y SST de los Contratistas .....	96
Tabla 50	Estado de los productos ambientales y SST de las Interventorías .....	96
Tabla 51	Estado de los informes mensuales de ambientales y SST de las Interventorías .....	96
Tabla 52	Consolidado del estado de los informes ambientales y SST de las Interventorías .....	96
Tabla 53	Número de trabajadores de las Interventorías .....	97
<b>Tabla 54</b>	<b>Número de trabajadores de las Interventorías .....</b>	<b>105</b>

Tabla 55 Reuniones PGO II – Componente ambiental y SST .....	106
Tabla 56. Actividades de apoyo a la supervisión.....	108
Tabla 57. Actividades de apoyo a la supervisión.....	110
Tabla 58. Estado contratos proceso CME-023-2020 .....	110
Tabla 59. Actividades de apoyo a la supervisión.....	111
Tabla 60. Estado contratos proceso CME-026-2020 .....	113
Tabla 61. Consolidado contratos Programa PGO III- Diseños. ....	114
Tabla 62 Cronograma del proceso IOP-004-2021 .....	115
Tabla 63 Proceso IOP-004-2021 ofertas registradas.....	117
Tabla 64 Verificación de Requisitos de preselección Proceso IOP-004-2021 .....	117
Tabla 65 Oferentes preseleccionados para el proceso IOP-004-2021 .....	119
Tabla 66 Modificación al cronograma del proceso IOP-004-2021 .....	120
Tabla 67 Informe Preliminar frente al cumplimiento de requisitos habilitantes.....	121

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

### Indice Ilustraciones

Ilustración 1. Avance Presupuestal .....	19
Ilustración 2 Punto 41001-001 corredor Avenida Max Duque con Carrera 25.....	29
Ilustración 3 Visual cámara Punto 41001-001 Avenida Max Duque con Carrera 25. ....	29
Ilustración 4 Punto 41001-001 corredor Avenida Max Duque con Carrera 29.....	30
Ilustración 5 Visual cámara Punto 41001-001 Avenida Max Duque con Carrera 29. ....	30
Ilustración 6 Punto 41001-001 corredor Avenida Max Duque con Carrera 33.....	31
Ilustración 7 Visual cámara Punto 41001-001 Avenida Max Duque con Carrera 33. ....	31
Ilustración 8 Punto 05001-003 Calle 30 con Carrera 52 .....	32
Ilustración 9 Visual cámara Punto 05001-003 Calle 30 con Carrera 52. ....	33
Ilustración 10 Punto 05001-006 Calle 77 entre carrera 53 y carrera 64.....	33
Ilustración 11 Visual cámara Punto 05001-006 Calle 77 entre carrera 53 y carrera 64 .....	34
Ilustración 12 Punto 05001-005 Calle 65 con carrera 75 .....	34
Ilustración 13 Visual cámara Punto 05001-005 Calle 65 con carrera 75 .....	35
Ilustración 14 Punto 68001-002 Av. Metropolitana entre carrera 2A y carrera 14.....	35
Ilustración 15 Visual cámara Punto 68001-002 Av. Metropolitana entre carrera 2A y carrera 14 ..	36
Ilustración 16 Punto 68001-004 Calle 34 16-19. Institución Educativa Las Américas .....	36
Ilustración 17 Visual cámara Punto 68001-004 Calle 34 16-19. Institución Educativa Las Américas	37
Ilustración 18 68001-003 Diagonal 15 entre calle 55 y calle 45.....	37
Ilustración 19 Visual cámara Punto 003 Diagonal 15 con Avenida la Rosita .....	38
Ilustración 20 Visual cámara Punto 003 Diagonal 15 con Calle 55 .....	38
Ilustración 21 Punto 68081-004 Colegio real de Mares.....	39
Ilustración 22 Visual cámara Calle 30 Colegio real de Mares .....	39
Ilustración 23 Visual cámara Calle 28 Colegio real de Mares .....	40
Ilustración 24 Punto 68081-005 Liceo Nueva Generación .....	40
Ilustración 25 Visual cámara Diagonal 56 Parroquia Divino Salvador .....	41
Ilustración 26 Visual cámara Diagonal 56 sobre la Carrera 15B .....	41

Ilustración 27 Punto 68081-006 Carrera 28 Calle 54 .....	42
Ilustración 28 Punto 68081-006 Carrera 28 Calle 56 .....	42
Ilustración 29 Visual cámara Carrera 28 con Calle 54.....	42
Ilustración 30 Visual cámara Carrera 28 frente al hospital de Ecopetrol .....	43
Ilustración 31 Punto 20001-001 Institución Educativa Milciades Cantillo Costa.....	43
Ilustración 32 Visual cámara Colegio Milciades Cantillo .....	44
Ilustración 33 Punto 20001-003 Calle 26 con carrera 20 - IED Rafael Valle Meza.....	44
Ilustración 34 Visual cámara IED Rafael valle Meza.....	45
Ilustración 35 Punto 20001-005 Glorieta calle 21 con carrera 7A .....	45
Ilustración 36 Visual cámara Glorieta Calle 21.....	45
Ilustración 37 Punto 52001-001 Calle 17 con Carrera 11.....	46
Ilustración 38 Visual cámaras Carrera 11 con Calle 17 .....	46
Ilustración 39 Punto 52001-002 Calle 12 IEM Libertad.....	47
Ilustración 40 Visual cámara Calle 12 IEM Libertad .....	47
Ilustración 41 Punto 52001-002 Calle 12 Carrera 6 .....	48
Ilustración 42 Visual cámara Calle 12 Carrera 6.....	48
Ilustración 43 Punto 52001-003 Carrera 24 con calle 22 .....	49
Ilustración 44 Visual cámaras Carrera 24 con Calle 22 .....	49
Ilustración 45 Punto 52001-004 Calle 21 con Carrera 3B .....	50
Ilustración 46 Visual cámaras Calle 21 con carrera 3B.....	50
Ilustración 47 Avance Obra 15001-002.....	51
Ilustración 48 Avance Obra punto 15001-003 .....	52
Ilustración 49 Avance Obra punto 68001-001 .....	52
Ilustración 50 Registro fotográfico.....	55
Ilustración 51 Monitoreo de medios y redes sociales sector transporte y prensa regional - PGO..	71
Ilustración 55 Presencia PGO por Categoría de medios - Mayo. ....	73
<b>Ilustración 53 Publicaciones PGO por medio de comunicación: Interna Vs Externa .....</b>	<b>74</b>
Ilustración 54. Publicaciones PGO por ente territorial - Mayo. ....	75

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

Ilustración 55 Boletines mensuales - Mayo de 2021. ....	76
Ilustración 56. Banners apoyo boletín mensual – mayo 2021 .....	77
Ilustración 57 . Video PGO – Inicio de obras – mayo 2021 .....	78
Ilustración 58 Socialización de Barrancabermeja y Duitama .....	84
Ilustración 59 Volante de invitación reunión de inicio Acacias.....	85
Ilustración 60 Instalación de afiches divulgativos Neiva .....	86
Ilustración 61 Volantes de resocialización Punto 005 Valledupar .....	86
Ilustración 62 Mosaico de reuniones Lectura Territorial .....	89
Ilustración 63 Talleres pedagógicos Valledupar.....	90
